वार्षिक प्रतिवेदन

आ.व. २०८२/०८३



लुम्बिनी प्रदेश सरकार

शहरी विकास, उर्जा, सिंचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय

भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय

बुटवल, रुपन्देही

आ.ब. २०८२/२०८३

श्रावण २०८३

वार्षिक प्रतिवेदन

आ.व. २०८२/२०८३

भाद्र २०८३



लुम्बिनी प्रदेश सरकार

शहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय

भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय

बुटवल, रुपन्देही

फोन नं.	:	०७१-५४०७१२, ९८५७०४७५५८
Email	:	gwrdb.butwal@gmail.com
Website	:	www.gwriddbtwl.lumbini.gov.np
Website	:	facebook.com/gwidd.butwal.1/
WhatsApp	:	9857057448
प्रकाशक	:	भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, बुटवल रुपन्देही ।

कार्यालयका कर्मचारीहरू



(कार्यालय प्रमुख)

नामः महेश पोखेल
पदः सि.डि. हाइड्रोजियोलोजिस्ट
तहः अधिकृत दशौं
सम्पर्क : ९८५७०५७४४८



(सूचना अधिकारी)

नामः बिष्णु उपाध्याय
पदः ब. हाइड्रोजियोलोजिस्ट
तहः अधिकृत आठौं
सम्पर्क : ९८५७०५०६३४



नामः नारायण प्रसाद पन्थी
पदः ब.प्राविधिक अधिकृत
तह : अधिकृत सातौं
सम्पर्क : ९८५७०३५५५०



नामः बिनोद कुमार पौडेल
पदः ब. अधिकृत (लेखा)
तहः अधिकृत सातौं
सम्पर्क : ९८५७०५०७४५



नामः कृष्ण बहादुर विक
पदः कम्प्युटर अधिकृत
तहः अधिकृत छैटौं
सम्पर्क : ९८६६९२०६३७



नामः निकेश कुमार मण्डल
पदः प्राविधिक अधिकृत
तहः अधिकृत छैटौं
सम्पर्क : ९८६२२१२८१५



नामः पोमकला भण्डारी
पदः ना.सु.
श्रेणीः रा.प.अन. प्रथम
सम्पर्क : ९८४४७६९९७५



नामः शरण आचार्य
पदः सव-इन्जिनियर
तहः पाँचौं
सम्पर्क : ९८४६६४१०००

विषय सूची

भाग- एक.....१

१. कार्यालयको परिचय.....१

१.१. पृष्ठभूमि.....१

१.२. सेवाको उद्देश्य र प्रकार.....२

१.३. सेवाको प्राप्तिको प्रकृया.....२

१.४. घरजग्गा तथा सवारी साधन.....३

१.५. सङ्गठन संरचना.....४

१.६. हाल कार्यरत कर्मचारीको विवरण.....५

भाग-दुई.....७

२. कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विवरण.....७

२.१. क्षेत्राधिकार.....७

२.२. कार्यक्षेत्रको वस्तुगत अवस्था.....७

भाग-तीन.....९

३. आ. ब. २०८२/०८३ वार्षिक लक्ष्य तथा प्रगति.....९

३.१. वार्षिक बजेट तथा खर्च विवरण.....९

३.२. वार्षिक प्रगति सारांश.....११

३.३. योजनागत वार्षिक प्रगति.....१२

क) भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबवेल सिँचाइ कार्यक्रम (समानिकरण).....१२

ख) भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना (संघीय ससर्त).....१८

ग) सिँचाई योजना मर्मत सम्भार तथा विस्तार (३०८०००१८४).....१९

घ) खानेपानी आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार (३४७०२०१५४).....२०

३.४. कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनाहरू.....२१

३.५. क्रमागत ठेक्का विवरण.....२३

भाग-चार

४. कार्यालयको उपलब्धी.....२४

४.१. वार्षिक परिमाणात्मक उपलब्धी (आ.ब.२०८२/०८३).....२४

४.२. हाल सम्मको उपलब्धि (आ.ब.२०८२/०८३ सम्म).....२४

४.३. विगतमा सम्पन्न भएका योजनाहरू.....२५

भाग-पाँच

५. बेरुजु तथा समस्याहरु.....२६

३.६. बेरुजू सम्बन्धी विवरण.....२६

३.७. समस्याहरू.....२६

अनुसुचिहरु

अनुसूची-१: - कार्यालय प्रमुखहरूको विवरण २९

अनुसूची-२: नागरिक बडापत्र.....३१

अनुसूची-३: प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएका डिप ट्युबवेल योजनाहरूको प्राविधिक विवरण..... ३२

अनुसूची-४: आ.व. २०७५/०७६ मा निर्माण सम्पन्न स्यालो ट्यूववेल योजनाहरु.....५१

अनुसूची-५: आ.व. २०७५/०७६ मा निर्माण सम्पन्न स्यालो ट्यूववेल योजनाहरु..... ५४

अनुसूची-६: आ.व. २०७७/७८ मा निर्माण सम्पन्न स्यालो ट्यूववेल योजनाहरु.....५७

अनुसूची-७: आ.व. २०७८/७९ मा निर्माण सम्पन्न स्यालो ट्यूववेल योजनाहरु.....५८

अनुसूची-८: आ.व. २०७९/८० मा निर्माण सम्पन्न स्यालो ट्यूववेल योजनाहरु.....६०

अनुसूची- ९: आ.व. २०८०/८१ मा निर्माण सम्पन्न स्यालो ट्यूववेल योजनाहरु । ६२

अनुसूची- १०: आ.व. २०८१/८२ मा निर्माण सम्पन्न स्यालो ट्यूववेल योजनाहरु..... ७३

अनुसूची — ११: निर्माणनधिन डिप ट्युबवेल योजनाहरुको विवरण (क्रमागत).....७७

अनुसूची-१२: आ.व. २०८२/०८३ मा निर्माण सम्पन्न भएका डिप ट्यूववेलको विवरण.....८३

अनुसूची-१३ आ.व. २०८२/०८३ मा निर्माण भएका स्यालो ट्युववेलको विवरण..... ८४

अनुसूची-१४: आ. व. २०८२/८३ मा बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएका योजनाहरू.....९१

अनुसूची -१५: आ.व. २०८२/८३ मा निर्माण भएका सिँचाइ प्रणाली सम्बन्धी नक्साहरु ९३

अनुसूची-१६: आ.व २०८१/०८२ मा निर्माण भएका डिप ट्युववेलहरुको डाटा.....१०४

अनुसूची-१७: आ.ब. २०८२/८३ मा सम्पादित कार्यबाट भएको उपलब्धि ११०

अनुसूची-१८: आ.ब. २०८३/८४ को वार्षिक विकास कार्यक्रम ११७

तालिका सूची

तालिका १: कार्यालयको दरबन्दी तेरिज ४

तालिका २:कार्यालयमा हाल कार्यरत कर्मचारीको विवरण ५

तालिका ३: कार्यालयको कार्यक्षेत्र विवरण ८

तालिका ४: आ.ब. २०८२/०८३ को वार्षिक विनियोजन तथा खर्च विवरण ९

तालिका ५: आ.व. २०८२/०८३ को बजेट स्रोतको आधारमा वार्षिक प्रगति १०

तालिका ६: आ.व. २०८२/०८३ को प्रगति अवस्था-सामानिकरण तर्फ १२

तालिका ७: संघीय विशेष अनुदानबाट भएको प्रगति १७

तालिका ८: ससर्त तर्फका योजनाहरूको प्रगति अवस्था १९

तालिका ९:मर्मत सम्भार तर्फका योजनाहरूमा भएको कार्य विवरण २०

तालिका १०:खानेपानी आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम २०

तालिका ११: आ.व.२०८२/०८३ मा कार्यान्वयन हुन नसकेका योजना विवरण २१

तालिका १२:क्रमागत ठेक्का/योजना विवरण (रकम रु हजारमा) २३

तालिका १३: कार्यालयले आ.व. २०८२/८३ मा गरेको सूचकमा आधारित जिल्लागत प्रगति २४

तालिका १४: हालसम्मको जिल्लागत सिँचित क्षेत्र विस्तार २४

तालिका १५: विगत वर्षमा सम्पन्न आयोजना विवरण २५

तालिका १६:एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजन (IWRMP) बाट सम्पन्न भएका योजनाहरू २५

तालिका १७: कार्यालयको हाल सम्मको बेरुजू विवरण २६

तालिका १८: समस्या र समाधानका उपायहरु २६

भाग- एक

१. कार्यालयको परिचय

१.१. पृष्ठभूमि

नेपालमा भूमिगत जलस्रोतको अन्वेषण र पहिचानका गतिविधिहरू वि. स. २०२३ मा सिँचाइ विभाग अन्तर्गतको एक प्राविधिक एकाइ मार्फत सुरु भएका थिए। भूमिगत जलको अध्ययन तथा अनुसन्धान गतिविधिलाई थप सुदृढ बनाउन र भूमिगत जल सिँचाइ विकासका लागि सम्भावित क्षेत्रहरू पहिचान गर्न नेपाल सरकारले वि. स. २०३२ मा तत्कालीन जलस्रोत मन्त्रालय अन्तर्गत भूमिगत जलस्रोत विकास समिति (GWRDB) को स्थापना भएको थियो। यसै समिति अन्तर्गत २०३२ सालमा कपिलवस्तु नलकूप आयोजना स्थापना भई यस क्षेत्रमा २०४४ साल सम्म भूमिगत सिँचाइको विकास गरेको थियो । २०४४ सालमा भूमिगत जलस्रोत विकास परियोजना, फिल्ड कार्यालय र २०६७ सालमा भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, शाखा कार्यालय स्थापना भई कार्य भई रहेको थियो ।

वि.स. २०७२ मा नेपाल सरकार, ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, जलस्रोत तथा सिँचाइ विभागको मातहत रही २०७२/३/३१ मा भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालयको गठन भएको थियो । २०७४ सालको राज्य पुनर्संरचनाको सिलसिलामा भूमिगत जल सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय लुम्बिनी प्रदेशको साबिकको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको मातहतमा भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय स्थापना भई कार्य जिम्मेवारी तोकिएको थियो । हाल यस कार्यालय सहरी विकास, ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको छ । यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र संघीयता स्थापना अघि रुपन्देही, नवलपरासी (पूर्व र पश्चिम समेत), पाल्पा, गुल्मी र स्याङ्गजा समेत रहेको थियो भने संघीयता स्थापना पश्चात् कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा केही हेरफेर गरी हालको कार्यक्षेत्र लुम्बिनी प्रदेशका रुपन्देही, नवलपरासी (ब.सु.प), पाल्पा र गुल्मी गरी चार जिल्ला हरू रहेका छन् ।

सम्बत् २०३२ मा कपिलबस्तु नलकुप आयोजनाको रुपमा स्थापना भएको कार्यालय सम्बत् २०४४ मा भूमिगत जलस्रोत विकास परियोजना फिल्ड कार्यालय बुटवल र पछि सम्बत् २०६७ मा भूमिगत जलस्रोत विकास समिति शाखा कार्यालय बुटवलको रुपमा यस क्षेत्रको भूमिगत जलस्रोतको अनुसन्धान तथा विकासमा कार्य गर्दै आएकोमा सम्बत् २०७२ मा समितिको कार्यालयलाई यथावत् राखी भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय बुटवल स्थापना भएको थियो । यी दुवै कार्यालयहरू एकै स्थानमा एकै कार्यालय प्रमुखले सञ्चालन गर्ने गरी सुरुमा व्यवस्थापन गरीएको र सम्बत् २०७५ को राज्य पुनर्संरचनाको सिलसिलामा समितिको कार्यालय संघमा र डिभिजन कार्यालय प्रदेश सरकार मातहत रहन गयो । सम्बत् २०८० मा समितिको कार्यालय संघ सरकारले खारेजी गरेको र उक्त कार्यालयको नाममा रहेको जायजेथा यसै जिल्ला स्थित भैरहवा लुम्बिनी भूमिगत सिँचाइ व्यवस्थापन कार्यालय भैरहवालाई जिम्मा दिएको थियो । हाल समितिको कार्यालय अस्तित्वमा रहेको छैन र त्यस कार्यालयले यस अघि गरेका डिप ट्यूववेल सिँचाइ प्रणालीहरूको मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यहरू यसै डिभिजन मार्फत हुँदै आएको छ । प्रदेश सरकारको भूमिगत जलस्रोत विकास सम्बन्ध आफ्नै नीति योजना कार्यान्वयनको अतिरिक्त यस अघि

गरेका डिप ट्यूववेल सिँचाइ प्रणालीहरूको मर्मत सम्भार तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यालय यसै डिभिजन मार्फत हुँदै आएको छ ।

१.२. सेवाको उद्देश्य र प्रकार

क) सेवाको उदेश्यः

यस कार्यालयबाट प्रदान गरीने सेवाको उद्देश्य यस प्रकार रहेका छन् ।

- भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गरी कृषियोग्य भूमिमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराई कृषि उत्पादकत्व तथा उत्पादन वृद्धि गरी कृषकहरूको जीवनस्तरमा सुधार गर्ने ।
- भूमिगत सिँचाइ प्रणाली विकास, विस्तार तथा सुदृढीकरण गरी वर्षै भरि भरपर्दो सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने ।
- निर्मित सिँचाइ संरचनाको मर्मत सम्भार तथा कृषक उपभोक्ता समितिलाई प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराई सिँचाइ प्रणालीको दक्षता वृद्धि गर्ने ।

ख) सेवाको प्रकारः

यस कार्यालयबाट प्रदान गरीने सेवाका प्रकार निम्न बमोजिम रहेको छन ।

क) डिप ट्यूववेल सिँचाइ प्रणाली निर्माण गरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने ।

ख) पावर ड्रिल तथा स्यालो ट्यूववेल सिँचाइ प्रणालीको विकास गरी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने ।

ग) डिप ट्यूववेल सिँचाइ प्रणालीको मर्मत, सम्भार तथा व्यवस्थापनमा सहयोग गर्ने तथा उपभोक्ता कृषकलाई प्राविधिक सहयोग तथा आवश्यक तालिम उपलब्ध गराउने ।

घ) कार्यक्षेत्र भित्र आवश्यकता अनुसार अध्ययन, अनुसन्धान गरी भूमिगत जलस्रोत संभाव्यता पहिचान गर्ने ।

१.३. सेवाको प्राप्तिको प्रकृया

भूमिगत जल सिचाई योजना कार्यान्वयन कार्यविधि २०७७ बमोजिम नयाँ डिप तथा स्यालो ट्यूववेल योजना माग गर्न तपसिल बमोजिमको प्रक्रिया अवलम्बन गर्नु पर्दछ ।

- **जल उपभोक्ता संस्था (ज.उ.स.)गठन गर्ने** : उपभोक्ता कृषकहरुले एक तदर्थ जल उपभोक्ता सस्थाको (ज.उ.स.) गठन गर्ने ।
- **जग्गाको लगत** : कार्यालयबाट उपलब्ध गराइने माग फाराममा जग्गाको लगत तथा अन्य विवरण प्रस्ट बुझिने गरी भर्ने ।
- **अन्य कागजात** : जग्गाको क्षेत्रफल खुल्ने कागजात (लालपुर्जाको प्रतिलिपि वा तिरो तिरेको रसिदको प्रतिलिपि), योजना माग सम्बन्धमा ज.उ.स.को निर्णयको प्रतिलिपि, ज.उ.स. पदाधिकारीहरूको नागरीकताको प्रतिलिपि, र नापी कार्यालय बाट सिँचित क्षेत्र खुल्ने नापी नक्सा (नक्साको ब्लु प्रिन्ट) समावेश गर्ने ।

- **सिफारिस** : योजनाको आवश्यकता तथा माग सम्बन्धमा स्थानीय निकायको सिफारिस पत्र समावेश गर्नु पर्ने ।
- **निवेदन** : माथि उल्लिखित सबै कागजातहरू, माग फाराम, सिफारिस पत्र र ज.उ.स.को निर्णय सहित कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने ।
- **सिँचित क्षेत्रः** प्रति डिप ट्यूववेल तराई क्षेत्रमा ३० हेक्टर र पहाडी क्षेत्रमा १० हेक्टर जमिन, प्रति पावर ड्रिल स्यालो ट्यूववेलको लागि तराइमा २.५ हे, भित्रि मधेशमा २ हेक्टर र पहाडी क्षेत्रमा १० रोपनी जमिन र प्रति स्यालो ट्युबेलको लागि तराइ तथा भित्री मधेशमा २ हेक्टर र पहाडी क्षेत्रमा १० रोपनी जमिन हुनु पर्ने ।
- **धरौटी रकम** : डिप ट्यूववेल योजनाको लागि प्रति हेक्टर रु. ५०० का दरले ३० हेक्टरको रु १५००० (पन्ध्र हजार) कार्यालयको धरौटी खातामा रकम जम्मा गरेको भौचर कार्यालयमा पेस गर्नु पर्ने तथा स्यालो ट्यूववेलको हकमा कुनै धरौटी राख्नु नपर्ने ।
- **योजना छनौट** : कार्यालयमा पेस भएका निबेदन उपर प्राबिधिक अध्ययन गरी सम्भाव्य क्षेत्र र स्थानीय आवस्यकता एकिन पछि तालुक कार्यालयको समन्वयमा लागतको सुनिश्चिता गरी योजना छनौट गरीने ।
- **जनसहभागिता** : डिप ट्यूववेल सिँचाइमा पम्प घर तथा पानी वितरण प्रणाली निर्माणमा लागतको ५ प्रतिशत जनसहभागिता (नगद वा श्रमदान) बापत कृषकहरूले व्यहोर्नु पर्ने र अन्य संरचना निर्माणमा जनसहभागिता नलाग्ने ।

१.४. घरजग्गा तथा सवारी साधन

क) जग्गा तथा भवनः

हाल यस कार्यालय साबिकको कपिलवस्तु नलकुप आयोजना (भूमिगत जलस्रोत विकास समिति शाखा कार्यालय बुटवल) को नाममा रहेको बुटवल उप-महानगरपालिका वार्ड न. ५ हाटबजारमा रहेको जग्गामा अवस्थित छ । यस कार्यालयले हाल प्रदेश सरकारबाट निर्मित आफ्नै नयाँ कार्यालय भवनबाट सेवा सुचारु गरीरहेको छ । सोही समितिको स्वामित्वमा रहेको घर-टहराहरु समेत कार्यालय प्रयोजन तथा कर्मचारी आवास प्रयोजनको रूपमा प्रयोग भइरहेको छ । यस अघि यस कार्यालयले प्रयोग गरिरहेको सोही समितिका पक्की घरहरू हाल प्रदेश स्तरीय कृषि विकास निर्देशनालय, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय र प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रयोग गरी रहेकोले स्टोर प्रयोजनको लागि केही असुविधा रहेको छ ।

ख) सवारी साधनः

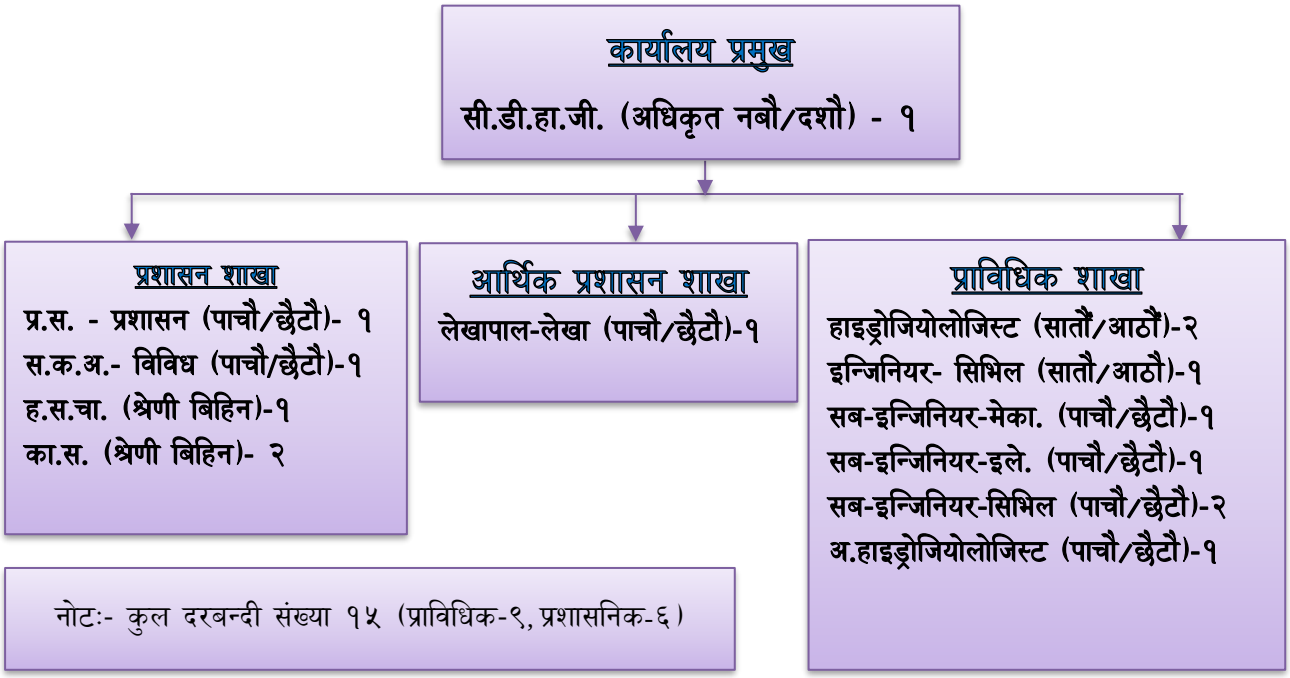
यस कार्यालयमा हाल २ गोटा पिक-अप गाडी रहेकोमा एउटा पिक-अप गाडी (Lumbini BAA 0912) चालू अवस्थाको र अर्को पिक-अप गाडी (बा १ झ ४२३३) पुरानो/जीर्ण अवस्थामा रहेको छ । यस कार्यालयमा ४ थान मोटरसाइकलहरू (Lumbini AAA 8268, Lumbini AAA 8345, बा.१.ब. ८३५४, बा.२.ब. ७३७१) र १ थान स्कुटर (Lumbini AAA 5073) प्रयोगमा रहेका छन् । कार्यालयको कार्य क्षेत्र, कार्य

प्रकृति, कार्य बोझ अनुरूप २ गोटा चार पाँग्रे सवारी अत्यावश्यक भएको र हाल प्रयोगमा रहेका मध्ये एउटा गाडी निकै पुरानो तथा जीर्ण भएको तथा मर्मत खर्च अधिक आउने हुँदा १ गोटा थप सवारी साधनको आवश्यकता रहेको छ ।

१.५. सङ्गठन संरचना

कार्यालयको सङ्गठन संरचना र दरबन्दी विवरण तपसिल बमोजिम रहेको छ ।

चित्र नं १. कार्यालयको सङ्गठन संरचना



तालिका १: कार्यालयको दरबन्दी तेरिज

क्र.सं.	पद	सेवा/समुह/उपसमूह	तह	स्वीकृत दरबन्दी	कैफियत
१	सि.डि.हा.जी.	प्र.इन्जी/जियो/हा.जी.	नवौं/दशौं	१	
२	हाइड्रोजियोलोजिस्ट	प्र.इन्जी/जियो/हा.जी.	सातौं/आठौं	२	
३	ईन्जिनियर	प्र.इन्जी/सिविल/इरि.	सातौं/आठौं	१	
४	सब-ईन्जिनियर	प्र.इन्जी/सिविल/इरि.	पाचौं/छैठौं	२	
५	सब-ईन्जिनियर	प्र.इन्जी/ इलेक्ट्रीकल	पाचौं/छैठौं	१	
६	सब-ईन्जिनियर	प्र.इन्जी/नि.उ.स./मेकानिकल	पाचौं/छैठौं	१	
७	असिस्टेन्ट हाइड्रोजियोलोजिस्ट	प्र.इन्जी/जियो/हा.जी.	पाचौं/छैठौं	१	
८	प्रशासन सहायक	प्र.प्रशासन/सा.प्र.	पाचौं/छैठौं	१	
९	लेखापाल	प्र.प्रशासन/लेखा	पाचौं/छैठौं	१	
१०	स.क.अपरेटर	प्र.प्रशासन/सा.प्र.	चौथो/पाँचौ	१	

क्र.सं.	पद	सेवा/समुह/उपसमूह	तह	स्वीकृत दरबन्दी	कैफियत
११	हल्का सवारी चालक			१	करार
१२	कार्यालय सहयोगी			२	करार
जम्मा				**१५**	

१.६. हाल कार्यरत कर्मचारीको विवरण

यस कार्यालयमा कुल १५ जनाको स्वीकृत दरबन्दी रहेकोमा हाल ११ जना कार्यरत रहेका छन् । हाल कार्यरत कर्मचारीहरूको विवरण तपसिल बमोजिम रहेको छ । यस कार्यालयमा स्थायी तथा करार दरबन्दीमा कार्यरत ११ जना बाहेक दैनिक ज्यालादारी ५ जना गरी जम्मा १६ जना कर्मचारी कार्यरत रहेको अवस्था छ । रिक्त ५ वटा स्थायी दरबन्दीमा १ जना हाइड्रोजियोलोजिष्ट (अ.सातौं/आठौं), १ जना असिस्टेन्ट हा.जी (पाचौं/छैटौं), १ जना इन्जिनियर (अ.सातौं/आठौं), र १ जना इलेक्ट्रोनिक सब-इन्जीनियर (पाचौं/छैटौं), रिक्त रहेको र सहायक कम्प्युटर अपरेटर (पाचौं/छैटौं), हाल निलम्बन अवस्था रहेको छ ।

तालिका २:कार्यालयमा हाल कार्यरत कर्मचारीको विवरण

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	पद/तह	स्थाई ठेगाना	सम्पर्क नम्बर	कैफियत
१	महेश पोखेल	सि.डी. हाइड्रोजियोलोजिस्ट (दशौं तह)	प्युठान न.पा.-१, प्युठान	९८५७०५७४४८	का.प्र.
२	विष्णु उपाध्याय	वरिष्ठ हाइड्रोजियोलोजिस्ट (आठौं तह)	छत्रदेब-७ अर्घाखाँची	९८५७०५०६३४	सूचना अधिकारी
३	नारायण प्र. पन्थी	वरिष्ठ प्रा.अधिकृत (अ.सातौ)	बुटवल-१३,रुपन्देही	९८५७०३५५५०	
४	बिनोद कुमार पौडेल	वरिष्ठ अधिकृत लेखा (अ.सातौ)	बुटवल-११ रुपन्देही	९८५७०५०७४५	
५	कृष्ण बहादुर बि.क.	कम्पुटर अधिकृत (अ.छैठौ)	बाणगङ्गा-८ कपिलबस्तु	९८६६९२०६३७	निलम्बन
६	निकेश कु. मण्डल	अधिकृत प्राविधिक (अ.छैठौ/सिविल)	तिलाठी कोइलाडी,सप्तरी	९८६२२१२८१५	
७	सरण आचार्य	सब इन्जिनियर (सिविल)	मोदी-५ पर्वत	९८४६६४१०००	
८	पोमकला भण्डारी	नायब सुब्बा	धुर्कोट-६ गुल्मी	९८४४७६९९७५	

क्र.सं.	कर्मचारीको नाम	पद/तह	स्थाई ठेगाना	सम्पर्क नम्बर	कैफियत
९	सागर चौधरी	हल्का सवारी चालक	शुद्धोधन-२ रुपन्देही	९८०७५१४६३८	करार
१०	सिता दाहाल	कार्यालय सहयोगी	तिलोत्तमा-६ रुपन्देही	९८५७०३४९३९	करार
११	नारायण खत्री	कार्यालय सहयोगी	भिरकोट-३ स्याङ्गजा	९८४९२६००३८	करार
१२	सतिस चौधरी	सवारी चालक	शुद्धोधन-२ रुपन्देही	९८०७५३३००६	ज्यालादारी
१३	शिव ब. बलमपाकी	चौकीदार	गणेशमान चारनाथ-१ धनुषा	९८४७०३७७३०	ज्यालादारी
१४	पुरनमान श्रेष्ठ	सुपरभाइजर	बुटवल-५ रुपन्देही	९८४७०२७०१२	ज्यालादारी
१५	बिपिन बस्याल	सुपरभाइजर	वगनासकाली - ६ पाल्पा	९८६९४५५०९३	ज्यालादारी
१६	विनोद ज्ञवाली	सुपरभाइजर	तिलोत्तमा १४, रुपन्देही	९८४७३०३९७६	ज्यालादारी
१७	सिता जालन्धर	कुचिकार (स्वीपर)	बुटवल-२ रुपन्देही		ज्यालादारी

भाग-दुई

२. कार्यक्षेत्र सम्बन्धी विवरण

२.१. क्षेत्राधिकार

अनुसन्धानात्मक कार्यः

- जियोफिजिकल तथा हाइड्रोजियोलोजिकल सर्भे गरी ग्राउण्ड वाटर एक्युफर पोटेन्सियल पत्ता लगाउने
- पम्प टेस्ट मार्फत भूमिगत जलस्रोतको अवस्था तथा एक्युफरको विशेषता अध्ययन गर्ने
- भूमिगत जलस्रोतको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने तथा स्यालो तथा डिप ट्युववेलको सम्भावित क्षेत्र पहिचान गर्ने
- अनुसन्धानात्मक स्यालो तथा डिप ट्यूववेल निर्माण गरी भूमिगत जलको सतह (Water Level) को मोनिटरिंग गर्ने तथा भूमिगत जल भण्डारणको अध्ययन गर्ने
- भूमिगत जल पुनर्भरणको लागि मुख्य पुनर्भरण क्षेत्रको (Recharge Area) पहिचान गरी रिचार्ज वेल तथा पोखरीको विकास गरी पुनर्भरण क्षेत्र संरक्षणका गर्ने

सिँचाइ संरचना निर्माण कार्यः

- स्यालो तथा डिप ट्यूववेल निर्माण कार्य
- ट्यूववेलहरुमा पम्प जडान तथा विद्युतीकरण कार्य
- ट्यूववेलहरुमा पम्प घर तथा पानी वितरण प्रणाली निर्माण

अन्य कार्यः

- निर्माण भएका ट्यूववेलको मर्मत सम्भार तथा पुनर्स्थापना गर्ने
- ज.उ.स.को दिगो विकासका लागि तालिम तथा प्राविधिक सरसल्लाह प्रदान गर्ने

२.२. कार्यक्षेत्रको वस्तुगत अवस्था

यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र मूलतः रुपन्देही, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम) रहेको छ भने सम्भाव्य भएको क्षेत्रहरूमा पाल्पा तथा गुल्मी जिल्लाहरूमा समेत भूमिगत जल सम्बन्धी कार्य गर्ने गरी जिम्मेवारी दिइएको छ । तलको तालिकामा कार्यक्षेत्रका जिल्लाहरूको वस्तुगत विवरण रहेको छ ।

तालिका ३: कार्यालयको कार्यक्षेत्र विवरण

विवरण	रुपन्देही	नवलपरासी	पाल्पा	गुल्मी
कुल क्षेत्रफल (व.कि.मि.)	१२९७.४९	६३४.८८	१४६१.९०	१११०.७६
स्थानीय निकाय	१६	७	१०	१२
नगरपालिका	५	३	२	२
उप-महानगरपालिका	१	-	-	-
जनसंख्या	११२१९५७	३८६८६८	२४५०२७	२४६४९४
खेती योग्य जमिन (हे)	८९६३०	४१३७६	६६३१२	४६२५२
भूमिगत जलस्रोतको सम्भाव्य क्षेत्र (हे)	६२०५९	४०२००	यकिन नभएको	यकिन नभएको

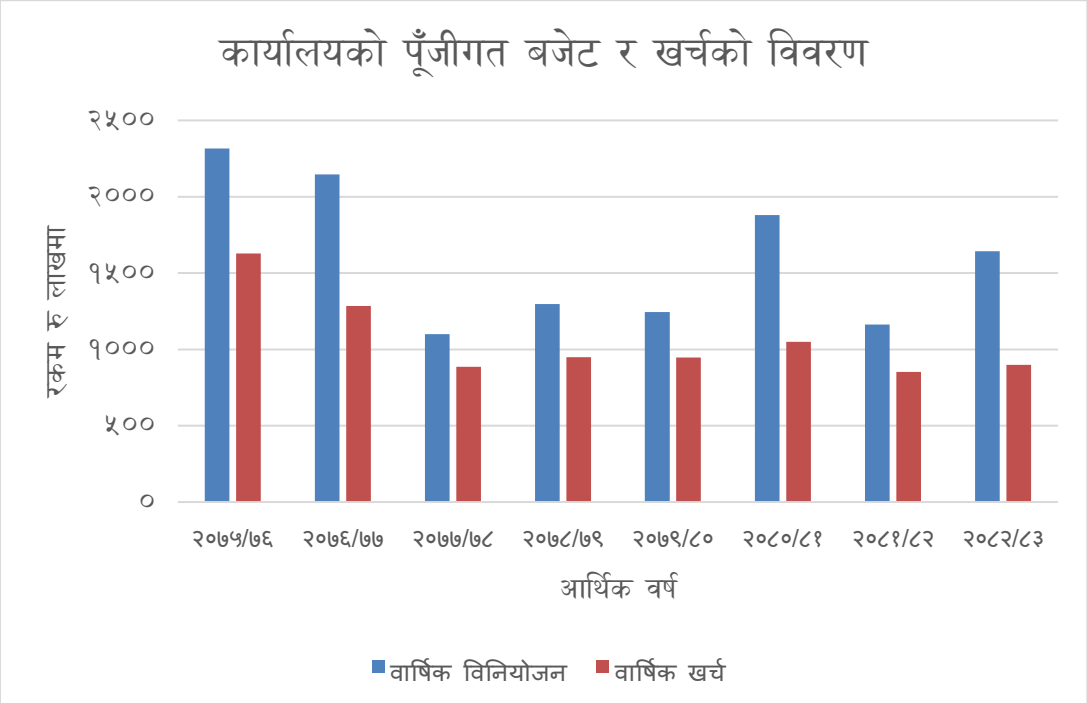
स्रोतः http:mofaga.gov.np,imp2019

भाग-तीन

३. आ. ब. २०८२/०८३ वार्षिक लक्ष्य तथा प्रगति

४.१. वार्षिक बजेट तथा खर्च विवरण

प्रदेश सरकार स्थापना पश्चात् अर्थात् आ.व. २०७५/७६ देखि २०८२/८३ सम्म कुल विनियोजित बजेट १ अरब २७ करोड ८९ लाख मध्ये ८४ करोड ९६ लाख (६६%) खर्च भएको छ । कार्यालयको प्रदेश स्थापना पश्चात्को पुँजीगत बजेटको वार्षिक विनियोजन र खर्च निम्न बमोजिम रहेको छ ।



चित्र १: कार्यालयको हाल सम्मको वार्षिक विनियोजन र खर्च

त्यसैगरि यस कार्यालयको आ.व. २०८२/८३ मा भएको वार्षिक विनियोजन र बार्षिक खर्चको विवरण तपसिलको तालिका बमोजिम रहेको छ ।

तालिका ४: आ.ब. २०८२/०८३ को वार्षिक विनियोजन तथा खर्च विवरण

(रकम रु हजारमा)

बजेट शीर्षक	सुरुको विनियोजन	संशोधित विनियोजन	वार्षिक खर्च	वित्तीय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
चालु	१८१९८	१८०३८	१२४४१	६८.९७ %		
पूँजीगत	१९०४१०	१६४२४५.९३	८९८९९	५८.८२ %	७५%	
जम्मा	२०८६०८	१८२२८३.९३	१०२३४०	५६.१४ %		

तालिका ५: आ.व. २०८२/०८३ को बजेट स्रोतको आधारमा वार्षिक प्रगति

(रकम रु हजारमा)

बजेट शिर्षक	सुरुको विनियोजन	संसोधित विनियोजन	बार्षिक खर्च	वित्तिय प्रगति	भौतिक प्रगति	कैफियत
चालु खर्च तर्फ						
भुमिगत जलस्रोत तथा सिचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरु (३०८०००१३३)	१३१९८	१३०३८	१०५६३	८१.०२%		
भुमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबेल सिचाइ कार्यक्रम (३०८०००१६३-बिशेष अनुदान)	५०००	५०००	१८७९	३७.५७%		
चालु जम्मा	**१८१९८**	**१८०३८**	**१२४४१**	**६८.९%**		
पूँजीगत खर्च तर्फ						
समानीकरण/राजश्व अनुदान तर्फका कार्यक्रम						
भुमिगत स्यालो तथा डिपट्युववेल सिँचाइ कार्यक्रम (३०८०००१६)	१२००१०	९४५४५.९	५५६०९	५८.८२%	७५%	
सिँचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम (३०८०००१८)	५८००	५१००	३४४७.२	६७.५९%	८४%	
खानेपानी आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम (३४७०२०१५४)	९६००	९६००	०		२०%	
विशेष अनुदान						
डिप ट्युववेल सिँचाइ योजनाको पुनर्स्थापना कार्यक्रम (३०८०००१६)	४००००	४००००	२८०७१	७०.१८%	१००%	
सशर्त अनुदान						
भुमिगत स्यालो तथा डिप ट्युववेल सिँचाइ आयोजना (३०८९११२४)	१५०००	१५०००	२७७०.९	१८.४७%	१००%	
पूँजीगत जम्मा	**१९०४१०**	**१६४२४५.९**	**८९८९९**	**५४.७%**		
कूल जम्मा	**२०८६०८**	**१८२२८३.९**	**१०२३४०**	**५६.१%**		

४.२. वार्षिक प्रगति सारांश

आ.ब. २०८२/०८३ मा सम्पादन भएका क्रियाकलापहरुको जिल्लागत बिनियोजन तथा खर्चको अबस्था तपसिल बमोजिमको तालिकामा रहेको छ ।

आ.ब. २०८२/८३ को योजनागत प्रगति विवरण

क्र.स.	जिल्ला	वार्षिक विनियोजन	वार्षिक खर्च	योजना संख्या	आ.व. २०८२/८३ मा कार्यान्वयन योजनासंख्या
क	३०८०००१६ भुमिगत स्यालो तथा डिपट्युववेल सिंचाई कार्यक्रम				
१	नवलपरासी	९०५८०.००	५१०९५.९२	४१	३६
२	रुपन्देही	२९८८०.००	२३०३७.७६	३९	३०
३	पाल्पा	१२२००.००	८१६८.१५	८	८
४	गुल्मी	१२१०.००	७०२.८०	४	१
	क को जम्मा	१३३८७०.००	८३००४.६२	९२	
ख	३०८०००१८ सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम				
१	नवलपरासी	४५७.१४	४४७.१२	१	१
२	रुपन्देही	४६४२.८६	३०००.१२	४	३
	ख को जम्मा	५१००.००	३४४७.२४	५	४
ग	३०८९११२४ भुमिगत स्यालो तथा डिप ट्युववेल सिंचाई आयोजना(संघ शसर्त अनुदान)				
१	नवलपरासी	१५०००.००	२७७०.९०	३	१
	ग को जम्मा	१५०००.००	२७७०.९०	३	१
	कुल जम्मा	१५३९७०.००	८९२२२.७६	१००.००	५.००
			जिल्लागत सारांश		
१	नवलपरासी	१०६०३७.१४	५४३१३.९४	४५.००	३८.००
२	रुपन्देही	३४५२२.८६	२६०३७.८७	४३.००	३३.००
३	पाल्पा	१२२००.००	८१६८.१५	८.००	८.००
४	गुल्मी	१२१०.००	७०२.८०	४.००	१.००
	जम्मा	१५३९७०.००	८९२२२.७६	१००	८०

Account Name	Budget	Expense	Remaining	Progress
308000164-भुमिगत स्यालो तथा डिपट्युववेल सिंचाई कार्यक्रम	Rs. 160,010,000	Rs. 83,681,065	Rs. 76,328,935	52.3%
308000133-भूमिगत जलस्रोत तथा सिंचाइ विकास डिभिजन कार्यालयहरु	Rs. 13,198,000	Rs. 10,562,943	Rs. 2,635,057	80.03%
308911244-भुमिगत स्यालो तथा डिप ट्युववेल सिंचाई आयोजना(संघ शसर्त अनुदान)	Rs. 15,000,000	Rs. 2,770,897	Rs. 12,229,103	18.47%
308000163-भुमिगत स्यालो तथा डिपट्युववेल सिंचाई कार्यक्रम	Rs. 5,000,000	Rs. 1,878,502	Rs. 3,121,498	37.57%
308000184-सिंचाई आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	Rs. 5,800,000	Rs. 3,447,232	Rs. 2,352,768	59.44%
347020154-खानेपानी आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम	Rs. 9,600,000	Rs. 0	Rs. 9,600,000	0%

४.३. योजनागत वार्षिक प्रगति

क) भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबवेल सिँचाइ कार्यक्रम (समानिकरण)

भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्यूववेल सिँचाइ आयोजना (३०८०००१६४) तर्फको आ.व. २०८२/०८३ को योजनागत प्रगति अवस्था तपसिल बमोजिम रहेको छ ।

तालिका ६: आ.व. २०८२/०८३ को प्रगति अवस्था-सामानिकरण तर्फ

(रकम रु. हजारमा)

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	मुख्य कार्य	कैफियत
१	जोकवार र सनहीको बीचमा पिपरीया निर वाड नं. ४ डिप ट्युववेल सिंचाइ प्रणालि, रामग्राम नवलपरासी	४००	३९५.७	२०९ मि. uPVC	
२	लुम्बिनी सास्कृतिक नं.पा. सिविक मधुवन ७, मेहालवारी, डिप टयुववेल सिचाइ प्रणाली, रुपन्देही	४००	३९५.५	२५८ मि uPVC	
३	पावर ड्रिल स्यालो ट्यूववेल निर्माण गुल्मी विभिन्न स्थान	१२००	७०२.८	१ PDSTW	
४	पावर ड्रिल स्यालो ट्यूववेल निर्माण पाल्पा विभिन्न स्थान	१२००	१०१७	२ PDSTW	
५	पालडाँडा डिप ट्यूववेल सिँचाइ प्रणाली, बर्दघाट-५, नवलपरासी	४००	३९४.७	२२२ मि uPVC	
६	कुमारगड्डी डिप ट्यूववेल सिं. यो., सैनामैना-९, रुपन्देही	२०००	१९९१.६८	१ DTW	
७	न्यु सृजलशिल युवाक्लब डिप ट्बवेल सिं.यो., बर्दघाट-६, नवलपरासी	१८४०	१२४३.७४	१ PH/Pump	
८	रामग्राम डिप ट्यूववेल सिं. यो., रामग्राम-१४, नवलपरासी	२५००	२३३८.५९	१ PH/Pump/Trans.	
९	मदनपोखरा डिप ट्यूववेल सिं. यो., ता.न.पा., पाल्पा	२०००	१२५३.३	१ PH/Pump	
१०	कुन्सेर डिप ट्यूववेल सिं. यो, तानसेन-७, पाल्पा	१५००	११०६.२५	१ DTW	
११	नौड़िया स्यालो ट्यूववेल सिं. यो, बर्दघाट-१५, नवलपरासी	१०		कार्यन्वयन नभएको	
१२	झारबैरा रन्यौरा स्यालो ट्यूववेल सिं. यो, सैनामैना-४ रुपन्देही	६००	५२५.७६	१ PDSTW	
१३	खनकपुर स्यालो ट्यूववेल सिं. यो, सैनामैना-२ रुपन्देही	१०००	८६२.५५	१ PDSTW	
१४	लघुनाहा डिप ट्युववेल सिँचाइ प्रणाली बर्दधाट ३ नवलपरासी	१२००	३८३.५	PH	

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	मुख्य कार्य	कैफियत
१५	तिलौली डिप वोरिङ्ग सरावल गा. पा. - २ नवलपरासी	२०००	११४६	१ PH/Pump	
१६	वाँसा डिप वोरिङ्ग सरावल -१ नवलपरासी	२०००	११४८.७१	१ PH/Pump	
१७	माझा डिप ट्यूववेल सिं.यो, तानसेन-९, पाल्पा	२०००	१७९८.४	१ PH/Pump	
१८	माडी थटिया डिप ट्यूववेल सिं.यो, बगनासकाली-२, पाल्पा	२५००	६२६.५७	Electrification (ठेक्का म्यादथप)	क्रमागत
१९	मुखिया टोल बङ्गाली डिप ट्यूववेल सिं. यो., देवदह-८, रुपन्देही	२३००	२२५४.७२	१ PH/Pump/Ele	
२०	अर्गली डिप बोरिङ सिँचाई योजना, तानसेन १४, पाल्पा	१५००	११२३.२९	१ DTW	
२१	कृषकहरुका लागी स्यालो ट्युववेल जडान-कोटहीमाइ ४, रुपन्देही	९६०	६५४.३६	२ PDSTW	
२२	रानीबारी प्रगती टोल डिप वोरीङ्ग, बुटवल १९	२५००	२४०४.०९	१ PH/Pump/Ele	
२३	बुटवल उ.म.न.पा. मोटीसर १ रानीगञ्ज, डिप ट्युववेल सिँचाइ प्रणाली	१०		कार्यान्वयन नभएको	
२४	भडच्छी बगाहा डिप ट्यूववेल सैनामैना रुपन्देही	४८०	४२१.०९	Pump	
२५	पवित्र बस्ति डिप ट्युवबेल सिं यो, बर्दघाट -१४, नवलपरासी	४००	३५६.२३	२०१ मि. uPVC	
२६	जयमाँ कोटाही डिप ट्यूववेल सिंचाइ प्रणाली रामग्राम ८ नवलपरासी	८००	७८९.२४	४२४ मि. uPVC	
२७	गणेशपुर डाडाटोल डिप ट्यूववेल सिँचाइ प्रणाली, तिलोत्तमा ६ रुपन्देही	१०		कार्यान्वयन नभएको	
२८	शिव पार्वती स्यालो ट्यूववेल पाल्हिनन्दन ४ नवलपरासी	४००	३६७.१४	६ STW	
२९	जागरुक स्यालो ट्यूववेल तिलोत्तमा ८ रूपन्देही	६००	५६५.८४	१ PDSTW	
३०	हिमाली स्यालो ट्यूववेल रामग्राम १६ नवलपरासी	१०००	९४२.२	१ PDSTW	
३१	महल्बारी कुडिया स्यालो ट्यूववेल सुस्ता २ नवलपरासी	५००	४९६.८८	५ STW	
३२	ठुलो गैरी सानो गैरी स्यालो ट्यूववेल माथागढ़ी १ पाल्पा	९००	६७७.२७	१ PDSTW	
३३	संगम टोल स्यालो ट्यूववेल ता.न.पा. ९ पाल्पा	६००	५६६.०५	१ PDSTW	

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	मुख्य कार्य	कैफियत
३४	एकिकृत सिँचाइ तथा कृषि विकास कार्यक्रम (ज्योति महिला कृषक, सिवानगढ़, रामग्राम १३, नवलपरासी)	१०००	९२७.७८	१ PDSTW	
३५	एकिकृत सिँचाइ तथा कृषि विकास कार्यक्रम (हरियाली कृषिसिँचाइ, सुद्धोदन १ वेलवा रूपन्देही)	१०००	९३३.३९	१३ STW	
३६	बाल्मिकी स्यालो ट्यूववेल योजना, बर्दघाट १ नवलपरासी	५५०	५३०.७	१ PDSTW	
३७	ट्यूववेल जडान कार्य,धुरकोट-५ औद्योगिक क्षेत्र, छल्दीखोला, गुल्मी	१०		कार्यान्वयन नभएको	
३८	सुमेरु स्यालो ट्यूववेल योजना, तिलोत्तमा ८ रुपन्देही	७००	६३१.१४	१ PDSTW	
३९	सालघारी स्यालो ट्यूववेल योजना, गैडहवा ७ रुपन्देही	७००	६४०.२४	१ PDSTW	
४०	श्रीनगर डिप ट्यूववेल योजना, रामग्राम-१४, नवलपरासी	२५००		बहुवर्षीय ठेक्का	
४१	स्यालो ट्युबेल बर्दघाट ४ चारघरे टोल, अधुरो आउटलेट निर्माण देवदह-२, रोहिणि ४ छिइपागढ ,देवदह ३ सिसपुर, देवदह ८ बंगला , रुपन्देहि	१०		कार्यान्वयन नभएको	
४२	स्यालो ट्युबेल सैनामैना न.पा. -६ इंगुरिया टोल रुपन्देहि	५००	४७९.४६	१ PDSTW	
४३	स्यालो ट्युबेल लुम्बिनि सांस्कृतिक रुपन्देहि	१०		कार्यान्वयन नभएको	
४४	देवदह न.पा.-५ डायमण्डपथ, रोहिणि गा. पा.-७ टिकर, स्यालो रुपन्देही	१०००	९३९.२४	२ PDSTW	
४५	सैनामैना न.पा वार्ड -११ चिसापानि टोलमा स्यालो ट्युबेल, रुपन्देहि	५००	४३५.९९	१ PDSTW	
४६	हिमालि स्यालो ट्युवेल ज उ स , रामग्राम १६ , भुसनापुर स्यालो ट्युवेल ज उ स , रामग्राम १४ घोडपालि स्यालो ट्युवेल ज उ स , नवलपरासि	८००	७०८.४२	१ PDSTW	
४७	प्रतापपुर गा.पा.३,५,६,७ र ९ स्यालो ट्युबेल जडान, नवलपरासि	१०००	९२१.६९	९ STW	
४८	डिप ट्युववेल सिँचाइ योजनाको पुनर्स्थापना कार्यक्रम	४००००	२८०७१.३६	२३ DTW मर्मत	बिशेष तर्फ
४९	नवदुर्गा स्यालो ट्युबेल ज.उ.स.रामग्राम १६, नवलपरासी	१०००	९२९.६६	१ PDSTW	

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	मुख्य कार्य	कैफियत
५०	दाउन्ने स्यालो ट्युबेल ज.उ.स. पाल्हिनन्दन ५, नवलपरासी	१०००	८७५.१	१३ STW	
५१	कर्बला टोल डिप ट्युबेल सैनांमैना ४, रुपन्देही	२०००		बहुवर्षीय ठेक्का	
५२	समयमाइ स्यालो ट्यूववेल योजना,मर्चवारी ४ रुपन्देही	५००	४११.५६	४ STW	
५३	कृषि सिचाइका लागि स्यालो ट्युबल मायादेवी गा.पा.७, ओमसतिया गा.पा.२, तिलोत्तमा न.पा.१४, सि.न.पा.२, ४, ९, १०, ११ र मायादेवी गा.पा.८	८७०		कार्यान्वयन नभएको	
५४	सिँचाइ वोर जडान देवदह — ६ रुपन्देही	५००	४७९.४६	१ PDSTW	
५५	सिँचाइकोलागि स्यालो टयुबवेल कुम्भीचोक बुर्जाटोल, देवदह २, रुपन्देही	९६०	७१५.४२	१ PDSTW	
५६	सिचाईको लागि बुटवल १९ देवीस्थान टोल अन्तर्गत देवीस्थान स्यालो ट्यूवेल ३ थान र बुटवल १९ मनोहरापुर टोल ३ थान	७००	६६४.०४	१ PDSTW	
५७	शिशै कृषिक समुह स्यालो ट्युवेलहरु जडान, शुद्धोधन गा.पा. वडा नं. १ (रुपन्देही)	८००	७७५.७	६ STW	
५८	सिँचाइको लागी ट्युवेल जडान ,रामग्राम ८ उनवछ नवलपरासी	१०००	८७४.१८	१ PDSTW	
५९	कृषि सिचाइका लागि स्यालो ट्युबल मायादेवी गा.पा.७, ओमसतिया गा.पा.२, तिलोत्तमा न.पा.१४, सि.न.पा.२, ४, ९, १०, ११ र मायादेवी गा.पा.८	१६००		कार्यान्वयन नभएको	
६०	सिसवा डिप ट्युबेल	४००		कार्यान्वयन नभएको	
६१	मोतिवारी स्यालो ट्युबेल	८००	७७६.६५	९ STW	
६२	सुक्रौली घिनाहा डिप ट्युबेल	१६००		बहुवर्षीय ठेक्का	
६३	पल्ही लोहरौपी डिप ट्यसबेल	३०००		कार्यान्वयन नभएको	
६४	गौघाटमा स्यालो ट्युबेल 10 थान निर्माण	१२००		कार्यान्वयन नभएको	
६५	घोडाहा सिँचाइ बोरिङ्ग देवदह-९	८००		कार्यान्वयन नभएको	
६६	बेल भरिया स्यालो टुबेल	८००		कार्यान्वयन नभएको	

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	मुख्य कार्य	कैफियत
६७	डोलही स्यालो ट्युबेल सूर्यपुरा	८००	७५०.५३	२ PDSTW	
६८	बगाले खोला डिप बोरिङ्ग सञ्चालन रे न पा ९ गुल्मी	४००		कार्यान्वयन नभएको	
६९	खपटेकारुख बोरिङ्ग सिचाई योजना सत्यवती ४ गुल्मी	८००		कार्यान्वयन नभएको	
७०	विद्युतिकरण,तारपोल,मोटरपम्प जडान रामग्राम १४,१५,१६,१८,९	८०००	११५८.६	२ PDSTW	
७१	शुक्रौली घिनहा डिप ट्यूववेल रामग्राम नगरपालिका वडा नं.१५ नवलपरासी	१६००		बहुवर्षीय ठेक्का	
७२	घोडपाली डिप ट्यूववेल ज.उ.स रामग्राम नगरपालिका वडा नं.३ नवलपरासी	२०००		बहुवर्षीय ठेक्का	
७३	भूस्नापूर डिप ट्यूववेल ज.उ.स रामग्राम नगरपालिका वडा नं.१४ नवलपरासी	२०००		बहुवर्षीय ठेक्का	
७४	जय गणेश डिप ट्यूववेल ज.उ.स रामग्राम नगरपालिका वडा नं.१७ नवलपरासी	२०००		बहुवर्षीय ठेक्का	
७५	जोकवार ललितपुर डिप ट्यूववेल ज.उ.स रामग्राम नगरपालिका वडा नं.९ नवलपरासी	२०००		बहुवर्षीय ठेक्का	
७६	सिंचाइ संस्थागत विकास कार्यक्रम	२४०	२३५.६९	कृषक तालिम	
७७	नयाँ मेशिन ड्रिल ट्यूववेल बोरिङ्ग, मायादेवी, सियारी, कोटाहिमाई, रुपन्देही	५००		कार्यान्वयन नभएको	
७८	सुनवल डिप ट्यूववेल सिंचाइ, सुनवल-७, तर्गौली, नवलपरासी	८००	५७०.२८	१ पम्प	
७९	चन्द्रज्योती डिप ट्यूववेल सिंचाइ उप-आयोजना बर्दघाट-१५	४००	४००	२१५ मि. uPVC	
८०	जय माँ दुर्गा डिप ट्यूववेल, रामग्राम-१७, पठ्खौली, नवलपरासी	८००	७९०.३३	४३० मि. uPVC	
८१	कोटस्थान डिप ट्युवबेल सिं यो, सरावल ४, हात्तीवन, नवलपरासी	१२३०	१२२५.८९	1 PH/Pump/Ele	पुरानो दायित्व
८२	जय समईमाई डिप ट्यूववेल, गैडहवा ३, बर्गदवा, रुपन्देही	४००	३९५.४८	२६० मि. uPVC	
८३	लुम्बिनि हरियाली कृषक डिप ट्यूववेल सिं यो, लुम्विनी ११, , महादेवा, रुपन्देही	१६००	१२२६.९१	१५८२ मि. 4" uPVC	
८४	गंगा पृथीवी डिप ट्यूववेल सिं यो, बर्दघाट-१४, गंगाबस्ती, नवलपरासी	८००	७५७.३१	401 मि. uPVC	

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बार्षिक बजेट	वार्षिक खर्च	मुख्य कार्य	कैफियत
८५	शान्तिटोल डिप ट्यूववेल सिं यो, कन्चन-५, रुपन्देही	४००	४००	२५० मि. uPVC	
८६	हनुमान डिप ट्यूववेल सिं यो, कन्चन-3, रुपन्देही	४००	३७०.५६	२५० मि. uPVC	
८७	बरमपुरवा डिप ट्यूववेल सिंचाइ, उप-आयोजना रामग्राम-९	४००	२६५	१ PH	
८८	सम्पन्न भएका योजनाहरुको कमिसनिङ्ग कार्य तथा योजना हस्तान्तरण	४००	४०१.०२	1 Pump/1 Control Panel/NEA Meter Charge	
८९	मोति बस्ति डिप ट्युब वेल सिंचाइ योजना, बर्दघाट-,१ नवलपरासी	१६००	१०३६.२२	८२९ मि. uPVC	
९०	सानो गैडहवा डिप ट्यूववेल सिंचाइ योजना, गैडहवा -३ रुपन्देही	८००	७९०.४८	४६२ मि. uPVC	
९१	शान्ति डिप ट्यूववेल सिंचाइ योजना गैडहवा -७ रुपन्देही	१२००	९६५.२७	७२१ मि. uPVC	
९२	कृषि सिंचाइ योजना, बर्दघाट-११, नवलपरासी	२१००		अदालतमा मुद्दा	
९३	रुपौलिया डिप ट्युब वेल सिंचाइ योजना, सुस्ता-१, नवलपरासी	१२८०	६२९.७७	1 PH (ठेक्का म्यादथप भएको)	क्रमागत
९४	सामाजिक परिचालन तथा प्रचार प्रसार	६७६	६७५.९		
	जम्मा	**१३४५४५**	**८३६८०.५**		

तालिका ७: संघीय विशेष अनुदानबाट भएको प्रगति
(डिप ट्युववेल सिँचाइ योजनाको पुनर्स्थापना कार्यक्रम)

क्र.स.	ज.उ.स को नाम	कार्य विवरण
१	सिद्धार्थ डिप ट्यूववेल, बर्दघाट १२	४०२ मि. पाइपलाइन तथा ४ थान नयाँ र १३ थान पुरानो आउटलेट मर्मत ।
२	बिश्रामपुर डिप ट्यूववेल, बर्दघाट १२, चौपट्टा	६२२ मि. पाइपलाइन तथा ६ थान नयाँ र ११ थान पुरानो आउटलेट मर्मत ।
३	दुर्गा डिप बोरिङ, बर्दघाट १२, चौपट्टा	९२७ मि. पाइपलाइन तथा ९ थान नयाँ आउटलेट निर्माण ।
४	१५ नं. डिप बोरिङ, बर्दघाट १२, सापहिया	१ थान नयाँ ट्रान्सफर्मर सहितको विद्युतिकरण, ९९५ मि. पाइपलाइन तथा ८ थान नयाँ आउटलेट निर्माण ।
५	नम्बर २ मध्यम बोरिङ, बर्दघाट १२, दाबिला	४२० मि. पाइपलाइन तथा 4 थान नयाँ आउटलेट निर्माण ।
६	मंगलपुर डिप बोरिङ, बर्दघाट १२	११७९ मि. पाइपलाइन तथा 11 थान नयाँ आउटलेट निर्माण ।

क्र.स.	ज.उ.स को नाम	कार्य विवरण
७	१ नं. डीप बोरिङ, भटौलिया, बर्दघाट १२	३५६ मि. पाइपलाइन तथा ३ थान नयाँ आउटलेट निर्माण ।
८	सन्तोषी माता डिप बोरिङ, बर्दघाट १२, कुसुमचोक	८०३ मि. पाइपलाइन तथा ८ थान नयाँ र ८ थान पुरानो आउटलेट मर्मत ।
९	किसान कृषक समुह, बर्दघाट १२, बरगदाई	१ थान १५ hp पम्प १६१३ मि. पाइपलाइन तथा १४ थान नयाँ आउटलेट निर्माण ।
१०	कोटहिमाई डिप बोरिङ, बर्दघाट १२	५९९ मि. पाइपलाइन तथा ५ थान नयाँ र १२ थान पुरानो आउटलेट मर्मत ।
११	कालिका डिप ट्यूववेल, बर्दघाट १३	१२३४ मि. पाइपलाइन तथा ११ थान नयाँ आउटलेट निर्माण ।
१२	नम्बर ४ मध्यम बोरिङ, बर्दघाट १३, धनेवा (रानीनगर WUA)	९०७ मि. पाइपलाइन तथा १० थान नयाँ आउटलेट निर्माण ।
१३	नम्बर ७ मिडियम बोरिङ, बर्दघाट १३, रानीनगर, धनेवा	१ थान १० hp पम्प ७६४ मि. पाइपलाइन तथा ८ थान नयाँ आउटलेट निर्माण ।
१४	त्रिशक्ति डिप बोरिङ, बर्दघाट १३, रानीनगर, धनेवा	७०८ मि. पाइपलाइन तथा १० थान नयाँ आउटलेट निर्माण ।
१५	नम्बर ५ मध्यम बोरिङ बर्दघाट १३, रानीनगर	१ थान १० hp पम्प ६९४ मि. पाइपलाइन तथा ६ थान नयाँ आउटलेट निर्माण ।
१६	नम्बर ६ मध्यम बोरिङ बर्दघाट १३, रानीनगर (नवएकाता कृषक समूह WUA)	१०१५ मि. पाइपलाइन तथा ९ थान नयाँ आउटलेट निर्माण ।
१७	नम्बर १० मध्यम बोरिङ, बर्दघाट-१३	१ थान १० hp पम्प जडान तथा पम्प घर मर्मत ।
१८	नम्बर ८ मिडियम बोरिङ, धनेवा, बर्दघाट १३, रानीनगर	१५१५ मि. पाइपलाइन तथा १२ थान नयाँ आउटलेट निर्माण ।
१९	नं.९ मिडियम बोरिङ, धनेवा, बर्दघाट १३, रानीनगर	९६९ मि. पाइपलाइन तथा १० थान नयाँ आउटलेट निर्माण ।
२०	३ नं. डिप बोरिङ, प्रतापपुर १, जमुनिया, नवलपरासी (ब्रहम्बाबा WUA)	७९५ मि. पाइपलाइन तथा ५ थान नयाँ आउटलेट निर्माण ।
२१	मलङ्गबाबा डिप ट्यूववेल	१ थान नयाँ डिप ट्यूववेल निर्माण ।
२२	MTW-१, ट्यूववेल दविल्ला	१ थान १० hp पम्म जडान ।

(नोटः- डिप ट्युववेल सिँचाइ योजनाको पुनर्स्थापना कार्यक्रम-भुमिगत स्यालो तथा डिप ट्युववेल सिँचाइ कार्यक्रम (३०८०००१६) मा रु ४ करोड विनियोजन भएकोमा ठेक्कापट्टाबाट कार्य सम्पन्न हुँदा रु २.८ करोड खर्च भएको)

ख) भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युबवेल सिँचाइ आयोजना (संघीय ससर्त)

भूमिगत स्यालो तथा डिप ट्युववेल सिँचाइ आयोजना (संघ ससर्त अनुदान, ३०८९११२४४) कार्यक्रम अन्तर्गत ३ योजनामा कुल १ करोड ५० लाख विनियोजन भएकोमा २ वटा योजना कार्यान्वयनमै नगएको

र एउटा योजना कार्यान्वयनमा गई नवलपरासी जिल्लाको सुस्ता १ मा ३० थान स्यालो ट्यूववेल निर्माण सम्पन्न भई कुल ६० हेक्टर जमिनमा सिँचाइ सुविधा विस्तार भएको छ । यस योजना अन्तर्गत निर्माण भएको स्यालो ट्यूववेल विवरण अनुसूचीमा समावेश गरिएको छ ।

तालिका ८: ससर्त तर्फका योजनाहरूको प्रगति अवस्था

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	वार्षिक विनियोजन	वार्षिक खर्च	सम्पादित मुख्य कार्य	कैफियत
१	विनयी त्रिवेणी गा.पा. वडा न. ६ कोटिहोम मन्दिर देखी पश्चिमतर्फ ढुङ्गाना वस्ती केउलानी क्षेत्रको कृषियोग्य करिव ४० विगाहा क्षेत्रमा कृषि सिँचाइ प्रयोजनार्थ डिप बोरिङ्ग (विनियी त्रिवेणी- नवलपरासी (ब,सु.पू.)	५०००		कार्यान्वयन नभएको	कार्यक्षेत्रमा नपरेकोले (गण्डकी प्रदेशको कार्यक्षेत्र)
२	सुस्ता-१ रूपौलिया छिवनी, फेचुवा र सिंगाहाको असिंचित कृषि क्षेत्रमा सिँचाइ प्रयोजनार्थ बोरिङ (स्यालो सेट) नवलपरासी	५०००	२७७०.९	३० STW	योजना सम्पन्न
३	निर्माणधिन डिप बोरिङ्गको पाईपलाईन विस्तार कार्य प्रतापपुर गा पा वाड नं.१ सेमरी नवलपरासी (वर्दघाट सुस्ता पश्चिम)	५०००		कार्यान्वयन नभएको	योजना फेला नपरेको
	जम्मा	**१५०००**	**२७७०.९**		

ग) सिँचाई योजना मर्मत सम्भार तथा विस्तार (३०८०००१८४)

विगत वर्षहरूमा निर्माण सम्पन्न भई हस्तान्तरण भैसकेका योजनाहरूमा कृषकहरूको आफ्नै स्रोत तथा साधनबाट मर्मत गरी सञ्चालन गर्न नसकिएका योजनाहरूमा कृषक र प्रदेश सरकारको संयुक्त लगानीबाट संरचना मर्मत गरी सिँचाइ प्रणाली सुदृढीकरण गरी सञ्चालनमा ल्याउन यो कार्यक्रमले सहयोग गरेको छ । आ.व. २०८२/८३ मा मर्मत गरि सुदृढीकरण पच्यात संचलान गरिएका विभिन्न योजनाहरूको विवरण तपसिल बमोजिम रहेको छ ।

तालिका ९:मर्मत सम्भार तर्फका योजनाहरूमा भएको कार्य विवरण

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बिनियोजन	खर्च	सम्पन्न कार्य	कैफिएत
१	प्रगति डिप ट्युबबेल कन्चन ५, लखनचोक डिप ट्यूववेल सिंचाइ कन्चन ३,रुपन्देही	१०००	८८९.३६	२ स्थानका योजनामा ५५० मिटर पाइप लाइन र ३ थान आउटलेट निर्माण	
२	मंजरिया डिप ट्यूववेल रामग्राम १०, हकुई डिप ट्यूववेल रामग्राम १६,साम्यमाइ डिप ट्यूववेल सुनवल ७ तगौंली, हरियाली डिप ट्यूववेल रोहिणी ६ रुपन्देहीमा ट्रान्सफरमर मर्मत/पुनर्स्थापन जडान कार्य	२०००	८९४.२४	हरियाली डिप ट्यूववेल रोहिणी-६ मा ५० KVA र साम्यमाइ DTW सुनवल -७ मा २५ KVA को ट्रान्सफर्मर जडान	
३	डिप बोरिङ्ग मर्मत सैनांमैना १, रुपन्देही	१०००	६८४.४१	पाइप तथा पम्प खरिद कार्य	
४	घोडाहा सिँचाइ बोरिङ्ग देवदह-९	८००		कार्यान्वयन नभएको	
५	आकस्मिक डिप ट्यूववेल सिचाई प्रणाली मर्मत सम्भार, (रुपन्देही, नवलपरासी)	१०००	९७७.७	३ थान पम्प तथा १ थान प्यानल वोर्ड जडान कार्य ।	
	कुल	**५८००**	**३४४७.२**		

घ) खानेपानी आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार (३४७०२०१५४)

प्रदेश सरकारको वार्षिक विनियोजन गर्ने सिलसिलामा सिँचाइ प्रयोजनको लागि नयाँ डिप ट्यूववेल निर्माण गर्नु पर्ने कार्य खानेपानी मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायमा भुल बस विनियोजन हुन गएको र २०८२ फाल्गुन पछि उक्त योजनाहरू यस कार्यालयमा कार्यान्वयनको लागि अख्तियारी प्राप्त हुन आएकाले वित्तीय प्रगति नभएको तथा उक्त बजेट उपशीर्षक अन्तर्गतका योजनाहरूको प्रगति अवस्था तपसिल बमोजिम रहेको छ ।

तालिका १०:खानेपानी आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	बिनियोजन	खर्च	सम्पन्न कार्य	कैफिएत
१	रेक्सहवा डिप ट्युववेल ज.उ.स. रामग्राम न.पा — १४ नवलपरासी	२४००	०	बहुवर्षीय ठेक्का भएको	
२	घिनाह डिप ट्युववेल ज.उ.स. रामग्राम न.पा — १५ नवलपरासी	२४००	०	बहुवर्षीय ठेक्का भएको	
३	लंकहवा डिप ट्युववेल ज.उ.स. रामग्राम न.पा — १० नवलपरासी	२४००	०	बहुवर्षीय ठेक्का भएको	
४	श्रीनगर डिप ट्युववेल ज.उ.स. रामग्राम न.पा — १४ नवलपरासी	२४००	०	कार्यान्वयन नभएको	ठेगाना नमिलेकोले
	कुल	**९६००**	**०**		

४.४. कार्यान्वयन हुन नसकेका योजनाहरू

आ.व. २०८२/०८३ मा यस कार्यालयलाई प्राप्त वार्षिक कार्यक्रम बमोजिम विविध कारणले तपसिल बमोजिमका कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन हुन सकेनन्।

तालिका ११: आ.व.२०८२/०८३ मा कार्यान्वयन हुन नसकेका योजना विवरण

क्र.सं.	कार्यक्रम	बजेट (ह)	कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण
क)	**संघ शसर्त अनुदान तर्फका योजनाहरू**		
१	११.४.१५.२१२६ विनयी त्रिवेणी गा.पा. वडा न. ६ कृषि सिँचाइ प्रयोजनार्थ डिप बोरिङ्ग	५०००	योजना गण्डकी प्रदेशमा पर्ने भएकोले यस कार्यालयको कार्यक्षेत्रमा नपर्ने
२	११.४.१५.२१३. निर्माणधिन डिप बोरिङ्गको पाईपलाईन विस्तार कार्य प्रतापपुर गा पा वाड नं.१ सेमरी नवलपरासी	५०००	तोकिएको स्थानमा डिप ट्यूववेल योजना नभएको
ख)	**खानेपानी आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम**		
३	११.४.१६.४८२४ श्रीनगर डिप ट्युववेल ज.उ.स. रामग्राम न.पा — १४ नवलपरासी	२४००	माग बमोजिम ठेगाना नमिलेकोले ठेगाना सच्याउन लेखि पठाएकोमा नसच्चिएको
ग)	**भूमिगत स्यालो तथा दिप ट्यूववेल सिँचाइ आयोजना**		
४	११.४.१५.१४५९ नौड़िया स्यालो ट्यूववेल सिं. यो, बर्दघाट-१५, नवलपरासी	६००	उपभोक्ता सम्पर्कमा नआएको
५	११.४.१५.२०३४ बुटवल उ.म.न.पा. मोटीसर १ रानीगङ्ग, डिप ट्युववेल सिँचाइ	१०००	निर्माणस्थलमा जग्गा बिबाद हुन गएको
६	११.४.१५.२०७७ गणेशपुर डाडाटोल डिप ट्यूववेल सिँचाइ, तिलोत्तमा ६ रुपन्देही	१९२०	प्रयाप्त सिंचित क्षेत्र नभएको, योजना आवश्यक नदेखिएको, माग समेत नआएको
७	११.४.१५.२०८८ ट्यूववेल जडान कार्य, धुरकोट-५ औद्योगिक क्षेत्र, छल्दीखोला, गुल्मी	७००	मागकर्ता सम्पर्कमा भएतापनि मागफाराम नआएको
८	११.४.१५.२१४८ स्यालो ट्युबेल बर्दघाट ४ चारघरे टोल, अधुरो आउटलेट निर्माण देवदह-२, रोहिणि ४ छिइपागढ ,देवदह ३ सिसपुर, देवदह ८ बंगला , रुपन्देहि	४००	योजनास्थल धेरै र विनियोजित रकम थोरै भएको
९	११.४.१५.२१५० स्यालो ट्युबेल लुम्बिनि सांस्कृतिक रुपन्देहि	५००	बढी गहिरो जानु पर्ने भएकोले रकम नपुगेको
१०	११.४.१५.२२३० कृषि सिचाइका लागि स्यालो ट्युबल मायादेवी गा.पा.७, ओमसतिया गा.पा.२, तिलोत्तमा न.पा.१४, सि.न.पा.२, ४, ९, १०, ११ र मायादेवी गा.पा.८	१२७०	योजनास्थल धेरै र विनियोजित रकम थोरै भएको
११	११.४.१५.२२४७ सिसवा डिप ट्युबेल	८००	प्रस्ट ठेगाना नखुलेको
१२	११.४.१५.२२४४ कृषि सिचाइका लागि स्यालो ट्युबल मायादेवी गा.पा.७, ओमसतिया गा.पा.२,	४००	स्थान धेरै तोकिएको र बजेट कम भएको

क्र.सं.	कार्यक्रम	बजेट (ह)	कार्यान्वयन हुन नसक्नुको कारण
	तिलोत्तमा न.पा.१४, सि.न.पा.२, ४, ९, १०, ११ र मायादेवी गा.पा.८		
१३	११.४.१५.२२५६ खपटेकारुख बोरिङ्ग सिचाई योजना सत्यवती ४ गुल्मी	८००	तोकिएको स्थानमा प्राविधिक रूपमा पानी आउने सम्भावना नदेखिएको
१४	११.४.१५.२२५५ बगाले खोला डिप बोरिङ्ग सञ्चालनरे न पा ९ गुल्मी	४००	TW भै.लु.भू.ज. बाट निर्माण भएकोले बाँकी कार्यपनि उतैबाट हुनुपर्ने (कानुनि कठिनाई)
१५	११.४.१५.२२५० पल्ही लोहरौपी डिप ट्यसबेल	२४००	समयमा माग नआएकोले appraisal report तैयार नभएको
१६	११.४.१५.२२५१ गौघाटमा स्यालो ट्युबेल 10 थान निर्माण	१२००	माग प्राप्त नभएको
१७	११.४.१५.३४८ नयाँ मेशिन डिर्ल ट्यूववेल बोरिङ्ग, मायादेवी, सियारी, कोटाहिमाई, रुपन्देही	५००	स्थान धेरै तोकिएको र बजेट कम भएको
	११.४.१५.८९३ कृषि सिंचाइ योजना, बर्दघाट-११, नवलपरासी	१६८०	आदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकोले ठेक्का अन्तिम किनारा नलागेको
१८	११.६.१६.६ परामर्श सेवा - भुमिगत रुपन्देही (हर्मिचौर, अर्बेनी कालिगण्डकी वडा नं. १,२ गुल्मीमा भूमिगत जलस्रोतको सम्भाव्यता अध्ययन)	४००	सुरुमा रकम रोक्का भएको र पछि रोक्का खुलेपछि कार्य गर्न समय तथा जनशक्ति उपलब्ध हुन नसकेको
१९	११.६.१६.७ सिँचाइ गुरुयोजना तयारीको लागि तथ्याङ्क सङ्कलन कार्य (Inventory works)	४००	मन्त्रालयले एकरूपताको लागि नमुना फर्म्याट बनाउने भनेकोमा समयमा प्राप्त गर्न नसकेकोले
घ)	**सिँचाइ आयोजना मर्मत सम्भार तथा बिस्तार**		
२०	११.५.१५.१७५५ घोडाहा सिँचाइ बोरिङ्ग देवदह-९	८००	माग प्राप्त नभएको
	जम्मा	**२८५७०.**	

४.६. क्रमागत ठेक्का विवरण

कार्यालयबाट आ.व. २०८२/८३ मा ठेक्का आह्वान भएर कार्य सम्पन्न नभएको ठेक्काहरूको विवरण निम्न प्रकार रहेको छ ।

तालिका १२:क्रमागत ठेक्का/योजना विवरण (रकम रु हजारमा)

क्र. स.	योजनाको नाम	ठेक्का न.	सम्झौता रकम	खर्च रकम	सम्झौता अवधी	कैफियत
१	श्रीनगर DTW योजना रामग्राम-१४ नवलपरासी	GWRIDD/DTW/NCB/15/2082-83	३०५९		९/३०/०८३	बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएको बाट पहिलो चरणको डिप ट्यूववेल निर्माण मात्रको ठेक्का भएको
२	भुस्नापुर DTW योजना रामग्राम-१४ नवलपरासी	GWRIDD/DTW/NCB/16/2082-83	३०६३		९/३०/०८३	
3	घोडपाली DTW रामग्राम-३ नवलपरासी	GWRIDD/DTW/NCB/17/2082-83	२७९२		९/३०/०८३	
४	जोकवार ललितपुर DTW रामग्राम-९ नवलपरासी	GWRIDD/DTW/NCB/18/2082-83	३६००		९/३०/०८३	
५	रेक्सहवा DTW,रामग्राम-१४ नवलपरासी	GWRIDD/DTW/NCB/19/2082-83	२७८६		९/३०/०८३	
६	शुक्रौलि घिनाह (उत्तरटोला) DTW रामग्राम-१५ नवलपरासी	GWRIDD/DTW/NCB/25/2082-83	२३३३		१०/३०/०८३	
७	शुक्रौलि घिनाह DTW रामग्राम-१५ नवलपरासी	GWRIDD/DTW/NCB/26/2082-83	२३३३		१०/३०/०८३	
८	घिनाह DTW रामग्राम-१५	GWRIDD/DTW/NCB/27/2082-83	२३३३		१०/३०/०८३	
९	जयगणेश DTW रामग्राम-१७ नवलपरासी	GWRIDD/DTW/NCB/28/2082-83	२३३३		१०/३०/०८३	
१०	लंकहवा DTW रामग्राम-१० नवलपरासी	GWRIDD/DTW/NCB/29/2082-83	२४०३		१०/३०/०८३	
११	कर्वलाटोल DTW योजना सैनामैना-४, रुपन्देही	GWRIDD/DTW/NCB/30/2082-83	१८८३		१०/३०/०८३	
१२	माडीथटिया DTW बगनासकाली-२, पाल्पा	GWRIDD/DS/SQ/13/2082-83	१७५२	६२६	६/३०/०८३	पम्प्घर/ विद्युत-म्याद थपिएको
१३	रुपौलिया DTW योजना, सुस्ता-१, नवलपरासी	GWRIDD/PH/NCB/06/2082-083	१५७९	९५८	६/३०/०८३	पम्पघर-म्याद थपिएको
		जम्मा	३२२४१	१५८४		

भाग-चार

४. कार्यालयको उपलब्धी

४.७. वार्षिक परिमाणात्मक उपलब्धी (आ.ब.२०८२/०८३)

तालिका १३: कार्यालयले आ.व. २०८२/८३ मा गरेको सूचकमा आधारित जिल्लागत प्रगति

क्र.स.	जिल्ला	योजना संख्या	कार्यान्वयन योजना संख्या	सूचक अनुसारको प्रगति										सिँचित क्षेत्र (हे)	
				DTW	PDSTW	STW	PH	पम्प	ट्रान्स.	विद्युत (मि)	विद्युतपोल	uPVC (मि)	आउटलेट	नयाँ	सुदृढिकरण
१	नवलपरासी	४५	३८	१	८	७२	५	१२	३	७५३	२२	१९४५३	१८१	६३३	१४२
२	रुपन्देही	४३	३३	१	२२	१७	२	७	३	३२५	१२	४७२५	४०	१८९	
३	पाल्पा	८	८	२	४		२	२		४५०	१२			१०	
४	गुल्मी	४	१		१									२.५	
	जम्मा	**१००**	**८०**	**४**	**३५**	**८९**	**९**	**२१**	**६**	**१५२८**	**४६**	**२४१७८**	**२२१**	**८३४**	**१४२**

४.८. हाल सम्मको उपलब्धि (आ.ब.२०८२/०८३ सम्म)

यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र मध्ये नवलपरासी (ब.सु.प.) जिल्लामा ४३२००।०० हे, रुपन्देही जिल्लामा ६२०५९ हे., गरी जम्मा १०५२५९ हे जमिनमा भूमिगत जलस्रोत बाट सिँचाइ गर्न सकिने सम्भावना रहेकोमा हालसम्म (आ.ब.२०८२/०८३ सम्म) विभिन्न योजनाबाट नवलपरासी जिल्लामा ९२७६।०० हेक्टरर रुपन्देही जिल्लामा १६७४३।०० हेक्टरगरी जम्मा २६०१९।०० हे जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराइएको छ ।

तालिका १४: हालसम्मको जिल्लागत सिँचित क्षेत्र विस्तार

सि.नं.	जिल्ला	खेति योग्य जग्गाको क्षेत्रफल (हे)	सिँचाइ सम्भाव्य क्षेत्रफल (हे)	भूमिगत सिचाई प्रणालीबाट सिंचित क्षेत्रफल (हे)			
				आ.व. २०८१/८२ सम्मको	आ.व. २०८२/८३ को थप	हाल सम्मको जम्मा	प्रतिशत
१	रुपन्देही	८९६३०	८९१९७	१६५५३.५	१८९	१६७४३	
२	नवलपरासी (ब.सु.प.)	४१३७३	४०८२८	८६४३.	६३३	९२७६	
३	पाल्पा	६६३१२	८६८८	२६४५.५	४	२६५०	
४	गुल्मी	४६२५२	१७१००	११६.५	२.५	११८	
जम्मा		२४३५६७	१५५८१३	२७९५९	८२९	२८७८७	

४.९. विगतमा सम्पन्न भएका योजनाहरू

स्थापना काल देखि हाल सम्म यस कार्यालयबाट तपसिल बमोजिमका धेरै आयोजनाहरु योजनाहरू सञ्चालन भएका थिए ।

तालिका १५: विगत वर्षमा सम्पन्न आयोजना विवरण

क्र.सं	योजनाको नाम	योजना अवधि	लगानीको श्रोत	मुख्य कार्यहरु	हालको अवस्था	कैफियत
१	GWIP	२०३१-२०७४	USAID, IDA,GON	अन्वेषण ट्यूववेल निर्माण गरी भूमिगत जलको अध्ययन	सम्पन्न	
२	ILC	२०४५-२०५१	बिश्व बैंक	२८ वटा DTW र २५ वटा STW निर्माण भएको	सम्पन्न	
३	NISP	२०५७-२०६२	बिश्व बैंक	४१ वटा DTW र ४ वटा STW निर्माण घएको	सम्पन्न	
४	APP	२०५४-२०७४	नेपाल सरकार	२९ वटा DTW र ७८२९ वटा STW निर्माण घएको	सम्पन्न	
५	ICWMP	२०६१-२०७४	नेपाल सरकार	पानी व्यास्थापन सम्बन्धी कार्य	सम्पन्न	
६	IWRMP	२०६४-२०७४	बिश्व बैंक	१५ वटा DTW र १५० वटा STW निर्माण भएको	सम्पन्न	
७	STISP	२०७२-२०७५	नेपाल सरकार	DTW सिँचाइ प्रणालीहरु निर्माण भएको	सम्पन्न	

GWIP-Ground Water Investigation Project, ILC-Irrigation Line of Credit, NISP-Nepal Irrigation Sector Project, APP-Agriculture Prospective Plan, ICWMP- Interegated Crop Water Management Project, IWRMP-Irrigation and Water Resources Management Project, STISP- Special Terai Irrigation Special Project

तालिका १६:एकीकृत जलस्रोत व्यवस्थापन आयोजन (IWRMP) बाट सम्पन्न भएका योजनाहरू

क.स.	उप-आयोजना	विवरण	कैफियत
१	पर्रोहा-सेमलार DTW ISP, रुपन्देही	१० वटा DTW, ४०० हे. CA	सम्पन्न
२	सुनुवल-स्वाठी DTW ISP, नवलपरासी	६ वटा DTW, २४० हे. सिंचित क्षेत्र	सम्पन्न
३	सूर्यपुरा STW ISP रुपन्देही	६७ STW को विद्युतीकरण, २०० हे. CA	सम्पन्न
४	पेटवनिया DTW ISP, नवलपरासी	४ वटा DTW, १६० हे. सिंचित क्षेत्र	सम्पन्न

भाग-पाँच

५. बेरुजु तथा समस्याहरु

४.१०. बेरुजू सम्बन्धी विवरण

यस कार्यालयको आ.व. २०८१/८२ सम्मको बेरुजू निम्न प्रकार रहेको छ ।

तालिका १७: कार्यालयको हाल सम्मको बेरुजू विवरण

प्रदेश सरकार स्थापना पूर्व (आ.ब.२०७४/७५ सम्म)					
क्र.सं.	बेरुजू किसिम	जम्मा बेरुजू रकम	फछर्यौट रकम	फछर्यौट %	कैफियत
१	असुल उपर गर्नु पर्ने	०			
२	नियमित गर्नु पर्ने	१२७७२५८६	१२७७२५८६	१००%	
३	पेश्की	०			
	कूल जम्मा	१२७७२५८६	१२७७२५८६	१००%	
प्रदेश सरकार स्थापना पश्चात् (आ.ब.२०७५/७६-२०८१/८२ सम्मको)					
१	असुल उपर गर्नु पर्ने	१०५७९८०.	६०९४३१	५८%	
२	नियमित गर्नु पर्ने	६४३१७३३.	११९२५२७	१९%	
३	पेश्की	१८७४१९९	१८७४१९९	१००%	
	कूल जम्मा	९३६३९१२.	३६७६१५७	३९%	

४.११. समस्याहरू

कार्य सम्पादनको सिलसिलामा देखिएका प्रमुख समस्या तथा समाधानका उपायहरू निम्नानुसार रहेका छन्।

तालिका १८: समस्या र समाधानका उपायहरु

क्र.सं.	समस्या	समाधानका उपाय
१	स्वीकृत दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति र प्राविधिक जनशक्तिहरूलाई उपयुक्त तालिम	कार्यालयमा कामको चाप अत्याधिक भएकोले स्वीकृत दरबन्दी अनुसार पदपूर्ति गर्नुपर्ने र भएका प्राविधिक जनशक्तिहरूलाई तालिमको (GIS, AutoCAD, Data Interpretation जस्ता) व्यवस्था हुनु पर्ने । हालको ह.स.चा. दरबन्दी १ मात्र भएकोले ह.स.चा. दरबन्दी अनिवार्य रुपमा २ हुनु पर्ने ।
२	कृषक तालिम	ट्यूवेल सञ्चालन गर्न आवश्यक प्राविधिक ज्ञान, चेतना तथा कृषि उपजको उत्पादन सम्बन्धी कृषकलाई कृषि सम्बन्धी तालिम/अबलोकन भ्रमणको व्यवस्था हुनु पर्ने ।
३	योजना माग अत्याधिक भएकोले र माग सम्बोधन गर्न नसकिएको	ट्यूवेलहरु (डिप तथा स्यालो) को माग अत्याधिक भएकोले माग सम्बोधन गर्न आवश्यक बजेटको प्रबन्ध हुनुपर्ने र योजनाहरू cluster को रुपमा कार्यान्वयन हुनुपर्ने ।

क्र.सं.	समस्या	समाधानका उपाय
४	नया योजना समावेस गर्दा कार्यालय संग समन्वय हुने नगरेको र कार्यालयमा माग निवेदन दर्ता भएका योजना समावेस हुने नगरेको	योजना समावेश गर्दा कार्यालयसँग समन्वय हुनुपर्ने वा कार्यालयमा माग भएका, धरौटी रकम राखेका योजनाहरूले प्राथमिकता पाउनु पर्ने ।
५	क्रमागत योजना सम्पन्न गर्न बजेट अभाव हुने गरेको	ट्यूववेल निर्माण सफल भए पछि बाँकी कामको एक मात्र ठेक्का गर्ने प्रावधान हुनु पर्ने जसको लागि बहुवर्षीय श्रोत स्वीकृत हुनु पर्ने ।
६	पुराना ट्युबवेल प्रणालीको मर्मत सम्भार गर्न प्रयाप्त बजेट बिनियोजन हुने नगरेको	पुराना ट्यूववेलहरुमा निर्माण गरीएको Open Canel र पम्पघर धेरै पुरानो तथा जीर्ण भएकोले नयाँ uPvC पाइप लाइन निर्माण गर्नुपर्ने लगायत आवश्यक स्थानमा र पम्प घर समेत नया निर्माण गर्नुपर्ने र पुराना जीर्ण संरचनाको योजनागत रूपमा पुनःनिर्माणको कार्य गर्नुपर्ने।
७	थप पाइप लाइन निर्माणको दवाब र माग आउने गरेको	डिप ट्यूववेल योजना सम्पन्न भएतापनि कृषकहरू बाट थप कार्य (पाइप लाइन) को माग, दबाब धेरै आउने हुँदा संरचना निर्माण सम्बन्धी प्राविधिक मापदण्ड तयार गरी कार्यान्वयनको व्यवस्था हुनुपर्ने ।
८	अध्ययन अनुसान्धानले प्राथमिकता नपाएको	दीर्घकालीन रूपमा रुपन्देही र नवलपरासी जिल्लामा सिँचित क्षेत्र संरक्षण गर्न नीति गत व्यवस्था हुनुपर्ने र वार्षिक भूमिगत जल भण्डारको संरक्षण, प्रयोग तथा जल गुणमा आवश्यक सन्तुलन (Water Balance) गर्न वृहत अध्ययन अनुसन्धान गरी नीति गत व्यवस्था गर्नुपर्ने । भूमिगत जल सम्बन्धी पहिचान हुन नसकेका क्षेत्रहरूमा भु- भौतिकी (Geo-Physical) अध्ययन सम्बन्धी आवश्यक बजेट व्यवस्था हुनुपर्ने ।
	बिद्युत मिटर जडानमा समस्या हुने गरेको	निर्माण सम्पन्न भएका योजनामा विद्युत् जडान गर्न धेरै समस्या हुने गरेकोले समयमा विद्युत् जडान नहुने हुँदा माथिल्लो निकायबाटै नीतिगत व्यवस्था गरी र सम्बन्धित पक्षको तल्लो निकायमा आवश्यक समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने ।

क्र.सं.	समस्या	समाधानका उपाय
	भवन अभाव भएको	यस कार्यालयले साबिकमा प्रयोग गरेको र हाल प्रदेश कृषि मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार विकास कार्यालय तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगले प्रयोग गरी रहेका केही भवनहरू यस कार्यालयलाई पुनः हस्तान्तरण गरिएमा स्टोर तथा कर्मचारीको आवास व्यवस्थापन सहज हुने हुँदा तालुक कार्यालयले सम्बन्धित पक्ष सँग समन्वय गरी दिनुपर्ने ।
	ट्रान्सफर्मर चोरीको समस्या बिराकाल रहेको	ट्रान्सफर्मर चोरीको कारण नयाँ ट्रान्सफर्मर राखि दिने माग आउने गरेकोले यसको सुरक्षा तथा चोरिएको स्थानमा नयाँ ट्रान्सफर्मरको लागि आवश्यक प्रबन्ध गर्नुपर्ने ।
	माग नभएका योजना कार्यान्वयन गर्न समस्या हुने गरेको	कतिपय आयोजनाहरूमा बजेट व्यवस्था भइ आउने तर उपभोक्ताहरूबाट माग आकृति सङ्कलन भइ नआउने हुँदा कार्यान्वयनमा समस्या आएको ।
	धेरै निकायले एकै किसिमको कार्य गर्दा दुबिधा देखिएको	सिंचाईको लागि ट्युवबेल निर्माण कार्य प्रदेश सरकारको कार्यक्षेत्र भएको र संघीय सरकार देखि स्थानीय सरकारका निकाय सबैले एकै किसिमको कार्य गरिरहेकोले कायान्वयन बिधि, प्रक्रिया, जनासभागितामा दुबिधा देखिएको र सिंचित क्षेत्र दोहोरिने, अनावस्यक योजना कार्यन्वयन हुने जस्ता समस्या देखिएकोले नीतिगत व्यवस्था बमोजिमको कार्यक्षेत्रमा मात्र कार्य हुनु पर्ने ।

अनुसूची-१: - कार्यालय प्रमुखहरूको विवरण

क) भूमिगत जलस्रोत तथा सिँचाइ विकास डिभिजन कार्यालय, रुपन्देही (स्था.२०७२)

कार्यालय प्रमुखहरुको विवरण

क्र.सं.	नाम, थर	पद	बहाल रहेको अबधि		कैफियत
			देखि	सम्म	
१	श्री नरेन्द्र खत्री	सि.डी.हा.जि.	२०७२/०४/०१	२०७२/०५/१५	
२	श्री सुरेन्द्र मान शाक्य	सि.डी.हा.जि.	२०७२/०५/२५	२०७४/०७/१०	
३	श्री इच्छा कुमार श्रेष्ठ	सि.डी.हा.जि.	२०७४/०७/१७	२०७६/०५/१४	
४	श्री महेश पोखेल	सि.डी.हा.जि.	२०७६/०५/२९	२०७९/६/३०	
५	श्री केशव राज रिजाल	सि.डी.हा.जि.	२०७९/०६/३१	२०८२/६/२१	
६	श्री महेश पोखेल	सि.डी.हा.जि.	२०८२/६/२१		हाल सम्म कार्यरत

ख) भूमिगत जलस्रोत विकास समिति, शाखा कार्यालय,बुटवल (स्था.२०३२)

कार्यालय प्रमुखहरूको विवरण

क्र.सं.	कार्यालय प्रमुखको नाम	कार्यरत अवधि	कैफियत
१.	श्री यादव लाल वैध	२०३२ - २०३४	सि.डि.हा.जी.
२.	श्री गिरिजा प्रसाद चतुर्वेदी	२०३४ - २०३६	सि.डि.हा.जी.
३.	श्री सूर्य नारायण ठाकुर	२०३६ - २०३९	ई. (का.मू)
४.	अरुण कुमार श्रीवास्तव	२०३९ - २०४२	सि.डि.ई.
५.	श्री स्वंभुविर कंसाकार	२०४२ - २०४५	हा.जी. (का.मू)
६.	श्री श्याम कृष्ण श्रेष्ठ	२०४५ - २०४९	सि.डि.ई.
७.	श्री शितल बाबु रेग्मी	२०४९ - २०५२	सि.डि.ई.
८.	श्री वसन्त रायमाझी	२०५२ - २०५४	सि.डि.ई.
९.	श्री मोति बहादुर कुंवर	२०५४ - २०५९	सि.डि.हा.जी.
१०.	श्री प्रेम बहादुर कार्की	२०५९ - २०६२	सि.डि.हा.जी.
११.	श्री सागर कुमार राई	२०६२/८/८ - २०६६/५/१८	सि.डि.हा.जी.
१२.	श्री ईन्द्र देव भट्ट	२०६६/५/१३ - २०६८/२/४	सि.डि.ई.
१३.	श्री टेक बहादुर कार्की	२०६८/२/५ - २०६८/५/१८	सि.डि.ई.
१४.	श्री चेत बहादुर गुरुङ्ग	२०६८/५/१९ - २०६८/८/६	सि.डि.हा.जी.
१५.	श्री दिपक घिमिरे	२०६८/८/१५ - २०६८/१२/१५	सि.डि.हा.जी.
१६.	श्री एण्डी प्रकाश भट्ट	२०६८/१२/१६ - २०६९/१२/२५	सि.डि.हा.जी.
१७.	श्री नरेन्द्र खत्री	२०६९/१२/२५ - २०७२/५/१५	सि.डि.हा.जी.
१८.	श्री सुरेन्द्र मान शाक्य	२०७२/५/२५ - २०७४/७/१२	सि.डि.हा.जी.

१९.	श्री इच्छा कुमार श्रेष्ठ	२०७४/७/१६ - २०७५/५/२०	सि.डि.हा.जी.
२०.	श्री रमेश पौडेल	२०७५/६/१९ - २०७६/३/२९	सि.डि.ई.
२१.	श्री महेश पोखरेल	२०७६/४/१ - २०७७/७/३०	सि.डि.हा.जी.
२२.	श्री यज्ञ प्रसाद ज्ञवाली	२०७७/८/११ - २०७९/३/३०	ना.सु (कामकाज)

नोटः

- २०३२ देखि २०४४ सम्म कपिल्वस्तु नलकुप आयोजनाको रुपमा कार्यालय स्थापना भएको
- २०४४ देखि २०६७ सम्म भूमिगत जलश्रोत विकास परियोजना, फिल्ड कार्यालयको रुपमा कपिलबस्तु देखि नवलपरासी सम्म कार्यक्षेत्र रहेको
- २०६७ देखि २०७९ सम्म भूमिगत जलश्रोत विकास समिति, शाखा कार्यालयको रुपमा नवलपरासी र रुपन्देही का साथै पाल्पा गुल्मी स्यांन्जा समेत कार्यक्षेत्र रहेको
- आ.व. ०७९/८० देखि यस कार्यालय खारेजी भई उक्त निकाय को कार्य अन्य निकायमा समायोजन गरी हाल अस्तित्वमा नरहेको

अनुसूची-२: नागरिक बडापत्र

सि नं	विवरण	विवरण	कैफियत
१	कार्यक्षेत्र	रुपन्देही, नवलपरासी (ब.सु.प.), पाल्पा र गुल्मी	
२	सेवाको उदेश्य	भूमिगत जलस्रोतको अध्ययन, अनुसन्धान तथा अन्वेषण गरी संभाव्यता पहिचान गर्ने । भूमिगत जलस्रोतको उपयोग गरी कृषि योग्य जमिनमा सिँचाइ सुविधा उपलब्ध गराउने ।	
३	सेवाको प्रकार	भूमिगत जलको अध्ययन तथा अनुसन्धान कार्य गर्ने । डिप ट्युववेल सिँचाइ प्रणाली निर्माण गर्ने । स्यालो ट्युववेल सिंचाइ प्रणाली निर्माण गर्ने । पुरानो प्रणालीको मर्मत, संभार तथा व्यवस्थापन गर्ने । कृषकहरूलाई सिँचाइ प्रणाली व्यवस्थापनमा आवश्यक प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने ।	
४	सेवा प्राप्त गर्ने प्रकृया	नयाँ योजनाको लागि ज.उ.स.गठन गरी ज.उ.स.को निर्णय, स्थानीय तहको सिफारिस, नापी नक्सा, पदाधिकारीहरूको नागरीकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि, जग्गाको क्षेत्रफल र जग्गाधनीको नाम खुल्ने कागजात तथा तोकिएको अन्य कागजात सहित कार्यालयमा निवेदन दिनु पर्नेछ । डिप ट्युववेल योजनाको लागि प्रति हेक्टर रु.५००/- का दरले धरौटी रकम जम्मा गरेको हुनुपर्ने । अन्य सेवाका लागि विषय खुलाई कार्यालयमा निवेदन दिनुपर्ने ।	
५	सेवाको गुणस्तर	स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम, विभागीय नम्स तथा स्पेशिफिकेशनमा तोकिए अनुसार ।	
६	प्रचार प्रसार तथा सूचना सम्मको पहुंच	स्थानीय स्तरमा गरीने गोष्ठी, कार्यालयको सूचना पाटी, प्रसार, पत्रपत्रिका प्रकाशनहरू, कार्यालयको वेबसाइट **gwriddbtwl.lumbini.gov.np**	
७	सेवा वापत लाग्ने शुल्क	डिप ट्युववेल सिँचाइ, वितरण प्रणाली, पम्प घर निर्माण र एम.एस.फिटिङका लागि कुल लागतको ५ प्रतिशत बराबरको नगद वा श्रम सहभागिता लाग्ने । संस्था दर्ता तथा नवीकरण गर्न नियमानुसार शुल्क लाग्ने ।	
८	सम्बन्धीत ऐन नियमहरू	सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ सिँचाइ नियमावली, २०५६, भूमिगत सिँचाइ योजना कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७७ (संशोधन समेत) तथा प्रचलित अन्य ऐन कानुनहरू ।	
९	तालुक कार्यालय	ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, लुम्बिनी प्रदेश, राप्ती उपत्यका (देउखुरी), नेपाल	
१०	सेवा प्रवाहको प्राथमिकता	कार्यालयमा प्राप्त मागका आधारमा आवश्यकता र संभाव्यता रहेको स्थानमा स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम र विनियोजित बजेटको परिधिभित्र रही कार्ययोजना बमोजिम लक्षित उद्देश्य अनुसार गुणस्तरीय सेवा प्रवाह गरीने ।	
११	क्षतिपूर्ति	क्षतिपूर्ति हुने सेवाहरु नभएको ।	
१२	सेवाग्राही समूह	यस कार्यालयको कार्यक्षेत्र अन्तर्गतका सम्बन्धीत जल उपभोक्ता समितिहरू ।	
१३	सम्पर्क	कार्यालयको फोन नं ७१-५३०७१२ इमेलः **gwrdb.butwal@gmail.com**	

अनुसूची-३: प्रदेश सरकारबाट निर्माण भएका डिप ट्युबवेल योजनाहरूको प्राविधिक विवरण

सिनं	योजनाको नाम	GPS	जउसको नाम	अध्यक्ष को नाम	प्राबिधिक विवरण				हालसम्म को खर्च	कैफियत
					DTW निर्माण	पम्प घर	पम्प तथा बिद्युत	पाइप लाइन/भल्भ		
१	डिप बोरिङ्ग सिंचाइ योजना, रमुवापूर रुपन्देही	२७.६२२४५२, ८३.४१३९८	रमुवापुर डिप ट्यूववेल ज.उ.स. शुद्धोधन ३ रुपन्देही	ओमप्रकाश ठाकुर ९८५७०८३४५६	DD-126, LD-110, H-42, S-24 m (44-50, 56-59, 73-79, 87-90,98-104 lcg), Q-29 lps, dd-15.53, (खर्च-१८१९२२० आ.ब. ७५/७६)	१७५२ ६९० आ.ब. ७६/७७	20 HP, 5" CP-42m 50 KVA आ.ब.७६/७७, खर्च-१७९२१७७	१३४८ /८/ २ सर्ज खर्च-१०१४४२४ (७७/७८)	३३७८५११	योजना सम्पन्न
२	गैडहवा डिप ट्यूववेल योजना., गैडहवा-९, रुपन्देही	२७.६२२१५७, ८३.४२८८०२	सुखौली ज.उ.स., गैडहवा-९, रुपन्देही	टिका देवी पुन ९८०७४१०	DD-120, LD-119, H-42,S-18 (61-70,84-87,109-115, lcg) ,Q-40 lps, dd-7.06, (०७५/०७६, १८९३५७५)	८६३५ ८३ (०७६/७७)	pump-25hp, 5" col, 42m low, 50 KVA Trans, ठे.नं. ३४/७६/७७, २२०२१७८	११२६ मि./१८ Valve, १८८८६०५	३८४७९४१	योजना सम्पन्न
३	गजेडी, रुद्रपुर, कन्चन गा.पा. - २ थान	२७.६२८८११, ८३.२३८७५१	क) हरियाली ज.उ.स. कन्चन ५	दिनानाथ आचार्य ९८५७०१०१४	DD-120, LD-117, H-42, S-15(61-70,94-97,108-111 lcg) Q-40 lps, dd-10.73, (०७५/०७६, १८६९९१३)	PH and Pipe (७६/७७, १७०६३ ६५)	25hp, 4" col, 36m low, 7 Pole, 50 KVA Trans, (2076/77, 1624487.34)	6" Upvc Pipe 1768295.3	३९३९०३१	योजना सम्पन्न
४	गजेडी, रुद्रपुर, कन्चन गा.पा. - 2 थान	२७.६०१९१४, ८३.२५७६२२	ख) लखनचोक ज.उ.स. कन्चन ५	भैरव थापा ९८४७२७९३५	DD-135,LD-134, H-42,S-15(62-65,71-74,110-113,124-130 lcg) Q-40 lps, dd-12.58, आ.ब.७५/७६ 1906336	आ.ब.७७/७८, 863583	25HP, 5" Col, 36m Low, 50 KVA Trans, आ.ब.७६/७७ 1602465	१४८०/ १५/२ सर्ज ०७८/७९ १८५८९३१	३२३१३५	योजना सम्पन्न

सिनं	योजनाको नाम	GPS	जउसको नाम	अध्यक्ष को नाम	प्राबिधिक विवरण				हालसम्म को खर्च	कैफियत
					DTW निर्माण	पम्प घर	पम्प तथा बिद्युत	पाइप लाइन/भल्भ		
५	डिप ट्यूववेल सिंचाइ, रोहिणी गा.पा.-३ वटा योजना	२७.४७९१८, ८३.५१९८८७	टिकर ज.उ.स, रोहिणी ५	दिनेश कु.(गणेश) यादव ९८५७०१७२८०	DD-130,LD-124, H-42, S-18 m, (57-60,71-74,85-88,106-112,115-118 lcg) Q-22 lps, dd-19.63, आ.ब.७५/७६ 1951286	आ.ब.७६/७७ 1007841	20HP, 5" col, 36m low, 50 KVA Trans, (ठेः १६/७६/७७) 1566628	१४८०/१५ V/२ सर्ज 2328833	८८५४५३	सम्पन्न (हाल ट्रान्सफर्मर चोरी)
६	डिप ट्यूववेल सिंचाइ, रोहिणी गा.पा.-३ वटा योजना	२७.४८५५२५, ८३.५०६३७२	बैरीहवा ज.उ.स. रोहिणी २	कान्छा कोहार ९८०६९४२६२२	DD-130,LD-112, H-42,S-15(63-69,74-80,103-106 lcg 1mm) Q-30 lps, dd-13.36, ७५/७६) खर्च 1974720	(७६/७७) 1007841	20 HP, 5" col, 50 KVA Trans (ठेक्का: १६/७६/७७, 1678271)	ठेक्का न ९/०७८/७९ 1887139	३५४७१७	सम्पन्न (हाल ट्रान्सफर्मर चोरी)
७	डिप ट्यूववेल सिंचाइ, रोहिणी गा.पा.-३ वटा योजना	२७.४८७८३, ८३.५००५७	शिद्धार्थ ज.उ.स. रोहिणी ५	महेन्द्र यादव ९८५७०२४९८६	DD-130, LD-125, H-42, S-18(48-51,58-67,113-119 lcg 1mm) Q-20 lps, dd-18.48 Exp-2003779 (75/76) ट्युववेल नयाँ : DD 175 मि., LD १७४ मि. H-५४ मि., जाली १२ खर्चः१७३६५२४ कुल २ गोटाको ३७४०३०३	(77/78) ९९२१२१	15HP, 5" Col., 39m Low., 25KVA Trans., (34-76/77) १२.५ hp पम्प ३९ मि. ४" कोलम पाईप Replace 1439991	१४९५ upvc pipe ठे.९/०७८/७९ 1887140	८०५९५५७	सम्पन्न
८	देवदह डिप ट्यूववेल सिचाइ, देवदह न.पा.	२७.६३७३२, ८३.५५५७८५	विशालनगर ज.उ.स, देवदह-८,	अमर थापा ९८४७०५२८८४	DD-120,LD-93, H-48,S-15(52-61,77-83 lcg 1mm) Q-32 lps, dd-11.98 Exp- (75/76) 2075/11/26 १७१६०५९	(76/77) १००७८४२	25HP, 5" Col., 36m Low, 50KVA Trans., Exp- (34-76/77) 1465147.53	१४९०/१५/३ १/७९/८०1999569	५१३८१३	सम्पन्न

सिनं	योजनाको नाम	GPS	जउसको नाम	अध्यक्ष को नाम	प्राबिधिक विवरण				हालसम्म को खर्च	कैफियत
					DTW निर्माण	पम्प घर	पम्प तथा बिद्युत	पाइप लाइन/भल्भ		
९	मोतिपुर डिपटयूववेल सिंचाइ, बुटवल उ.प.न.पा.	२७.६२२५३७, ८३.४२८८०२	गह्रौकालिका ज.उ.स., बुटवल १८ मोतिपुर	रामकृष्ण खनाल ९८५७०२४२४	DD-111,LD-105, H-42,S-21(55-58,64-70,75-81,89-92,96-99 lcg) Q-45 lps, dd-13.58 Exp-१९७०४७० (75/76)	८६३५ ८३	25 HP, 5" Col., 36 Low., 50 KVA Trans, Exp-1832240.09 76/77)	outlet ३ surgriser १५३० upvc pipe 3005327.1	७६७१६२१	सम्पन्न
१०	रामग्राम डिप टयूववेल सिंचाइ,रामग्राम न.पा.- नवलपरासी	२७.५०६१, ८३.६२	हरियाली ज.उ.स., रामग्राम ६ हकुई	ध्रुवनाथ पाण्डे ९८५७०१६४३	DD-205,LD-173, H-48, S-15(97-100,108-114,152-161, lcg) Q 15lps, dd-35, (75/76)2076/1/11 २२७८४८५	(76/77+77/78) ९०६८ ५४	15HP, 4" Col, 42m Low, 25 kva trans, (76/77) 1442169.34	१४८०/१३ ७८/७९ 2475423 wua	७१०२९३२	योजना सम्पन्न
११	ब.न.पा.१-१६, सरावल ४-७	२७.४८७४५ ८३.८०७१९	(क) हरियाली ज.उ.स. बर्दघाट १५ पृथिवीबस्ति	थर्क व सारु	DD-160,LD-84, H-41, S-12(42-54,69-72 lcg) Q-32lps, dd-20.69,exp-(75/76) 1874621.1	(77/78): 1120914.42	25HP, 5" Col., 39m Low., 50 KVA Trans, Exp- (35-76/77) 2373811.8	१५००/१५ ठे.१३/७८/७९: २३१८२९१	7687638	योजना सम्पन
१२		२७.४८७४५२ ८३.७७९०१२	(ख) कोटाईमाई ज.उ.स, बर्दघाट १३ पनही	लक्ष्मण चौधरी ९८४७५५९९१४	DD-150,LD-75, H-39, S-15(40-52,62-65 lcg) Q-25lps, dd-16.82,exp- (75/76) : 1776694.6	990707.72	20 HP, 5" Col., 39m Low., 25 KVA Trans, Exp- (35-76/77): 1588947.7	१०६०+८२ ८/ १०+७ 2242340.02	7687638	योजना सम्पन

सिनं	योजनाको नाम	GPS	जउसको नाम	अध्यक्ष को नाम	प्राबिधिक विवरण				हालसम्म को खर्च	कैफियत
					DTW निर्माण	पम्प घर	पम्प तथा बिद्युत	पाइप लाइन/भल्भ		
१३		२७.३०८५० ८३.४६३२५	(ग) बुद्धमंगल ज.उ.स., बर्दघाट १२ लेवडा	धनब सिंजाली मगर ९८६७७८११४४	DD-160,LD-159, H-48, S-18(128-131,138-153 lcg) Q-30lps, dd-17.49,exp- (75/76) 2304494.1	(77/78) 1024559.41	25HP, 5" Col., 39m Low., 50 KVA Trans, Exp- (35-76/77) 2219708.05	१९०८/१७ भल्ब 3359719	8908481	योजना सम्पन्न
१४	नयाँ मेशिन ड्रिल ट्यूववेल बोरिङ्ग, २ वटा सुनवल-७ तगौंली		क) गौरीशंकर ज.उ.स., सुनुवल ७	टेकब काकी ९८४१५५९३८५	DD-136,LD-134, H-42, S-15(65-71,87-83,124-130 lcg) Q-36lps, dd-17.3 (75/76) 2070514.4 (२०८२/८३ मा वेल सफाइ कार्य गरेको । ट्यूववेल केही भासिएको ।	Total EXP (77/78) 1002053.46	20 HP,5" Col., 36m Low., 25 KVA Trans, 1485414	(१५+६ valve, १५३६+५२ ३ मि, ३ surge) 2078/79 3499374	8057356	योजना सम्पन्न, (समस्याग्रस्त)
१५		२७.६१३९९५, ८३.५७८२५२	ख) समयमाई ज.उ.स, सुनुवल ७	राम सिंह पासी ९८६७०१२९३६	DD-132,LD-128, H-42, S-15(63-66,87-93,100-103,121-124 lcg) Q-37lps, dd-15.30, खर्च 1913280 (०८२/८३ मा सफा गरेको, ट्यूववेल केहि भासिएको)	(77/78) 999873.27	20hp, 5" Col., 36m Low., 25 KVA Trans, (25-76/77) 999873.27 (०८२/८३ नया ट्रान्सफर्मर जडान गरेको)	१५३६/१५/३ सर्ज ज.उ.स. २६०३२२२ ०७८/७९	7107276	सम्पन्न (केहि समस्या देखिएको)
१६	पोखरपाली रामग्राम ६	२७.५३४५९, ८३.६५५६०	पोखरपाली ज.उ.स	लक्ष्मीनारायण चौधरी	DD-236,LD-220, H-48, S-18(154-160,175-181,206-214lcg .75mm) Q-18 lps, dd-39, २५४१५११	९०६८५४	20HP, 4" Col, 39m Low, 25 KVA Trans, (17-76/77) 1052216.9	१५९६+५२ ३.६/१५+५ 3256451	७७५७०३	सम्पन्न
१७	स्वर्गद्वारी डि.ट्यू.सि. यो. गैडहवा-८	27.635952, 83.30539	स्वर्गद्वारी जउस	दानब घर्ति ९८४६९१४	DD-145,LD-142,H-48,SL-15 (60-66,112-118,133-136) 76/77 १४०३७९१	८२९४१४	ठेक्का 10/७७-७८, 20 HP, 5" 13 nos. Column pipe, 25 KVA Transformer Each 2580123.03	१४८५+४९४/१५+५/३ 2876597	७६८९९२५	योजना सम्पन्न

सिनं	योजनाको नाम	GPS	जउसको नाम	अध्यक्ष को नाम	प्राबिधिक विवरण				हालसम्म को खर्च	कैफियत
					DTW निर्माण	पम्प घर	पम्प तथा बिद्युत	पाइप लाइन/भल्भ		
१८	प्रगतिशील डि.ट्यू.सि. यो. कन्चन ३	२७.५८६७, ८३.२५०८३०	प्रगतिसिल ज.उ.स., कन्चन ३ प्रतापपुर	मोती थापा ९८५७०५६४६१	DD-170m, LD-170m, S (163-166), (157-160), 145-148), (119-125)m, Q-7.5 lps १५७८७६०	७९९३ १४	(7.5 hp, 3" 14 nos. column pipe) replace 1413564	१४४३.१ मि. UPVC, १५ भल्ब 1318934	५११०५७२	योजना सम्पन्न
१९	देविस्थान देवदह-२	२७.६०४, ८३.५७०		यम ब आले ९८४७५९२००३	न.पा. द्वारा निर्मित ट्यूववेल निर्माण गरी सञ्चालन भएको ट्यूववेलमा पम्प घर र पाइपलाइनको मात्र कार्य गरेको			१२००/ 12 v ०७७/७८ 2247946	२२४७९४ ७	सम्पन्न भएको
२०	कोटाइमाइ डिप ट्यूववेल सिंचाइ, उप-आयोजना रामग्राम-12 कसिया	२७.५३३४७३, ८३.६७९४५	कोटाइमाई डिप ट्यूववेल ज.उ.स.	कृपलाल यादव ९८४७३२६	DD-235,LD-228, H-48, S-18(153-159, 172-178, 216-222), १४ लि/से २०६८०३५	९३६८ ०९	20 HP, 5" Col., 39m Low., 25 KVA Trans., Exp-1369279.74 (77/78) +37742 (78/79) 1407021	१४८०/१५ /३ (०७८/७९) 1809566	६२२१४३१	योजना सम्पन्न
२१	मन्झरिया डिप ट्यूववेल सिंचाइ उप-आयोजना रामग्राम-10	२७.५१८७३९, ८३.६४७४४	मन्झारिया डिप ट्यूववेल ज.उ.स.	झपेन्द्र चौधरी ९८६७५१५५१	DD-235, LD-225, H-48, S-18(98-101, 152-161, 178-181, 112-115) १५ लि/से २०६७३६८	९६८८० ९	20 HP, 4" Col. 39m Low., 25 KVA Trans., Exp-(77/78) 1209391.81	१५००/१५ /२ 2291443.8	६५३७०१२	योजना सम्पन्न
२२	चन्द्रज्योती डिप ट्यूववेल सिंचाइ उप-आयोजना बर्दघाट-१५	२७.४८, ८३.४८४३७	चन्द्रज्योति डिप ट्यूववेल ज.उ.स.	सुकु बहादुर तामाङ ९८५७०४५३५०	DD-100, LD-81, H-42, S-15(44-53, 67-73), २६ लि/से १२३४८५३	839264.9	20 HP, ५" Col. ३३m Low., 25 KVA Trans. Exp- ठेक्का 08/७७-७८) 1196444	१०१४-७७/७८+४ ३०/४ (82/83) 1740879+400000	५४११४४१	सम्पन्न भएको

सिनं	योजनाको नाम	GPS	जउसको नाम	अध्यक्ष को नाम	प्राबिधिक विवरण				हालसम्म को खर्च	कैफियत
					DTW निर्माण	पम्प घर	पम्प तथा बिद्युत	पाइप लाइन/भल्भ		
२३	उत्सव डिप ट्यूववेल सिंचाइ उप-आयोजना बर्दघाट-१५	२७.४८६१६६, ८३.८१४५५१	उत्सब डिप ट्यूववेल ज.उ.स	डमर बहादुर बिक ९८१९४४२७५४	DD-100,LD-75, H-39, S-18(39-51, 61-67) २४ लि/से १२२८०७३	८३९२ ६५	20 HP, 4" Col. 36m Low., 25 KVA Trans.,11/2079/80) 1870126.73	१५२३ /१५ 2833699	6771163.54	सम्पन्न भएको
२४	शंकरपुर डिप ट्यूववेल सिंचाइ उप-आयोजना सैनामैना-९	२७.७०९४८, ८३.२३६५७	शंकरपुर ज.उ.स., सैनामैना ९ रुपन्देही	तारापती भण्डारी ९८०६९१५५३०	DD-140, LD-123, H-४८, S-18 (50-56,74-77,93-99,110-113), १८ लि/से From WUA 2077-5-15 १९९८२२३	८१५२ १३	20 HP, 5" Col., 39m Low., 25 KVA (77/78) १५ hp पम्प replace 2048821.29	१५००/१५ /३ (०७८/७९) 1864538	6726795.97	सम्पन्न भएको
२५	पवित्र बस्ति र धर्म बस्ति डिप ट्युवबेल सिंयो, बर्दघाट १४ (२ गोटा)	२७.४८४१६६, ८३.७९८६११	क) पवित्रबस्ति ज.उ.स बर्दघाट १४	रोमन सिंह जर्घा मगर ९८०४७६८०८८	DD-170, LD-168, H-42, S-12m(44-53, 148-151)m, 1mm SS, SWL-13.50m, Q-१५ lps, ddr.-26.50 m, (०७८/७९) १३२५३६१		(५०१९१४०.३४+६६५२ ३१) (पवित्रबस्ति र धर्मबस्ती मा एउटा package मा 20 HP, 4" Col., 39m 25 KVA Trans १० hp पम्प replace गरेको आधा खर्च २८४२१८६ (०७९/८०)	११०४/११ (८१/८२) +२०१/२ (2082/83) 1408009+356140	5931695.88	सम्पन्न भएको
२६		२७.५१०५५५, ८३.८०७७७	धर्मबस्ती डिप ट्यूववेल ज.उ.स	अमित दुङ्गाना ९८६१९६८२५	DD-172, LD-139, H-48, S-15(54-66, 118-121, 124-127)m, 1mm SS, SWL-15m, Q-१६ lps, ddr.-27.15 m, (०७८/७९) १२५६००४		20 HP, 4" Col., 39m 25 KVA Trans १२.५ hp पम्प replace २८४२१८६	1386 m Upvc 4", 15 Ov (2081/82) 1037140	5135329.49	सम्पन्न भएको

सिनं	योजनाको नाम	GPS	जउसको नाम	अध्यक्ष को नाम	प्राबिधिक विवरण				हालसम्म को खर्च	कैफियत
					DTW निर्माण	पम्प घर	पम्प तथा बिद्युत	पाइप लाइन/भल्भ		
२७	सैनामैना डिप ट्यूववेल सिं योजना, सैनामैना ६	२७.७९६१११९ ८३.३०१३८८८	भरतपुर कुटी ज.उ.स. सैनामैना ६, रुपन्देही	शंकर प्रसाद ज्ञवाली ९८४७१६५२८८	DD-122, LD-122, H-48, S-12(82-91, 113-116, 1mm SS, 22 LPS /WUA, 2078/3/20 ३६३४७२१		सम्झौता: 1977564.09 भुक्तानी (1-78/79) 20hp Pump, 5" 13 nos. Column Pipe, 25 KVA Transformer १९५५११९	१४४५ मि./१५ भल्ब, 2728982	८३१८८२२	सम्पन्न
२८	चनमाइ डिप ट्यूववेल सिं यो, गैडहवा ५	२७.५७६६६६ ८३.२५७७७७	चन्चनमाइ ज.उ.स, गैडहवा ५ सिहवा	बृद्धनारायण तिवारी ९८१११५१६८४७	DD-150, LD-138, H-48, S-15(60-66, 118-121, 126-132, 1mm SS, SWL-2.20, Q-16.60m, ddr-2.55m १११३४०७	भुक्तानी २२४८ ८३९ (78/79) (PH+Ele)	20hp Pump, 4" 14 nos. Column Pipe, 25 KVA Transformer 675751	१५००+६० ९.८/१५+६ भल्ब 2927503	6965500	सम्पन्न
२९	जलेश्वर डिप ट्यूववेल सिं यो, कञ्चन १	२७.६५१६६६ ८३.२९	जलेश्वर ज.उ.स., कञ्चन १ वेल्वरिया	चुरामणी पौडेल ९८५१०८०५३६	DD-150, LD-133, H-48, S-15(56-62, 116-119, 124-127, 1mm SS, 22 LPS /WUA, 2077/78 १८३९६२१	(3-78/79) (पम्प घर तथा बिधुतिकरण) र (पम्प जडान), 20hp Pump, 4" 14 nos. Column Pipe, 25 KVA Transformer १४९८४५२+671705		१५००+७३ ७.७/ १५+७ भल्ब 3276552	७२८६ ३३०	सम्पन्न
३०	भेडीखोर डिप ट्यूववेल सिं यो, कन्चन १ रुपन्देही	27.67665, 83.27809	भेडीखोर ज.उ.स, कन्चन १ कुचुरा	रिम ब क्षेत्री ९८४८१३४५७३	DD-150, LD-142, H-48, S-12 (86-92,130-136,ss,1mm) SWL-१२.5m, Q-१८ lps, dd.-१३.६० m, (ज.उ.स.२०७८/०७९) १८८७३०८	पम्पघर/पम्प/विद्युतीकरण कार्य (ज.उ.स) (०७८/७९) 20hp Pump, 5" 13 nos. Column Pipe, 25 KVA Transformer १० hp, ३ इन्च ४२ मि कोलप पाईप replace 2370581		०७९/८०, १४९०/5/2 2231595.8	६४८९ ४८५	सम्पन्न

सिनं	योजनाको नाम	GPS	जउसको नाम	अध्यक्ष को नाम	प्राबिधिक विवरण				हालसम्म को खर्च	कैफियत
					DTW निर्माण	पम्प घर	पम्प तथा बिद्युत	पाइप लाइन/भल्भ		
३१	माकर डिप ट्यूववेल योजना बर्दघाट १ नवलपरासी	27.519444, 83.7755555	माकर ज.उ.स	शिव नारायण चौधरी ९८६७४६६९०	DD-170, LD-16२, H-48, S-15 (१३६-१४२, १४७-१५६), 16 LPS Exp- From WUA, 2078/3/15 1987365	पम्पघर/पम्प/विद्युतीकरण कार्य (५/७८/७९) 20hp Pump, 5" 13 nos. Column Pipe, 25 KVA Transformer 2568245.84		१५००/ १५ भल्ब २८३२७७४ .८२	7388386	सम्पन्न
३२	सिदि विनायक डिप ट्यूववेल जउस बुटवल १४,, सिर्जनाटोल,		उज्यालो विनायकपुर ज.उ.स,	सन्तोष काफ्ले	ट्यूववेल बिगत आ.ब.मा सम्पन्न भएको ९८४७३१८७३५	1383216	20hp Pump, 4" १३ nos. Column Pipe, 25 KVA Transformer) 955200	१४८५ +५१९.५/15 +7 3050754	5389170	
३३	बंगला बंगाली डिप ट्युववेल सिँचाइ योजना देवदह न. पा.		बंगाली ज.उ.स. देवदह न. पा. ६	खेम प्रसाद पाण्डे ९८६७३०१३५९	ट्यूववेल तथा अन्य संरचना बिगत आ.ब.मा सम्पन्न भएको			९१९.६/ ९ V ; खर्च १३९११८० .०८	1391180	सम्पन्न
३४	बरपिपल डिप ट्युववेल सिँचाइ योजना बर्दघाट-१३, नवलपरासी		बरपिपर ज.उ.स. वर्दघाट १३	बासुदेव तिवारी ९८४७२५८९८	ट्यूववेल तथा अन्य संरचना बिगत आ.ब.मा सम्पन्न भएको, पुरानो नहर सुदृढिकरण			१३६९/ १९भल्ब ; १६७०४८९ .२६	1670489	पुरानो नहर सुदृढिकरण
३५	सिशौडाडा भूमिगत सिँचाइ प्रणाली परोहा-१, सैनामैना, रुपन्देही		शिसैडाडा भूमिगत ज.उ.स. सैनामैना ४	टेक ब श्रीस ९८४७१५००५९	ट्यूववेल तथा अन्य संरचना बिगत आ.ब.मा सम्पन्न भएको			१२३३/ 4 वटा भल्ब, २८६५५७. ६०	286557	थप बिस्तार

सिनं	योजनाको नाम	GPS	जउसको नाम	अध्यक्ष को नाम	प्राबिधिक विवरण				हालसम्म को खर्च	कैफियत
					DTW निर्माण	पम्प घर	पम्प तथा बिद्युत	पाइप लाइन/भल्भ		
३६	डेलर डिप ट्युववेल सिँचाइ योजना गैडहवा-५, रुपन्देही		डेलर डिप ट्यूववेल ज.उ.स. गैडहवा ५	रुद्र सापकोटा ९८५४७५५४६	ट्यूववेल तथा अन्य संरचना बिगत आ.ब.मा सम्पन्न भएको			९५१/९ भल्ब, खर्चः १५०३९०७.३७	1503907	थप बिस्तार
३७	बक्सरडाडा डिप ट्युववेल सिँचाइ योजना सैनामैना-५, रुपन्देही		बक्सरडाडँ डिप ट्यूववेल ज.उ.स. सैनामैना ५	प्रेम कार्की ९८६७१९०२७४	ट्यूववेल तथा अन्य संरचना बिगत आ.ब.मा सम्पन्न भएको			८९८/ १६ भल्ब, खर्चः १६९८८०३.२१	1698903	थप बिस्तार
३८	सुर्यानगर डिप ट्यूववेल योजना, बर्दघाट १६	२७.५२१७१ ८३.८१६०५	सुर्यनगर ज.उ.स.	हरि चन्द्र सापकोटा ९८४७३४२३०५	DD-१६७m, LD-१५९m, H-४८m SP-(५६-६२, १४४-१५०)m=१२m, SWL-१२m, Q-15lps, ddr.-25.३m १६२७८९७	20hp Pump, 4" 13 nos. Column, 25KVA Transformer २९०९४८७.३४		१२६४/१३ भल्ब, २३७५६२३	६९१३००७	सम्पन्न
३९	भद्छी बगाह ट्युववेल सिँचाइ प्रणाली सैनामैना-९, रुपन्देही	२७.६९७११३ ८३.२९००३	भडछी वगहवा डिप ट्यूववेल ज.उ.स. सैनामैना ९	भेगा खत्री ९८६७१४७११०	DD-१२०m, LD-११५m, H-४८m SP-(६०-६३ ९३-९९ १०६-१०९)m=१२m, Q-७.५ lps १४७२५२५	5 Hp Pump, 42 m Column Pipe-2.5"Dia.(14 Nos.) 421090		थोरै पानी भएकोले थप संरचना निर्माण नहुने ।	1893615	सम्पन्न

सिनं	योजनाको नाम	GPS	जउसको नाम	अध्यक्ष को नाम	प्राबिधिक विवरण				हालसम्म को खर्च	कैफियत
					DTW निर्माण	पम्प घर	पम्प तथा बिद्युत	पाइप लाइन/भल्भ		
४०	रामपुर डिप ट्युववेल योजना पाल्पा	27°41'41" N 83°17'30" E	क) उन्नति-रामपुर ७	यम बहादुर सुनार	DD-१२०m, LD-१२०m, 6" DTH, Q-2 lps. WUA , २ लि/से 1194409	सानो पानी बाँकी कार्य नभएको ।			1194409	असफल
४१		27°51'35"N 83°53'47" E	ख) मिलनटोल -रामपुर ७	मोहन भट्टराई ९८५७०६०३	DD-१00m, LD-65m, 6" DTH, Q-4 lps. 1033946	3Hp Pump, 2" 16nos. Column Pipe 32486		सानो पानी बाँकी कार्य नभएको ।	1066432	असफल
४२	क) कोकलदेवी-तानसेन ७ पाल्पा	27°50'03" 83°33'24"	कोकलदेवी जउस	इश्वरी प्र भण्डारी 9851144342	DD-१२0m, LD-१२०m, H-६० m (८/6)" DTH, Q-२ lps	2 Hp Pump, 1.5" 20nos. Column Pipe 180841.2		RVT Tank ५३१२५३.०६	712094.3	
४३	ख) रानीकोहल-तानसेन ९ पाल्पा	27°50'05" 83°33'29"	रानीकोहल	माधव प्र पौडेल ९८४७२९६५८१	DD-१२0m, LD-१२०m, H-६० m (८/6)" DTH, Q-5 lps	5 Hp Pump, 2.5" 18 nos. Column Pipe 421962.9		खर्चः (ट्यांकी) ६२१९६५.८४	1043929	सम्पन्न

सिनं	योजनाको नाम	GPS	जउसको नाम	अध्यक्ष को नाम	प्राबिधिक विवरण				हालसम्म को खर्च	कैफियत
					DTW निर्माण	पम्प घर	पम्प तथा बिद्युत	पाइप लाइन/भल्भ		
४४	सुक्रबस्ती डिप ट्युववेल योजना वर्दघाट-१४ नवलपरासी	२७.५२०७५, 83.80047	शुक्र ज.उ.स, बर्दघाट १४ सुक्रबस्ती, नवलपरासी	राधाकृष्ण अधिकारी ९८४७०५३१९८	DD-135, LD-76, S 15 (49-64) lcg) Q-31 lps, dd-27.31 १७८८८७८	१००९६२३	20HP, 5" col, 42m low-flange system, 50KVA Trans, १३८३५२७	१५२०/११/२ ज.उ.स. ०७८/७९ २५३९३००	6721328	योजना सम्पन्न
४५	सण्डा डिप ट्युवबेल रामग्राम १० सन्डा	२७.५५४०३, ८८.६७०३५	भगवती ज.उ.स, रामग्राम १० सन्डा	सदानन्द चौधरी ९८०७४२२१२	DD-270, LD-238, S 12 (132-135,181-184,220-226 ss , १२ लि/से. 2077/5/15 1946774.29	15hp pump, 4" 14 nos. column pipe, 25KVA Transformer, १० hp पम्प Replace ५३७७७२+1313332.11		८७२+८८८. ५/ ९+९ भल्व 1776548	5574426	योजना सम्पन्न
४६	मेहलवारी डिप ट्यूववेल योजना लु.स.न.पा-१० रुपन्देही	27.46761, 83.30925	महिलवारी डिप ट्यूववेल जउस	रामचरण यादव ९८०३३३२३८०	DD-180, LD-170, S 18 (106-115,155-164 ss), १८ लि/से 1564037.12	(ठेक्का न ७/०७९/८०(ELE+PH) भुक्तानी १७३३७८२.२१, 15hp pump, 4" 14 nos. column pipe, Exp-664435.48 २५ KVA ट्रान्सफर्मर पम्प (घर १८०७९३.४१+180793+ 1733782+664435			१०७२/१० (८१/८२)+ २६०/२ (082/83) १४७१००० +395500	6009547	सम्पन्न २०८२/८३

सिनं	योजनाको नाम	GPS	जउसको नाम	अध्यक्ष को नाम	प्राबिधिक विवरण				हालसम्म को खर्च	कैफियत
					DTW निर्माण	पम्प घर	पम्प तथा बिद्युत	पाइप लाइन/भल्भ		
४७	बालापुर डिप ट्यूववेल सिं यो, सैनामैना ५	२७.७०५३७३, ८३.३३६८३	वालापुर ज.उ.स., सैनामैना ५ बालापुर	पूर्ण प्रसाद खनाल ९८१५४४०४३४	DD-150, LD-120, H-48, S-15(58-67, 108-114 1mm SS, SWL-14.5m, Q-13 lps, ddr.-11.70m १५१०६५८	ठेक्का न ८/७९/८०(ELE+PH) भुक्तानी २३७५६२६.४३(७९/८०) 15 Hp Pump, 4" 14 nos. Column Pipe, 25 KVA Transformer, (७.५ hp पम्प replace २०८०/८१ मा) २३७५६२६		१५१८/१६ (४") 1453753	५३४००३७	सम्पन्न
४८	सैना मैना न.पा. साविकको परहवा गा.वि.स.	27.69944, 83.33111	सिमरहवा डिप ट्यूववेल जउस सैनामैना ५	जिवाखर चापागाई ९८४७३६७०३१	DD-150,LD-121,SP-(63-66,106-115)=12m,SS, 10/6", Housing=48m, १५ लि/से 1299862	७९/८०(ELE+PH) 25 KVA Pole 3	20 Hp Pump, 4" 13 nos. Column Pipe (2082/83 मा 10 HP Pump हालेको) 1579302+640258	१७५०/१९ भल्व २८९५६५६.३	6415078	सम्पन्न
४९	थुमवा पिपरहवा ५,ठुलोथमुवा,		हनुमान सम्मारीमा इ ३,	श्रवण राय ९८५७०	DD-125, LD-117, S-12, H-42 1857607	570427.92+wua 30275	15 Hp/36m, Exp- (74/55) 503706.32 25kva-7.9029.80	१४४२/१३/२ 1701298	4633040	सम्पन्न
५०	थुमवा पिपरहवा ४, पिपरागाउ		शाह ज.उ.स., सम्मारीमा इ ३	शाहबुद्धिन देवान ९८५७०११५६१	DD-125, LD-110, S-15, H-42, १२ लि/से १८५७१५५	494442.3	(15hp,36m col 503706.82 9 pole,25 KVA TF ११९४६२१	DS-1500m, loop-3, surge 3, outlet-12 1825727	५८७५६५२	योजना सम्पन्न
५१	मन्दिरडाँडा डिप ट्यूववेल योजना कन्चन-१	२७.६८०१२ ८	मन्दिरडाँडा ज.उ.स,	जीवन थापा ९८६३१८८२ ५६	DD-126m, LD-125, H-48, S-18 lcg, / WUA १५ लि/से 1691398.91	761574	20HP, 4" Col, 42m Low-flange system, 25KVA Trans,(077/78) (10 Hp Pump Lowered in 2082/83) 1348325	१५००/११ (४")/, १३०८९३३	5110231.39	सम्पन्न वेलमा समस्या

सिनं	योजनाको नाम	GPS	जउसको नाम	अध्यक्ष को नाम	प्राबिधिक विवरण				हालसम्म को खर्च	कैफियत
					DTW निर्माण	पम्प घर	पम्प तथा बिद्युत	पाइप लाइन/भल्भ		
५२	जहदा जमुनिया सुनवल सरावल डिप ट्यूववेल आयोजना (१५ गोटा सिँचाइ प्रणाली)	27°31.1903, 83°46.0885	१) हराबरा ज.उ.स बर्दघाट १२ बड्की भटौली	सुजित पोखेल ९८१३७१३६०९	DD-160, LD-160, H-48, S-15(134-140, 145-154), Q २५ लि 1654440.98	१६२५६ २७	25 HP, 5" Col., 36m Low. Exp ७०८६०८.८८- 34 Pole, 50 KVA Trans, Exp- (36-077/78) 2064841.63	(DS-१५६०, २ sur, 12 V) 1914611	7968129	सम्पन्न
५३		२७.५०६६७४, ८३.७६९११	२) सिद्धार्थ ज.उ.स, बर्दघाट १२ दबिल्ला	रामचन्द्र अधिकारी	DD-165, LD-160, H-42, S-15(44-50, 128-131, 148-154) पानि २२ लि. 1629128.98	Ph+ upvc	25 HP, 5" Col., 36m Low. Exp-६०६९६८.२ 7 Pole, 50 KVA Trans, Exp- 992394.25	१५००/१६ +४९५.५/ ५ 2910809+ ९०९३६७ (080/81)	7048668	सम्पन्न
५४		२७.४९७११, ८३.७८०९१	३) विश्रामपुर ज.उ.स, बर्दघाट-१२, चौपट्टा	गगांदत्त भण्डारी ९८४७०४१७६१	DD-155, LD-143 S-15 (46-58, 134-137) H-45, पानि २३ लि	PH+DS	25 HP, 5" Col., 36m Low. Exp- 573250.13 3 Pole, 50 KVA Trans, Exp- 994908.5	१५२४/१६ /३ 2910809.28		सम्पन्न

सिनं	योजनाको नाम	GPS	जउसको नाम	अध्यक्ष को नाम	प्राबिधिक विवरण				हालसम्म को खर्च	कैफियत
					DTW निर्माण	पम्प घर	पम्प तथा बिद्युत	पाइप लाइन/भल्भ		
५५		२७.५०१५५९, ८३.७५१४	४) कालिका ज.उ.स, बर्दघाट-१३, लेबडा पोखरी टोल	टिका पहारी ९८५७०२५६०२	DD-170, LD-17०, H-48, S-18 (128-140, 158-164) पानी २४ लि 1538273.87	592272.91	25 HP, 5" Col., 36m Low. Exp 545402.41- 20 Pole, 50 KVA Trans, 1573694.5	१५००+४४ २/१६+४., २ सर्ज 2927735.48	7177379	सम्पन्न
५६		27.51208, 83.755034	५) सन्तोषीमाता ज.उ.स, बर्दघाट-१२, कुसुमचोक भटौलिया	महेन्द्र कापले ९८२१५५६३१८	DD-170, LD-167, H-48, S-18 (133-142, 148-157) २२ लि/से 1733342.1	Pump House +DS 1606126.2	25 HP, 5" Col., 36m Low. 708608.88 4 Pole, 50 KVA Trans, 954262.4	१६९८ मि UPVC 16 Outlet 2 surgriser 2576219	7578559	
५७		२७.४८८८३, ८३.७५२३९	६) जयनगर कालिका ज.उ.स, बर्दघाट-१३,बिस्मिल्लाटोल	मनवहादुर सुनार	DD-173, LD-173, H-42, S-15 (44-47, 147-150, 158-167), २१ लि/से 1484385.87	Tot exp 592272.91 592272.91	25 HP, 5" Col., 36m Low. Exp- 500174.16 500174.16 13 Pole, 50 KVA Trans, Exp- 1402363.9 1402363.9	uPvc-1516 surge-2, outlet-13 2774471	6753668	सम्पन्न

सिनं	योजनाको नाम	GPS	जउसको नाम	अध्यक्ष को नाम	प्राबिधिक विवरण					हालसम्म को खर्च	कैफियत
					DTW निर्माण		पम्प घर	पम्प तथा बिद्युत	पाइप लाइन/भल्भ		
५८	जहदा जमुनिया सुनवल सरावल डिप ट्युबवेल आयोजना (१५ गोटा सिँचाइ प्रणाली)	27.489863, 83.74558	७) अन्नपूर्ण ज.उ.स, बर्दघाट-१३, मझौनी (पुर्व)	देवी प्र पाध्य ९८४७२५६०४९	23.4	DD-170, LD-170, H-48, S-15(129-132, 149-158, 161-164) Q २३.४ लि. 1714467.04	Tot exp 592272.91	25 HP, 5" Col., 36m Low. ६९६१४२.१५ 4 Pole, 50 KVA Trans, (36-76/77) 874985.53	(DS-१६००, surge २, १६ valve) 2905550	6783418	सम्पन्न
५९		27.484868, 83.25725	८) किसान कल्याणकारी ज.उ.स बर्दघाट-१३, मझौनी (पच्चिम)	छोटेलाल यादव ९८४८६०९९१२	DD-170,LD-166, H-48, S-18 (123-129, 148-160) Q २२ लि 1704920		1602907	25 HP, 5" Col., 36m Low. Exp- 696142.15 5 Pole, 50 KVA Trans, Exp 897156.13	uPvc-1632, surge-2, outlet-15२४२५८२९	७३२६९५५	
६०		२७.४९७११, ८३.७८०९१	९) ब्रहमबाबा ज.उ.स, सरावल-२, मगरमुडा	प्रलात पासी	DD-230, LD-223, H-48, S-15,1mm SS (176-185,198-204,214-217) Q १६ लि. २१३९९१६			20 HP, 4" /42m. ७०७४८७ 20 Pole, 25 KVA, Exp-(77/78) १२०५७३५	2 ph+ 1500 upvc package २७३९७६६	६७९२९०४	

सिनं	योजनाको नाम	GPS	जउसको नाम	अध्यक्ष को नाम	प्राबिधिक विवरण				हालसम्म को खर्च	कैफियत
					DTW निर्माण	पम्प घर	पम्प तथा बिद्युत	पाइप लाइन/भल्भ		
६१		२७.५५७१६, ८३.६९३७९	१०) जय दुर्गा ज.उ.स, सुनवल-१२, फरौली	बिरेन्द्र कुमार श्रेष्ठ ९८५७०१२८३२	DD-250, LD-240, H-54, S-12(218-230) 2075/10/28 पानि २० लि २२०५२२४	बनेको	20 HP, 4" Col., 42m Low. Exp- 707464.75 46 Pole, 50 KVA Trans, Exp- 2850180.44 (77/78)	ph + 1500 upvc combine २७३११५७	८४९४ ०२७	
६२		२७.५५४८२५ ८३.७०२५७	११) धोबिटोला ज.उ.स, सुनवल-१२, धोबिटोला	शिव शंकर चौधरी ९८५७०१२८३२	2nd-DD-250, LD-240, S- 9 (217-220, 222-228) १२ लि पानि २२०५२२४	Tot exp 176656 6.92	20 HP, 4" Col., 42m Low. Exp- 707464.75 11 Pole, 50 KVA Trans, Exp- 1283339.55 (77/78)	ph &204 m pipe division बनाउदा pipe destroy भएको	५९६२५९५	
६३		27.61529, 83.6746	१२) तिल्काना ज.उ.स, सुनवल-६, तिल्काना	रुप ब मल्ल ९८६७२५०१२६	DD-135, LD-102, S-18(65-71, 76-82, 85-91) बहाव १८ लि. १५८२०८८	बनेको	20 HP, 4" Col., 36m. ६४३१७५ 5 Pole, 50 KVA Trans,(77/78) ८३६५४९	Ph+ 1500 upvc combine २९२०३०६	५९८२११९	सम्पन्न
६४	ज.ज.सु.स. योजना (समपुरक)	27.776304, 82.547607	१३) किर्तिपुर ज.उ.स, सुनवल-६, किर्तिपुर	राम कुमार जिसी ९८६७२९४१३३	DD-150, LD-140, S-18(56-62,80-86,128-134 1mm ss), 4 LPS १७३३९०४		5 HP, 2.5" Col., 39m. ६१३११७			

सिनं	योजनाको नाम	GPS	जउसको नाम	अध्यक्ष को नाम	प्राबिधिक विवरण				हालसम्म को खर्च	कैफियत
					DTW निर्माण	पम्प घर	पम्प तथा बिद्युत	पाइप लाइन/भल्भ		
६५		27.61629, 83.65672	१४) आदर्शनगर ज.उ.स, सुनवल-६, आदर्शनगर	सरस्वती रिमाल ९८१८१९८२९०	DD-150, LD-146, H-48, S-18 (61-64,67-73, 80-83, 123-126, 137-140 ss) 2076/8/20, १७१४५२४	बनेको	(पम्प-20 HP, 4" 36m. ६४३१७५) बिद्युत- ८ पोल/ 50 KVA - 77/78 खर्च १०४५५४२	२०४/३ १७४३४०४	५१४६ ६४६	
६६	रुपौलिया ८ डिप ट्यूववेल सिँचाइ प्रणाली	२७.५१०२७, ८३.७५१	राजाराम ज.उ.स, सुस्ता ८	तारा आचार्य ९८४७०८१२ ०९	DD-100, LD-80, H-42, S-18, swl-8.7, Q-27 lps, dd-6.13, १७११९५०	903808	25hp, 5", 30m pipe low 50 Kva T/F 1448969.94	1848805.9	5913534	
६७	बर्दाघाट ५, पालडाँडा डिप ट्यूववेल सिँचाइ प्रणाली	27.530596 83.801172	शिवालय डिप ट्यूववेल ज.उ.स.	गगांधर आचार्य 9844776803	DD-१७०, LD-१६७, S-१५ (१३०-१३३, १४४-१४७, १५२-१६१) 2077/78 /2nd DD 190,LD-185.5 S=17m (130-133), (143-146), (153-158), (167-173) MS Slotted ,8" 1572878.32 (1572878.32+3515330) रिड्रिल	962421	10 hp pump, 4" १५ nos. column pipe, 25 KVA Transformer खर्च 1168606 (२० को पम्प निकाली १० हालेको)	९९०+२२२ मि १६०८१६५ +३९४७०३	9222103	रिड्रिल र पम्प फेरेको
६८	सुनवल न.पा.-८	27.586784, 83.583070	संगमटोल ज.उ.स., सुनुवल ८ नवलपरासी	होम गुरुङ ९८१७४९२८७०	DD-135,LD-134, H-42, S-15(60-63,85-88,109-112,118-121,127-130 lcg) (75/76) 2075/1/24: १९६०७७६	90301.66	10 HP, 4" Col., 39 low, 25 KVA Trans, Exp- 1483041.0 (77/78)	पानि कम भएकोले बनाउन नपर्ने	३५३४ ११९	पानि कम (ढुंगा खसेको)

सिनं	योजनाको नाम	GPS	जउसको नाम	अध्यक्ष को नाम	प्राबिधिक विवरण				हालसम्म को खर्च	कैफियत
					DTW निर्माण	पम्प घर	पम्प तथा बिद्युत	पाइप लाइन/भल्भ		
६९	सिंगाह सिंचाइ, देवदह-४	27.67436, 83.5886	सिँगाह ज.उ.स.,	नारायण शर्मा ९८४६६०७४	LD-169, S-15 (58-64,95-98,157-163), Q १० लि 1749124	डिस्चार्ज राम्रै भएता पनि पानि अत्यधिक धमिलो भै सफा नभएको कारणले बाकि संरचना निर्माण नगरीएको - असफल ट्यूववेल			1749124	असफल
७०	पाकरी डिप ट्यूववेल, देवदह-८	27.63888, 83.58111	पाकारी ज.उ.स, देवदह ८	शोभाखर पाण्डे ९८५७०२६	DD-200m, LD-142m, SP-(61-70)m,(124-130)m=15m, SWL-1.10m, ddr-14.9m, Q-12 lps, १२९८४१५		०७७/७८ मा ट्यूववेल निर्माण गरीएकोमा वेलमा अत्यधिक sand देखिएकोले थप development को कार्य गर्दा पनि पानी सफा नभई बाँकी थप कार्य नगरीएको ।		१२९८४१५	असफल
७१	कृषि कालिका डिप ट्यूववेल, सुनुवल १२	२७.५५२९७ ८३.६९०४७	कालिकादेवी ज.उ.स.	तुल्सीराम ज्ञवाली ९८४७०१७१४	DD-232m, LD-232m, H-54m SP-(209-212, 214-220)m=9m, SWL-29m, Q-6lps, ddr.-26m, P २१६१०००		डिस्चार्ज कम भएको कारणले बाकि संरचना निर्माण नगरीएको		२१६१०००	असफल
७२	बनदेवी डिप ट्युववेल सिँचाइ प्रणाली रामग्राम-११, जमुवाड	27.55297,83.69047	बनदेवी ज.उ.स.,	भवानी प्र चौधरी ९८४७०८०३७५	DD-१९८m, LD-१९५m, H-४८m SP-(५७-६०, १२१-१२७, १८३-१८६)m=१२m, Swl-17.49,DWL-45.92Q-६lps, २९६७९४१		डिस्चार्ज कम भएको कारणले बाकि संरचना निर्माण नगरीएको		२९६७९४१	असफल
७३	समयथान भतौडी सुनवल-१२	२७.५६८१९, ८३.७०२५	समयथान ज.उ.स.	मोहनलाल कठरिया ९८१९४४७८२७	DD-240,LD-240, H-48, S-12 ss 1952255	956789	20HP, 4" Col., 39m, 25KVA Trans, Exp-१८२८३१७ (077/78)	वेलमा सुरुमा पानि राम्रो आएको पछी सञ्चालन गर्दा पानी नआएकोले गर्दा वितरण प्रणाली नवनाएको ।	4737361	असफल

सिनं	योजनाको नाम	GPS	जउसको नाम	अध्यक्ष को नाम	प्राबिधिक विवरण				हालसम्म को खर्च	कैफियत
					DTW निर्माण	पम्प घर	पम्प तथा बिद्युत	पाइप लाइन/भल्भ		
७४	सुनवौल ५, मिनि वनकट्टी	27.58722222, 83.66555556	मिनि वनकट्टी डिप ट्यूवेल जउस	राम ब थापा ९८१५४८३६२३	DD-270,LD-216, H-48, S-15 (62-68, 93-96, 198-204, ss, .75mm)/ Asian Drilling, Housing 48m : १९७७८४६.३३		डिस्चार्ज कम (२ लि) भएको कारणले बाकि संरचना निर्माण नगरीएको		1977846	असफल
७५	बोगडी ४ हर्दिगाउँ,	27.4388, 83.373333			DD-150, LD-133, S 18(45-56, 114-120,124-127 ss) 2077/5/29 खर्च -१३६९७२२.४४, Kind-४१४९४.३२		(अत्यधिक बालुवा देखिएकोले ट्यूववेल असफल हुन गएको)		1369722	असफल
७६	कोटाइमाइ डिप ट्यूववेल, रामग्राम-१३	27.53999,83.70509	कोटाइमाइ ज.उ.स., रामग्राम १३ पाडाटिकर	राम समुझ कुर्मी ९८००७००७७७	DD-243m, LD-230m, H-54m, Screen-(164-167), (172-175), (212-218) m SWL-17.60,DWL-32.40,Q=5.20 ठे.नं. ११/०७७/७८ १६११८४९		डिस्चार्ज कम भएको कारणले बाकि संरचना निर्माण नगरीएको		१६११८४९	असफल

अनुसूची-४: आ.व. २०७५/०७६ मा निर्माण सम्पन्न स्यालो ट्यूववेल योजनाहरु

क्र.स	ज.उ.स.	संख्या	जग्गा धनिको नाम	गहिराई	कैफियत
१	समैयामाइ स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. वुटवल-१८ रुपन्देही (श्यामलाल थारु)	६	विष्णु प्रसाद थारु	३० मि	6" MS DTH
			प्रेमनारायण शर्मा	३० मि	
			त्रिवेणी थारु	३० मि	
			भविश्वर खनाल	३० मि	
			कृष्ण प्रसाद ढकाल	३० मि	
			जगन्नाथ खनाल	३० मि	
२	सितलामाइ स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. शुद्धधन-३ रुपन्देही (बेनिमाधव रेग्मी)	८	खेम बहादुर	३६ मि	6 " MS
			दिनानाथ चौधरी	36 मि	
			भेषनाथ गौतम	30 मि	
			यम प्रसाद गौतम	30 मि	
			शिव कु थारु	30 मि	
			दुधनाथ चौधरी	30 मि	
			हेम ब खड्का	36 मि	
			होम ब राना	36 मि	
३	आदर्श स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. ति.न.पा-११ रुपन्देही खेम तिवारी	६	खेम तिवारी	30 मि	6" MS DTH
			हरि बस्याल	30 मि	
			नन्दीदेवी बस्याल	30 मि	
			जगन्नाथ अहिर	30 मि	
			केशरी खरेल	30 मि	
			केदारचन्द्र पराजुली	30 मि	
४	किसुली स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. सैनामैना-4 रुपन्देही	५	राज कुमार लोध	९३ फि	4" PVC
			दुगदिवी लोध	183 फिट	
			मुक्तार मुसलमान	93 फिट	
			गुरदिन लोध	93 फिट	
			शंकर प्र यादव	93 फिट	
५	कुस्मा स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. शुद्धोधन-१ रुपन्देही	६	समिद मुसलमान	९३ फिट	4" PVC
			महेश कुमाल	१६३ फिट	
			शुकई थारु	१०३ फिट	
			केउ थारु	९३ फिट	
			गर्भु थारु	१९३ फिट	
			कमला थारु	१७३ फिट	
६	शिवालय स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. देवदह-४ रुपन्देही	१		54 मि	6" MS DTH
७	दुर्गामाँ स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. सियारी-2 रुपन्देही	१०	बाबुराम थारु	२०३ फिट	4" PVC
			दुलारी थारु	१०३ फिट	
			भुलाई थारु	१०३ फिट	
			जितनारायण थारु	१०३ फिट	
			रामनारायण यादव	२०३ फिट	
			साधु यादव	२०३ फिट	

क्र.स	ज.उ.स.	संख्या	जग्गा धनिको नाम	गहिराई	कैफियत
			सहसराम थारु	१०३ फिट	
			छाडु थारु	१०३ फिट	
			भोला प्र तिवारी	१०३ फिट	
			रामकिसुन थारु	२०३ फिट	
८	परोंहा वोलवम स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. सैनामैना-१ रुपन्देही	१०	यम ब कुमाल	९८ फिट	4" PVc
			दिपेन्द्र चौधरी	८८ फिट	
			धमेन्द्र चौधरी	८८ फिट	
			बुद्धिराम चौधरी	८३ फिट	
			भरत चौधरी	९३ फिट	
			दशरथ चौधरी	७८ फिट	
			रुपनारायण चौधरी	१७८ फिट	
			तिलक चौधरी	८३ फिट	
			जित बहादुर	१८३ फिट	
			खुशिराम चौधरी	८८ फिट	
९	संयुक्त स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. ति.न.पा-१४ रुपन्देही	५	रन ब गूरुङ	११३ फिट	4" PVC
			धनिकला थापा	१८५ फिट	
			कृष्ण बहादुर पुन	२८५ फिट	
			मन कुमारी थारु	९३ फिट	
			खुम ब थापा	८८ फिट	
१०	अग्रहनी स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. माथागढी-3 पाल्पा	४			
११	चिदिपानि रुप्से स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. माथागढी-१,२ पाल्पा	१०	धनिसरा थापा	३६ मि	6" MS DTH
			मनोहर पन्थी	४२ मि	
			जमुना थापा	३६ मि	
			तारा कुमाल	३० मि	
			गणेश ब रुचाल	३० मि	
			सोम ब आले	३६ मि	
			लुक ब घर्तिमगर	३६ मि	
			भानुभक्त बस्याल	४२ मि	
			धन ब विक	४८ मि	
			धन ब कुमाल	३६ मि	
१२	मजुवा फुलवारी स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. मालिका-6 गुल्मी गोविन्द देवकोटा	२	गोविन्द देवकोटा	७० मि	6" MS DTH
				७० मि	
१३	सिमलटारी ढाव स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. मालिका गुल्मी -शुरेस क्षेत्री	२	शुरेस क्षेत्री	५० मि	6" MS DTH
				६४ मि	
१४	उपल्लो तमघास स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. रेसुङ्गा गुल्मी -गणेश व. खत्री	२	खालाका चौर	४५ मि	6" MS DTH
			बगालेखोला	४२ मि	
१५		१७	दुधनाथ चौधरी	१६० फिट	4" PVC

क्र.स	ज.उ.स.	संख्या	जग्गा धनिको नाम	गहिराई	कैफियत
	हरियाली कृषक स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. वर्दघाट-१२ (दुधनाथ चौधरी)		लक्ष्मण चौधरी	४८ मि	
			रोहित चौधरी	५१ मि	
			रामजी चौधरी	४६ मि	
			सूर्यनारायण चौधरी	४९ मि	
			बोधराज चौधरी	४६ मि	
			पार्वती चौधरी	४९ मि	
			राजु गुप्ता	४६ मि	
			सागर प्रसाद चौधरी	४५ मि	
			अनिरुद्र चौधरी	४६ मि	
			भिम ब चौधरी	४६ मि	
			सत्यनारायण चौधरी	४९ मि	
			इस्लाम मुसलमान	४९ मि	
			झक्कर थारु	४९ मि	
			शंकर चौधरी	४९ मि	
			जलिल जोलाहा	४९ मि	
			दिपेन्द्र अधिकारी	४६ मि	
१६	जयवजरङ्ग स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. रामग्राम-१६ (संजय कोहरी)	१०	अर्जुन चौधरी	१८० फिट	4" PVC
			मन्नु केवट	१४० फिट	
			विष्णु बरई	११० फिट	
			हाफि अन्सारी	९० फिट	
			ध्रुवनारायण चौधरी	११० फिट	
			भुलई कुर्मि	१०० फिट	
			उमेश कोईरी	८३ फिट	
			हरिनारायण चौधरी	१०० फिट	
			रामवेलास कुर्मि	९० फिट	
			रामवृक्ष कोईरी	९० फिट	
१७	खैरेनी स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. प्रतापपुर-९ (जितेन्द्र यादव)	४	जितेन्द्र यादव	१८ मि	4" MS
				१८ मि	
				१८ मि	
				१८ मि	
१८	विशाल स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. सरावल-३	५	विशेश्वर फौजदार	४६ मि	4" PVC
			राजेन्द्र चौधरी	४६ मि	
			चिनक चौधरी	४६ मि	
			सोमनाथ चौधरी	५१ मि	
			सोमनाथ चौधरी	४९ मि	
	आ.ब. २०७५/७६ को जम्मा	**११३**			

अनुसूची-५: आ.व. २०७५/०७६ मा निर्माण सम्पन्न स्यालो ट्यूववेल योजनाहरु

क्र.सं.	ज.उ.स. को नाम	संख्या	जग्गाधनिको नाम	गहिराई	कैफियत
क)	व.उ.शि.न. 33703054 बाट निर्माण भएका (५ गोटा योजानामा २२ गोटा STW)				
१	नन्दवन स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. ति.न.पा.-९ नन्देश्वर रुपन्देही	१		३३ मि	६" MS Rotary
२	पानवारी स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. सैनामैना-10 रुपन्देही	५	भिम कुमारी श्रीस	४२ मि	6" MS DTH
			भुवनसिंह श्रीस	४२ मि	
			जुद्ध ब दगामी	४२ मि	
			भुमिना घिमिरे	४२ मि	
			रोमन थापा	४२ मि	
३	वैकुन्ठपुर स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. सैनामैना- 6 आँधिखोला रुपन्देही	५	गोविन्द प्रसाद गैरे	३६ मि	6" PVC Rotary
			फर्शुराम बेलबासे	३६ मि	
			डिलमाया गैरे	३६ मि	
			रुमकला पन्थ	३६ मि	
			जायश्वर बस्याल	३६ मि	
४	चम्किपुर स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. वुटवल-१५ रुपन्देही	१			6" MS DTH
५	लोधपुरुवा स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. गैडहवा-4 रुपन्देही	१०	परास हरिजन	१२३ फिट	4" PVC
			हरि प्रसाद लोध	१२३ फिट	
			उमेश भर	१२३ फिट	
			राम समुझ लोध	१२३ फिट	
			जोगेन्द्र खरविन्द	११८ फिट	
			जगदिश भर	१२३ फिट	
			गंगाधर अहिर	१७३ फिट	
			किस्लावती लोध	१७३ फिट	
			बासदेव लोध	३२३ फिट	
			कन्टु कोहार	१७३ फिट	
ख	व.उ.शि.न. 337001204 बाट निर्माण सम्पन्न भएका पावर ड्रिल STW (९ योजना ४५ STW)				
		४	रामेश्वर थारु	३६ मि	6" MS DTH

क्र.सं.	ज.उ.स. को नाम	संख्या	जग्गाधनिको नाम	गहिराई	कैफियत
१	शितलामाई स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. शुद्धोधन-3 रुपन्देही		मोहरमन्या थारु	३६ मि	
			दिलिप कुमार थारु	३६ मि	
			तेजनारायण थारु	३६ मि	
२	मैनहिया स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. सियारी-२ रुपन्देही	१०	श्रवण कुमार नाउँ	२०३ फिट	
			त्रिभुवन प्रसाद थारु	२०३ फिट	
			झगरु तेली	२०३ फिट	
			किस्मती यादव	२०३ फिट	
			सहसराम थारु	१९३ फिट	
			कमलादेवी यादव	२०३ फिट	
			नरेन्द्र कुमार यादव	२०३ फिट	
			राम ब चौधरी	१९३ फिट	
			वृजनारायण यादव	२३३ फिट	
			राम प्रसाद यादव	२५३ फिट	
३	किशुली स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. शुद्धोधन- रुपन्देही	६	सूर्यमान यादव	९३ फिट	
			महेश अहिर	९३ फिट	
			बसन्ती अहिर	१०३ फिट	
			इन्जिजर अलि	१०३ फिट	
			राजाराम लोध	९८ फिट	
			शंकर अहिर यादव	१०३ फिट	
४	स्वाधिन स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. सैनामैना- 1 रुपन्देही	१			
५	वर्दहवा स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. सियारी-६	१			
६	शिवशक्ति स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. व.न.पा-१५ नवलपरासी	५	धन ब पुन	१५५ फिट	
			यज्ञमुर्ति पाण्डे	१६५ फिट	

क्र.सं.	ज.उ.स. को नाम	संख्या	जग्गाधनिको नाम	गहिराई	कैफियत
			धन ब मसरङगी	१५५ फिट	
			कमला सारु	१३५ फिट	
			तामे वि क	१४५ फिट	
			लुमकान्त खनाल	१६० फिट	
			नेत्र ब थापा	१५५ फिट	
७	हरियाली स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. व.न.पा-१३ नवलपरासी	५	कृष्णामाया सोमै	१५० फिट	
			विश्वनाथ उपाध्यय	१४७ फिट	
			श्रीराम देवकोटा	१५० फिट	
			मना ज्ञवाली	१५३ फिट	
			कृष्ण प्रसाद पौडेल	१५० फिट	
८	जयवजरङ्ग स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. रामग्राम-१७	५	दिनेश कोईरी	१०० फिट	
			राम प्रताप लोनिया	१०० फिट	
			दिनदयाल उपाध्या	१०० फिट	
			रामदेव केवट	९० फिट	
			उश्मान गनी	१०० फिट	
९	उनवछ स्यालो ट्यूववेल ज.उ.स. रामग्राम-१७	१			
१०	नवलपरासी जिल्लाका विभिन्न स्थान (सुनवल-१२ मा 1, रामग्राम-१ मा 1 र सुस्तामा 3 थान म्यानुअल)	५			Investigation Stw
	आ.ब. २०७६/०७७ को जम्मा	**६७**			

अनुसूची-६: आ.व. २०७७/७८ मा निर्माण सम्पन्न स्यालो ट्यूववेल योजनाहरु

सि.न.	योजनाको नाम	जग्गा धनिको नाम	GPS	संख्या	SWL (मिटर)	पाइप (मि.)	जाली (मि.)	कैफियत
१	कालिका स्यालो ट्युबवेल ज.उ.स. प्रतापपुर २,६	खेम नारायण थारु	27°28'21" 83°47'53"	७	१.५	१०	३	४" PVC
		इश्वरी चौधरी	27°28'३४" 83°47'४२"		१.८	३१	६	
		मान ब. थारु	27°28'४२" 83°47'४४"		१	२४	३	
		बाल देउ थारु	27°28'४५" 83°47'४3"		१	३४	३	
		खिला प्र. थारु	27°28'३1" 83°47'5२"		१.८	३३	३	
		अनिल शर्मा	27°2५'६०" 83°47'२५"			१७	३	4" MS
		श्याम कु. शर्मा	27°26'9" 83°47'19"			१४	३	
२	कमलेश्वर ज.उ.स. तानसेन ६,७,९	कुमकला न्यौपाने	27°५०'१.०६" 83°३३'२५.५७"	३	१५	४८	१२	6" MS Dth
		इश्वरी प्र. भण्डारी	27°४९'४९.०५" 83°३३'२8.81"		१२	४८	१२	
		कुल प्र. पाण्डे	27°५०'21.66" 83°३३'53.३७"			४८	१२	
३	लुम्बिनी एकिकृत कृषि फर्म ति.न.पा ८	जानकी न्यौपाने	27°2६'५५" 83°२९'३६"	१	७.६२	३७	१२	6" MS Dth
			आ.ब. २०७७/७८ को जम्मा	**११**				

अनुसूची-७: आ.व. २०७८/७९ मा निर्माण सम्पन्न स्यालो ट्युववेल योजनाहरु

सी.नं	योजनाको नाम	अध्यक्षकोनाम	जग्गाधनीको नाम	Depth (m)	Size	GPS	SWL	STW
१	प्रगतिशील ज.उ.स सैनामैना-५, सेरुवा	पशुपति ज्ञवाली	पशुपति ज्ञवाली	५०	४"	२७.६८२१३३° ८३.३२५७४९°	७	१
२	रजबोहा स्यालो ट्युववेल ज. उ. स, रुपन्देही गैडहवा-७, रजबोहा, रुपन्देही	जनार्धन लोध	बनकराम कहार	६३	४"	२७.६०४३८३° ८३.३०५९३°	३	४
			चिनक कहार	६३		२७.६०३७८° ८३.३०८७६°	४	
			चीनकी लोध	६३		२७.६०१९६° ८३.३०६५१°	३	
			जनार्धन लोध	६३		२७.६०१८° ८३.३०५६४°	२	
३	सुमेरु स्यालो ट्युववेल, तिलात्तोमा-८, र तिलात्तोमा-१७	डुगेंद्रराज ज्ञवली	डुगेंद्रराज ज्ञवली	४२	४"	२७.६८२१३१° ८३.३२५७४९°	८	२
			राजेन्द्र अधिकारी	४२			६	
४	बजबोहा ज. उ. स कन्चन-२, बजबोहा	प्रेमबानिया	प्रेमबानिया	५०	४"	२७.६२५४५६° ८३.२८६६३९°	४	१
५	आश्रिबाद ज.उ.स सैनामैना-९, बांसगढ़ी	चुडामणि पौडेल	चुडामणिपौडेल	४५	४"	२७.६८७७७६ ८३.२८१२३१	११	१
६	बेताहानीस्यालो ट्युववेल ज. उ. स. सुद्धोधन-३, बेताहानी	कपिल कुर्मी	कपिलकुर्मी	३४	४"	२७.६१९०३ ८३.४२२६२४	३	२
			राजु क्षेत्री	३६		२७.६०६४२५ ८३.४२०९४४	२	
७	भट्परवाज. उ. स. रोहिणी-२	पुर्णबासी यादव	पुर्णबासी यादव	५८	४"	२७.४८९२४४ ८३.५१९५५४	१	२
			चन्द्रिका प्रसाद यादव	५८		२७.४९२९१७ ८३.५१४९२५	४	
८	आधुनिक कृषि देवदह-१०	सुर्य प्र. उपाध्याय	सुर्यप्रसाद उपाध्याय	७२	६"	२७.६८७५१९ ८३.५०७५९		१
९	अम्रहवास्यालो ट्युववेल ज. उ. स. तिलात्तोमा-१७ रुपन्देही	बिरबहादुर पारसी	लोकहरिथापा	६	४"	२७.५५७५९ ८३.४९४९८५	१	१२
			राम प्रसाद थारु	६		२७.५५४८८४ ८३.४९४४३६	०.५	
			हिरा भर	६		२७.५५६८४५ ८३.४९८१५	०.३	
			छबिलाल कोइराला	७		२७.५६०९६ ८३.४९५३२	१	
			गोबर्धन थारु	७		२७.५५७२८३ ८३.४९१६७६	०.४	
			त्रिभुवन पाल	८		२७.५६०७९९ ८३.४९२३३७	०.६	
			राकेश मल्लाह	७		२७.५५९७८८ ८३.४८९२९५	०.६	
			किरण चौधरी	७		२७.५५७६२१ ८३.४९०१४५	०.८	
			प्रशान्त बस्याल	७		२७.५६२२४९ ८३.४८४५३	०.४	
			साधु प्रसाद थारु	७		२७.५६२९९६ ८३.४८९५४५	०.५	

सी.नं	योजनाको नाम	अध्यक्षकोनाम	जग्गाधनीको नाम	Depth (m)	Size	GPS	SWL	STW
			अर्जुन बस्नेत	७		२७.५६३१७७ ८३.४९५६५६	०.६	
			मन बहादुर थारु	६		२७.५६६२१९ ८३.४९६६८१	०.७	
१०	कोलिपस्यालो ट्युववेल ज. उ. स. देवदह-४,९	सशिधरढकाल	चन्द्रेश्वरढकाल	५८	४"	२७.६४८७०१ ८३.५६४६५६	१२	२
			शोभाकान्त	४०	४"	२७.६३७१३९ ८३.५९४२५३	९	
११	हरियालीज.उ.स रोहिणी-३,७	दिनेशकुमार यादव	सार्बजयादव	८६	४"	२७.४९९९०१ ८३.५५३०८४	आर्टिजन	२
			बाबुलाल यादव	८६	४"	२७.४८२३१३ ८३.५३४१७३	आर्टिजन	
१२	बनदेवीस्यालो ट्युववेल ज. उ. स बर्दघाट-१६	डोलमानबुढा	रेण ब. बुढाथोकी	४०	६"	२७.६०४३८३ ८३.३०५९३	१३	२
			नेत्र ब. कुँवर	४०	६"	२७.५९८८२ ८३.३०९६६	११	
१३	कुंवार्वोर्तीमाई ज. उ.स. रामग्राम-१६	दिपेन्द्रधवल	बलिरामयादव	१५९	४"	२७.५१००३ ८३.६२६२२	११	१
१४	काणरमाई ज.उ.स. रामग्राम-१५	चिनबहादुर आरख	प्रकाशयादव	११६	४"	२७.५३८८ ८३.६१५८३	१०	१
१५	पोखराथोकमाडी स्यालो ट्युबवेल ज. उ. स. बगनासकाली-२	गणेशबहादुर बकावल	तिर्थप्रसाद भट्टराई	३६	६"	२७.८३११३ ८३.६०२२६	६	५
			नर बहादुर सिंजाली	४८	६"	२७.८३२३८ ८३.६०१६४३	६.८	
			जयन्ति कुमारी गाहा	४२	६"	२७.८३००७ ८३.५९८०२५	३	
			आत्मकला बस्याल	४८	६"	२७.८३४३२ ८३.६००९७	१३	
			नयन बहादुर थापा	४८	६"	२७.८३८१२ ८३.६०५०८	१२.७	
१६	कार्कीडाँडास्यालो ट्युववेल ज. उ. स. तान्सेन-८	मोहन लाल कार्की	मोहनलाल कार्की	४८	६"	२७.८३४१८ ८३.५४८३४४	५	८
			टंकनाथ पौडेल	५४	६"	२७.८३५५३ ८३.५४०३३२	७	
			सुन्दर गी. सी.	४८	६"	२७.८३६६४ ८३.५३९८१८	१	
			शान्ति देवी बस्नेत	४८	६"	२७.८२७६८ ८३.५३७०४६	९	
			शेर बहादुर खत्री	४२	६"	२७.८३४२६ ८३.९५३४	४	
			सुन्दर जी. सी	६६	६"	२७.८३६२५ ८३.५४७१४	१६	
			लक्ष्मण प्र. कोइराला	४२	६"	२७.८४४३२ ८३.५४८३१८	११	
			मिन बहादुर बलाल	५४	६"	२७.८३५५१ ८३.५५७०१९	१३	
१७	दमकडा ज. उ. स तान्सेन-९	राजेश कु. अर्याल	राजेशकुमार अर्याल	४८	६"	२७.८२६८६ ८३.५७२०५८	१७	१
							कुल जम्मा	४८

अनुसूची-८: आ.व. २०७९/८० मा निर्माण सम्पन्न स्यालो ट्यूववेल योजनाहरु

क.सं	ज.उ.स. को नाम	जग्गाधनीको नाम	Size (in)	Depth (m)	GPS	SWL (m)	संख्या
१	आदर्शटोल स्यालो ट्युववेल ज.उ.स. बुटवल-१६	नन्दलाल उपाध्याय	6	48	27.661703 83.398163	5	१
२	आदर्श तरकारी बालि उत्पादन कृषक समूह तिलात्तोमा-११	तिल्चन भट्टराई	6	50	27.621703 83.502394	10.3	१
३	भाटा प्रगति स्यालो ट्युववेल ज उ स बुटवल-१५, चम्किपुर	लक्ष्मीकान्त उपाध्याय	6	47	27.677864 83.40272	4	२
		चन्द्रमाया राना	6	47	27.675893 83.402811	3	
४	मर्यादापुर स्यालो ज.उ.स.कोटईमाई-३	मनोसरा पाण्डे	४	50	27.465363 83.37716	2	१
५	माथागढी स्यालो ज.उ.स. देवदह-६	सुर्य प्रसाद श्रेष्ठ	6	42	27.657869 83.603572	8.9	१
६	महुवारी स्यालो ज.उ.स. तिलात्तोमा-११	इश्वरी न्यौपाने	6	50	27.8391 83.5388	8.2	१
७	झुमापार स्यालो ट्युववेल ज.उ.स. कन्चन-२	सागर ज्ञवाली	6	50	27.619986 83.296638	11.3	१
८	बनाहा स्यालो ट्युववेल ज उ. स. सैनामैना-९	तुलाराम श्रेष्ठ	४	50	27.707705 83.285001	7.5	२
		भिम गुरुङ्ग	४	50	27.707726 83.283443	8.2	
७	जागृति कृषिसमूह स्यालो ज.उ.स. सियारी-३	कमलेश्वर दुबे	४	50	27.552548 83.387675	3	१
८	अन्नदाता स्यालो ट्युववेल ज. उ. स. सुस्ता-२	रमेश तिवारी	४	7.25	27.46668 83.86718	0.95	८
		लालबाबु पंजियार	४	13.8	27.46922 83.87147	2.7	
		जितराम पंजियार	४	8.4	27.469763 83.87636	0.5	
		बिशाल महत्व	४	8.1	27.469478 83.878016	2.9	
		झिन्नु सिंह	४	8.3	27.467443 83.879899	2.7	
		हेम नारायण पंजियार	४	16.7	27.47381 83.8811	3.1	
		कैलाश कुर्मी	४	21.4	27.475345 83.880506	7.2	
		दुर्गा प्रसाद पंजियार	४	12.8	27.47292 83.873136	8.5	
९	पनई स्यालो ट्युववेल ज.उ.स. बर्दघाट-१३	अशोक कुमार चौधरी	6	43	27.486471 83.781205	12.8	१
१०	अर्खले स्यालो ट्युववेल ज उ स तानसेन-९	मोहन प्रसाद सापकोटा	6	50	27.82893 83.56793	19.3	१
११	घरहाडाडा स्यालो ज.उ.स. बगनासकाली-२	गुणाखर भुसाल	6	42	27.83039 83.587179	3	१
१२	बंसगोपल स्यालो ट्युववेल	कमला भण्डारी	6	48	27.838896 83.540113	5	३

क्र.सं	ज.उ.स. को नाम	जग्गाधनीको नाम	Size (in)	Depth (m)	GPS	SWL (m)	संख्या
	ज. उ. स. तान्सेन-७	कृष्ण गाहामगर	6	36	27.840739 83.539786	7	
		खुमराज पाण्डे	6	42	27.839176 83.548769	1	
१३	बोहाफाट स्यालो ट्युववेल ज. उ. स. छात्रकोट-४ गुल्मी	भुपाल ज्ञवाली	6	४७	२७.९५६३०१ ८३.३८१७७४	१३.३	३
		कृष्ण प्र ज्ञवाली	6	५४	२७.९५७४४६ ८३.३७८७२६	१९.४	
		ओम प्रसाद श्रेष्ठ	6	४८	२७.९५९७५३ ८३.३७७३८८	१५.३	
आ.ब. २०७९/०८० को जम्मा							२८

अनुसूची- ९: आ.व. २०८०/८१ मा निर्माण सम्पन्न स्यालो ट्यूववेल योजनाहरु ।

S. N	WUA'S Name and Address	GPs	Chairman	Land Owner	Dia (in)	Depth (m)	No	Pump (hp)
1	Samabeshi power drill STW Sainamaina 10 Saljhandi, Rupendehi	27.705471 83.366696	Ram B. Barali	Ram B. Barali	6	42	1	3
2	Investigation STW Sainamaina 1 Bankatta Rupandehi	27.688784 83.434187	Jhabilal Pandey	Dhurga Bhawani Ma. Vi.	6	53	1	2
3	Himal Krishak Samuha STW Devdaha 3 Rupandehi	27.619123 83.552085	Kashinath Neupane	Kashinath Neupane	6	42.5	3	3
		27.619029 83.552036		Numkant Neupane		38.7		3
		27.558026 83.58088		Ram Praksha Tharu		60.5		2 (Ele
4	Kanchan STW UA Sainamaina 11 /Rupandehi	27.70696 83.288084	Shovakar Aryal	Shovakar Aryal	6	61.5	3	3 hp
		27.663508 83262786		Surya prasad Chapagain		50.2		
		27.662286 83.262818		Bhawani Shankar Chaudhari		46.5		
5	Sainamaina STW UA Sainamaina 1 Rupandehi	27.677636 83.365378	Shree Prasad Pun	Banaya Aale	6	42.8	1	3
6	Syalo Tubewell UA Sainamaina -1 Namauna tole, Rupendehi	27.677644 83.365538	Balkrishna Kharel	Balkrishna Kharel	6	50	1	3
7	Beldanda Syalo Tubewell Tilotama-11, Rupandehi	27.616076 83.52685	Ram Bilas Yadav	Ram Bilas Yadav	6	43.5	2	3
		27.618676 83.501943		Nabinraj Acharya		37.3		
8	Powerdrill Jhulenipur STW Tilotama-8 Jhulenipur, Rupendehi	27.626998 83.499668	Krishna prasad Sharma Chapagain	Krishna prasad Sharma Chapagain	6	46	1	3
9	Durgamata Powerdrill STW Bardaghat-16 Bandebi, Nawalparasi	27.49283 83.83908	Man bahadur kami	Durgamata bandebi mandir	6	37.5	3	2
		27.496711 83.839424		Phonemaya Chauhan magar		41.2		
		27.495 845 83.835543		Premlal Kunwar		41.2		
10	Kotahimai Powerdrill STW Suddodhan-1, Rupendehi	27.656106 83.348788	Chinnu prasad Yadav	praatha khati	4	25	14	5 HP Centrifugal
		27.654666 83.350118		Dilip kumar yadav		22.6		
		27.65245 83.353483		Adaalat Muslman		26		
		27.651628 83.351015		Nirmala Chamar		26.5		
		27.650555 83.351015		Ramnarayan Tharu		25		
		27.65103 83.347521		Hemraj Tharu		28.1		
		27.651085 83.376521		Santoshi Chamar		26		
		27.64783 83.347683		Surya prasad Rijal		25.6		

S. N	WUA'S Name and Address	GPs	Chairman	Land Owner	Dia (in)	Depth (m)	No	Pump (hp)
		27.645843 83.346011		Sunran Paal		25.3		
		27.642771 83.346981		Mahesh Yadav		25		
		27.622601 83.33765		Taulan lodha		23		
		27.622601 83.336765		Foujadar Chauhan		14.7		
		27.648746 83.35002		Shijpoojan Bhallaha		26		
		27.6608073 83.355659		Puranbasi Yadav		53		
11	Gansari STW UA Siyari-2 Gansari, Rupendehi	27.540611 83.421608	Baburam Tharu	Baburam Tharu	4	17.4	12	5 HP Centrifugal pump set
		27.541356 83.412448		Ramkishan Chamar		19.7		
		27.541561 83.407961		Shusil kumar Chaudari		32.1		
		27.544060 83.418895		Tameshor Tharu		19.3		
		27.552813 83.420933		Harinarayan Yadav		19.4		
		27.539075 83.422210		UmaShasnkar Uhir		36		
		27.537560 83.415770		Mahendra Bhar		50.4		
		27.534128 83.415841		Dinesh Baniya		55.9		
		27.538743 83.404098		Ramchandra Acharya		55.8		
		27.529436 83.484838		Ayodha Baraee		31		
		27.541765 83.379971		Bishownath Bar		29.3		
		27.547301 83.385925		Ram Bahadur Chaudhary		54.5		
12	Kanchan Sichai Prayojana STW Kanchan- 4, Raupandehi	27.612975 83.261033	Binod Pun	Chandra b Bika	4	4.9	32	5 HP Centrifugal pump set
		27.614685 83.258336		Chhetra B Thapa		5.6		
		27.621045 83.256558		Gun B Shrees		6.5		
		27.621911 83.257421		Bhim B Thapa		5.5		
		27.618196 83.257581		Laxmi Khatri		6		
		27.625366 83.255246		Phulmaya Thapa		5.4		
		27.634903 83.252670		Rana Baarati		6.3		
		27.632760 83.254558		Juna Thapa		3.6		
		27.632730 83.255995		Top bahadur Budathoki		6.3		

S. N	WUA'S Name and Address	GPs	Chairman	Land Owner	Dia (in)	Depth (m)	No	Pump (hp)
		27.633015 83.257178		Sushila Thapa		6.4		
		27.640428 83.254866		Amar B Thapa /Asha devi Thapa		21.1		
		27.652988 83.256386		Dhan Bahadur Pun / Raju Pun		23.8		
		27.632308 83.263068		Deu Kumari Rana Thapa		6.1		
		27.625690 83.262499		Himlal B.k.		7.9		
		27.625240 83.262904		Kasari Pun		6.2		
		27.624306 83.263808		Lila Thapa		7.7		
		27.625153 83.260723		Tulasimaya Rana		6.5		
		27.622928 83.264131		Tum Bahadur Faujamagar		6		
		27.626123 83.267053		Deukala Damai		4.9		
		27.625120 83.265975		Nirmala Budhamagar		6.1		
		27.623708 83.265394		Chowk B Faujaa		7.1		
		27.602608 83.264688		Dil B Thapa		4.5		
		27.622263 83.265963		Prakash Thapa		7.9		
		27.620183 83.265846		Gir B Thapa		6.3		
		27.618991 83.266131		Pabitra Pademagar		7.4		
		27.613313 83.266719		Lalmaya Thapa		7.9		
		27.613286 83.271404		Sikmaya Sunar		5.8		
		27.614334 83.272149		Gyan B Dangal		6.7		
		27.615295 83.272759		Ramesh Thapa		4.8		
		27.617948 83.367828		Prem B Thapa		6.5		
		27.616188 83.272156		Basanti Pun		7.4		
		27.616501 83.271053		Tulasi Kumari Salami		6.4		
		27.504221 83.329920	Ramesh Yadav	Gangotri P Mishra	4	13		5 HP Centrifugal pu
		27.505446 83.330063		Rajaram Lodi		12.1		
		27.506708 83.329951		Shubhawoti Yadav		13.2		

S. N	WUA'S Name and Address	GPs	Chairman	Land Owner	Dia (in)	Depth (m)	No	Pump (hp)
13	Buddha krishak STW WUA Mayadevi 4, Rupendehi	27.504975 83.328801		Ramkishor Mallaha		11.2	25	mp set
		27.503846 83.329198		Sajiban Mallaha		13.2		
		27.501039 83.331259		Akanmoti Lodh		13.5		
		27.498951 83.329548		Rammilan Yadav		13.9		
		27.499129 83.327765		Tulsiram Yadav		11.7		
		27.495825 83.329286		Mangal Lodh		12.1		
		27.494901 83.325476		Yatendra p Sukla		12.8		
		27.497749 83.324198		Shiva kumar Lodh		11.6		
		27.496611 83.326341		Arjun Murau		14.6		
		27.496453 83.327064		Chulae Murau		13.5		
		27.501376 83.322833		Paras Teli Gupta		8.6		
		27.491435 83.320356		Tribhuban Lodh		9.1		
		27.491128 83.318355		Premshankardhar dube		8.3		
		27.489291 83.317796		Pralada Yadav		9.5		
		27.495730 83.316370		Baliram Kahar		11.2		
		27.483200 83.314078		Shivpoojan Lodh		7.9		
		27.482544 83.317198		Chhedi Lodh		10		
		27.485831 83.316679		Kantidevi Lodh		8.7		
		27.497610 83.320425		Nandlal Kohar		11.2		
		27.495440 83.321462		Dasartha Lodh		10.5		
		27.495982 83.322293		Lautan Lodh		13.1		
		27.502989 83.357923		Sudarshan Yadav		11.9		
14	Tilotama STW WUA Tilotatama 14, Rupendehi	27.592871 83.433336	Chakra Prasad Pun	Bed Prasad Neupane	4	23.1	11	3 HP Submersible
		27.592138 83.431483		Sitaram Tiwari		24.5		
		27.590099 83.430763		Hariram Chuadari		25.8		
		27.590573 83.429323		Nar B Khadka		24		
		27.592330 83.429523		Ful Kumari Tharu		33.7		

S. N	WUA'S Name and Address	GPs	Chairman	Land Owner	Dia (in)	Depth (m)	No	Pump (hp)
		27.588250 83.425905		Thamman B Khadka		25.3		
		27.589943 83.426308		Dilaram Gurung		35.5		
		27.591461 83.426915		Dibya kumari Gyawali		22.4		
		27.591790 83.427384		Bannu Tharu		23		
		27.589861 83.427900		Chandrdevi Khadka		26.8		
		27.589161 83.429688		Tara B Bohara		28.7		
15	Kotahimai Powerdrill STW Kotahimai-4 kadamhawa,	27.436494 83.377723	Bhulahi Baniya	Parag Baniya	4	37.5	1	5 dis
16	Samabeshi STW Bardaghat 14 Nawalparasi	27.494564 83.794223	Dhaniram Khanal	Dhaniram Khanal	6	44.9	1	2
17	Gaule STW WUA Bardaghat-13 Lebada, Nawalparasi	27.500135 83.749884	Toynath Chaudhari	Bhuneshowr Tharu	6	41.5	2	3
		27.494203 83.743471		Shyambihari Chaudhari	6	45.5		
18	Durgamata Powerdrill STW WUA Bardaghat-16 Bandebi, Nawalparasi	27.49283 83.83908	Man bahadur kami	Durgamata bandebi mandir	6	37.5	3	2
		27.496711 83.839424		Phonemaya Chauhan magar		41.2		
		27.495 845 83.835543		Premlal Kunwar		41.2		
19	Kotahimai Powerdrill STW Suddodhan-1, Rupendehi	27.656106 83.348788	Chinnu prasad Yadav	praatha khati	4	25	14	5 HP Centrifugal
		27.654666 83.350118		Dilip kumar yadav		22.6		
		27.65245 83.353483		Adaalat Muslman		26		
		27.651628 83.351015		Nirmala Chamar		26.5		
		27.650555 83.351015		Ramnarayan Tharu		25		
		27.65103 83.347521		Hemraj Tharu		28.1		
		27.651085 83.376521		Santoshi Chamar		26		
		27.64783 83.347683		Surya prasad Rijal		25.6		
		27.645843 83.346011		Sunran Paal		25.3		
		27.642771 83.346981		Mahesh Yadav		25		
		27.622601 83.33765		Taulan lodha		23		
		27.622601 83.336765		Foujadar Chauhan		14.7		
		27.648746 83.35002		Shijpoojan Bhallaha		26		

S. N	WUA'S Name and Address	GPs	Chairman	Land Owner	Dia (in)	Depth (m)	No	Pump (hp)
		27.6608073 83.355659		Puranbasi Yadav		53		
20	Gorkhanath STW WUA Palhinandan 2, Nawalparasi	27.439193 83.686631	Anil Kumar Upadhya	Ramkishor Khatika	6	30	4	3 HP Submersible
		27.444278 83.682715		Narhainghdash Patan		25		
		27.444505 83.684501		Udayaraj Mistra		34.5		
		27.442563 83.688266		Nepal Lohar		34.5		
21	Ahirauli STW WUA Ramgram 14 Nawlparasi	27.568076 83.628068	Ramesh Pasi	Harichandra Pasi	4	129	2	5 HP Centrifugal pump set
		27.565955 83.628050		Rampati pasi		129		
22	Kandarmai STW WUA Ramgram 15 Ginaha, Nawalparasi	27.533775 83.600837	Chin B Aarkha	Paltu Bahadur Magar		156	2	
		27.537284 83.610947		Jay Shree yadav		113		
23	Kisan STW WUA Sarawal -7, Nawalparasi	27.420555 83.721366	Shivaraj Harijan	Tulasi Chamar	4	17.3	20	5 HP Centrifugal pump set
		27.433287 83.708123		Aasin Ali Dhobi		17		
		27.433036 83.731011		Tarikun Nesha		15.2		
		27.424183 83.734808		Ram Govinda Babiya		16.8		
		27.427401 83.731701		Irfan Ali Kha		16.3		
		27.413351 83.741051		Ram Lakshman Ahir		17.5		
		27.421956 83.737588		Kamlesh Kohiri		16.6		
		27.432455 83.747508		Rajkumari Harijan		15.1		
		27.421656 83.744767		Rambali kebat		17.7		
		27.426108 83.746048		Madan pr kebat		16.7		
		27.425865 83.750896		Mohan Pasi		16.8		
		27.421156 83.757486		Jokhu Kebat		12.5		
		27.426906 83.749578		Harilal Chamar		15.8		
		27.427446 83.751756		Dasharath Chamar		15.2		
		27.428158 83.751668		Nanda kumar Chamar		16.5		
		27.426550 83.752953		Laxmi Devi pandey		12.4		
		27.428000 83.753756		Charanman BelDar		10.8		
		27.428356 83.747928		Raju prasad Harijan		16.9		

S. N	WUA'S Name and Address	GPs	Chairman	Land Owner	Dia (in)	Depth (m)	No	Pump (hp)
		27.432266 83.758136		Sudaama Bhar		12.4		
		27.433050 83.756263		Chandraman Harijan		11.6		
24	Kundiya STW UA Susta-3 Kundiya, Nawalparasi	27.444917 83.885655	Bam Bahadur magar	Bam Bahadur magar	4	10.6	9	5 HP Centrifugal pump set
		27.452598 83.835416		Chandra kumari Tharu		11.1		
		27.460535 83.839642		Baliram Saithabar		14		
		27.456871 83.845605		Sudama Dusad		10		
		27.451126 83.852211		Tul bahadur Gaha		9.5		
		27.444769 83.855617		Dhanmati loniya		9.3		
		27.445133 83.854921		Ram Kunwar Bhedihar		8.9		
		27.442470 83.858130		Binod Kushwaha		7.3		
		27.448811 83.875872		Shiva Prasad Mahato		11.2		
25	Pakalihawa STW WUA Susta-5 Pakalihawa, Nawalparasi	27.396198 83.844776	Durga Prasad Kalwar	Rajaram loniya	4	8.3	9	5 HP Centrifugal pump set
		27.380928 83.848677		ganesh kurmi		10.7		
		27.379026 83.849971		Bairistr loniya		12.2		
		27.364902 83.845918		Durga prasad kalwar		8.6		
		27.371915 83.848265		Ramaggya Baniya		7.6		
		27.362619 83.836593		Ramsewak Kurmi		12.6		
		27.366509 83.835519		Shreeniwas kurmi		10.1		
		27.376951 83.831540		Ran Bahadur Sarumagar		9.2		
		27.386531 83.820584		Lilawati Devi Ahir		16.8		
26	STW WUA Partapur 9, Nawalparasi	27.463262 83.798400	Dhan B Chaudhari	Dhan B Chaudhari	4	18.2	24	5 HP Centrifugal pump set
		27.461590 83.800021		Nim Narayan Chaudari		12.3		
		27.460188 83.799209		Shivalal Chaudari		16.8		
		27.456908 83.797419		Shanti Devi Chaudari		14.5		
		27.452797 83.795203		Shankar Kohiri		14.4		
		27.460919 83.803622		Jay Kisun Chaudari		16.6		
		27.462764 83.808379		Shree Ram Yadav		11		

S. N	WUA'S Name and Address	GPs	Chairman	Land Owner	Dia (in)	Depth (m)	No	Pump (hp)
		27.462899 83.810565		Rmakant Gupta		19.5		
		27.461848 83.810700		Sarup Gupta		16		
		27.467640 83.80581		DasBahadur Chaurdari		12		
		27.468710 83.804122		Maina Debi Yadab		12.5		
		27.456872 83.511088		Devi P Yadav		16.6		
		27.452481 83.810314		Radhadevi Chaudari		11.3		
		27.452984 83.808922		Nandalal Kohiri		10.9		
		27.462027 83.814197		Khila P. Chaudari		19.8		
		27.464733 83.81464		Neta B Chaudari		16.7		
		27.469203 83.814475		Shyam babu Chuadari		13.9		
		27.470720 83.814273		Khemnarayan Chudari		15.23		
		27.476280 83.816217		Gangiya Devi Tharuni		13.9		
		27.473265 83.821436		Chatraman Chaudari		14.4		
		27.468514 83.820421		Anita Kumari Chaudari		16		
		27.464094 83.818892		Santosh Kamkar		10.3		
		27.461792 83.820290		Raj Kumar Barahi		10.3		
		27.461406 83.82525		Dhan Bahadur Chaudari		15.6		
27	Sigaha STW WUA Susta 1 Sigaha, Nawalparasi	27.478670 83.827571	janardan Chudari	Prem Narayan Tharu	4	14.6	25	5 HP Centrifugal pump set
		27.472316 83.826495		Devi P Panjiyar		15.4		
		27.472019 83.824338		Padam Narayan Panjiyar		11.1		
		27.470230 83.826708		Taradevi Tharuni		13.8		
		27.470873 83.828806		Min kumari Chaudari		10.6		
		27.472116 83.828344		Baburam Panjiyar		13.1		
		27.474906 83.827543		Ganesh P Chaudari		16.6		
		27.475721 83.828356		Hom Narayan Tharu		15.4		
		27.473685 83.828825		Mangal P Tharu		13.4		
		27.474981 83.83027		Pasupati panjiyar		13.2		

S. N	WUA'S Name and Address	GPs	Chairman	Land Owner	Dia (in)	Depth (m)	No	Pump (hp)
		27.476180 83.830770		janardan Chudari		14.9		
		27.476651 83.832026		Lalman P Tharu		14.5		
		27.477708 83.833016		Keshab Bhandari		16.1		
		27.478695 83.831901		Dilliram Tharu		13.3		
		27.480946 83.832836		Harendra P Mukhiya		12.05		
		27.480588 83.831190		Chatraman P Mahatoo		10.7		
		27.482468 83.831453		Likharam Gurau		13.3		
		27.467789 83.837724		Harilal Gupta		12.5		
		27.480075 83.829578		Jitendra Kumar Tharu		15.3		
		27.478616 83.824750		Ramkrisna Aryal		13.1		
		27.483071 83.836086		Devnarayan Chaudari		15.2		
		27.480521 83.828348		Pasupatinath Chaudari		19		
		27.480719 83.835674		Nar B Tharu		14.7		
		27.475025 83.844775		Babulal Tharu		13.4		
		27.481913 83.835696		Hom Narayan Chaudari		21.2		
28	Barpipal STW Tubewell UA Bardaghat 12/13, Nawalparasi	27.496446 83.769468	Krishan Prasad Poudel	Yan B kshetri	4	14.2	37	2 HP Electric Monoplog
		27.497103 83772038		Tul Bahadur Rana		18.4		
		27.497381 83.769675		Harka bahadur Lungeli magar		15.7		
		27.499013 83.771644		Muktiram Timalsina		16.95		
		27.502058 83.770486		Ruk bahadur Marasisji		17.4		
		27.499664 83.767643		Buddhi P Shrestha		16.3		
		27.496673 83.767704		Jibnath Poudel		15.8		
		27.498063 83.767678		Teklal Dhakal		16.9		
		27.497803 83.763095		Chandra B Thapa		17.4		
		27.499786 83.764528		Krishna Bahadur Chaudari		15.5		
		27.500061 83.763628		yamkala Kunwar		15		

S. N	WUA'S Name and Address	GPs	Chairman	Land Owner	Dia (in)	Depth (m)	No	Pump (hp)
		27.500688 83.761431		Diwakar Pandel		15.7		
		27.501868 83.759768		Puspa Pariyar		15.4		
		27.504741 83.756038		Sita Poudel		15.65		
		27.500784 83.756750		Mani Thapa		16.5		
		27.499958 83.762426		Hira Gautam		15.8		
		27.497546 83.761185		Shreeram Devkota		17.1		
		27.498091 83.759841		Thaman Magar		16.7		
		27.497139 83.755950		Surya Prasad Pathak		18.7		
		27.494665 83.758911		Rupadevi Malla		15.6		
		27.496386 83.764938		Balkrishan Devkota		18.7		
		27.492594 83.762898		Rabilal Kafla		15.85		
		27.490981 83.761893		Ghanshyam Bhattarai		15.6		
		27.491271 83.760946		Tikaram Pandey		15.7		
		27.489501 83.760070		Narayan Kafla		15.8		
		27.488168 83.760265		Tejulal Neupane		15.75		
		27.484955 83.772078		Prem Karki		18.3		
		27.485254 83.770711		Upakar Kshetri		17.2		
		27.485509 83.769618		Lok B. Sarki		18.7		
		27.498691 83.765701		Kanta Kumari Rana		14.7		
		27.507160 8.3746771		Anirudra Chaudari		18		
		27.512708 83.748228		Liladevi Chaudari		18.2		
		27.504971 83.752716		Ramchandra Chaudari		17.95		
		27.504565 83.740951		Shivanath Chamar		18.2		
		27.501588 83.738966		Ayodha Chudari		17.4		
		27.500266 83.741621		Kishun Dulari		17.8		
		27.502085 83.739771		Aashik Ali		17.7		
29	Bohafat Krishi Sahakari STW WUA Chaatrakota 4 Agaha, Gulmi	27.956111 83.381559	Bhupal Gyawali	Madhav Shrestha	6	53	3	3
		27.959082 83.375484		Gyan prasad Shrestha		47.3		

S. N	WUA'S Name and Address	GPs	Chairman	Land Owner	Dia (in)	Depth (m)	No	Pump (hp)
		27.95983 83.374447		Megharaj Pantha		53.8		
30	Barabise power drill STW Tansen -9, Palpa	27.818871 83.573781	Damodar Adhikari	Nura Kumari Bhattarai	6	47.5	2	3
		27.829614 83.563665		Damodar Adhikari		52.5		
31	Khiluphata STW Raija Devi Chhahara-1, Palpa	27.958996 83.374027	Khum Bhahadur Kumal	Tulasi Kumal	6	48	1	2
						Total Number of STW	**269**	

अनुसूची- १०: आ.व. २०८१/८२ मा निर्माण सम्पन्न स्यालो ट्यूववेल योजनाहरु

SN	WUA'S Name & Address	GPs	Chairman	Land Owner	Depth (m)	Screen (m)	STW No.	Pump (H.P)	Remark
1	Harit Jitwapur Lu.Sa.Na.Pa. 11 Jitwapur Rupandehi	27.566944 83.30037	Bikram Lodha	Shova devi Lodha	161	6	1	5 Die.	4" PD
2	Marchawar Lagansil STW Kotahimai-4, Kadmahawa Rupandehi	27.432322 83.386168	Sonmati Kurmi	Sonmati Kurmi	88	3	1		
3	Laharepipaltol Jharabaira STW Sainamaina-4, Rupandehi	27.677527 83.34576	Jibnath Gyawoli	Jibnath Gyawoli	61.5	9	2	3 HP Sub	6" PD
		27.679125 83.34752		Dandapani Khanal	59	9			
4	Chilhiya STW Siyari-5, Chhapiya Rupandehi	27.578042 83.359049	Nabaraj Aryal	Dhanakala Pandey	58	6	1	3 Ele	6" PD
5	Ramjanaki Kirshak STW WUA Lu. Sa. Na.Pa. 4 Manaura Rupandehi	27.471365 83.236674	Tilakram Teli	Ghitsu Teli	104	4	1		4" PD
6	Bhalukholta STW WUA Sainamaina -9, Bhalukholta Rupendehi	27.711936 83.284665	Padam Bahadur Rana	Padam Bahadur Rana	75	4	1	2 HP Sub	
7	Dhaulagiri STW WUA Kanchan-1, Sundarnagar Rupandehi	27.675915 83.283508	Tikanidhi Poudel	Tikanidhi Poudel	59	5	1	3 HP Submersible	6"
8	Adhunik Kirshi STW WUA Devdaha-10, Charange Rupandehi	27.673727 83.504481	Umanath Sharma	Umanath Sharma	48	7	1	3 HP Submersible	6" DTH
9	Khakanpur STW WUA Sainamaina-2, Khakanpur Rupandehi	27.687603 83.349384	Ramlal Tharu	Lal Bahadur Uchai	38	8	1	3 HP Submersible	
10	Hariyali Kirshak Samuha Devdaha-5, Khaireni Rupandehi	27.654678 83.60187	Shankar Bahadur Chanda	Durga Bohara Chanda	42	8	1	3 HP Submersible	
11	Powerdrill Jhulenipur Syalo Tubewell Tilotama-8 Jhulenipur, Rupendehi	27.626998 83.499668	Krishna prasad Sharma Chapagain	Krishna prasad Sharma Chapagain	46	6	1	3	6"

SN	WUA'S Name & Address	GPs	Chairman	Land Owner	Depth (m)	Screen (m)	STW No.	Pump (H.P)	Remark
12	Kotahimai STW WUA Ramgram-10, Nadawatol Nawalparasi	27.526144 83.641301	Gobinda Prd. Kewat	Asmita Malla	130	3	1	5 HP. Submersible	6/4”
13	Parsawal STW WUA Ramgram-14, Amraut Nawalparasi	27.5704503 83.619783	Ramesh Pasi	Krishna Prasad Kuwar	99	6	1	5 HP. Submersible	6”
14	Hakui Bhumigat TW WUA Ramgram-16, Hakui Nawalparasi	27.510269 83.62025	Baliram Yadav	Pamuli Ahir	155	5	1	2 HP Electric Monoblock	4”
15	Pargatisil STW WUA Bardhaghat-13, Salgharitol Nawalparasi	27.48434 83.753001	Ganapati Sapkota	Bhagatsingh Rana	40	4	1	3 HP Submersible	6”
16	Misrauligau STW WUA Sunuwol-11, Misrauli Nawalparasi	27.586491 83.721551	Indramani Kadel	Dhurba Raj Poudel	99	5	1	3 HP Submersible	6”
17	Piparpati STW WUA Pratappur-8, Piparpati Area Nawalparasi	27.426223 83.810888	Ram Prasad Bhediha r	Dal Singar Koiri	10.45	3	8	5 HP Centrifugal Diesel Pumpset	
		27.431359 83.807919		Prem Kumari Chaudhary	17.95	3			
		27.405832 83.80683		Ansu Kumari Tripathi	11.5	3			
		27.427454 83.817548		Sarbajit Ahir	11.8	3			
		27.432804 83.821964		Nasuridin Hajam	13.85	3			
		27.43744 83.837856		Manikala Khawal	8.75	3			
		27.420928 83.824938		Motilal Teli	10.1	3			
		27.42328 83.82005		Sunil Kumar Bhedihar	15.8	3			
18	Narsahi STW WUA Susta -4, Narsahi Nawalparasi	27.413751 83.83599	Ram Naresh Chamar	Mainawati Devi Chaudhary	13.25	3	8	5 HP Diesel	
		27.413168 83.837521		Laxmi Niya Kewat	13.85	3			
		27.41516 83.839086		Ram Naresh Chamar	11.75	3			
		27.418675 83.856331		Jatan Koiri	11.1	3			

SN	WUA'S Name & Address	GPs	Chairman	Land Owner	Depth (m)	Screen (m)	STW No.	Pump (H.P)	Remark
		27.433368 83.854553		Ishwor Baniya	8.65	3			
		27.418243 83.847684		Til Bahadur Thapa	9.95	3			
		27.430836 83.852567		Lokman Khawal	11.45	3			
		27.415837 83.845498		Surya Ghale	9.4	3			
19	Daunne STW WUA Palhinandan-5, Nawalparasi	27.462211 83.661306	Santosh Baniya	Machhi Koiri	21.55	3	13		4" Sludge
		27.473881 83.653221		Tuffani Gaddhi	18.6	3			
		27.467461 83.646116		Kamaladevi Harijan	20.4	3			
		27.467389 83.646601		Tribeni Harijan	20.75	3			
		27.459395 83.654355		Santosh Baniya	21.55	3			
		27.456959 83.657925		Rajesh Gupta	21.5	3			
		27.458761 83.661974		Samsula Ansari	21.5	3			
		27.450646 83.661578		Shekhasahabuddin	21.9	3			
		27.448144 83.664349		Birendra Gupta	21.3	3			
		27.448979 83.664129		Prem Sagar Kurmi	21.1	3			
		27.453409 83.655543		Bayasmuni Kahar	21.6	3			
		27.454185 83.652153		Om Prakash Gupta	21.25	3			
		27.456646 83.649608		Mohamad Raja	24.8	3			
		27.458984 83.642063		Tabasum Nisa	24.6	3			
20	Simalchaur Sistung STW WUA Dhurkot 5-6, Gulmi	28.119227 83.188506	Meghanath Aryal	Keshab Ghartimagar	42	7	3	2	6" DTH
		28.119519 83.189591		Yubaraj Pandey	42	7		2	
		28.1201112 83.191443		Rabindra Ghimire	42	7		2	
21	Pargatitol WUA Tansen -9, Palpa	27.830595 83.559013	Dasaratha Pandey	Bed Prasad Adhikari	54	6	1	2	
22	Simalgaira STW WUA Bagnaskali 2 Thatiya, Palpa	27.83603 83.586879	Bed Prasad Neupane	Bhogimaya Aale	48	6	1	2	
23	Pokharathok Madi STW WUA	27.859376 83.548824	Rajendra Bdr. Rana	Bel Kumari Bashyal	48	6	2	2	

SN	WUA'S Name & Address	GPs	Chair man	Land Owner	Depth (m)	Screen (m)	STW No.	Pump (H.P)	Remark
	Bagnaskali 2 Lalpati, Palpa	27.825922 83.595359		Motilal Kuwar	48	6		2	
	Total Numer of STW						53		

अनुसूची — ११: निर्माणनधिन डिप ट्युबवेल योजनाहरुको विवरण (क्रमागत)

क्र. सं.	योजनाको नाम (ज.उ.स.को नाम)	GPSS	अध्यक्षको नाम, सम्पर्क नं.	हालसम्म सम्पन्न कार्य			हालसम्मको खर्च	हालको अबस्था	बाँकी गर्नु पर्ने कार्य
				DTW निर्माण	पम्प घर /पम्प जडान/बिधुतिकरण	uPVC निर्माण			
१	जोकवार र सनहहीको बीचमा पिपरीया निर वाड नं. ४ डिप ट्युव वेल सिंचाइ प्रणाली (रामग्राम ज.उ.स. रामग्राम ९)	२७ २९'५०" ८३ ३९'१९"	प्रदिप कु. चौधरी 9857045922	DD-270, LD-213, H-48, S-12 (151-154,176-179,194-197, 201-204, 1mm, ss) (2077/78) 1998489.75	15 HP, 4" CP-42m ,19 pole, 25 KVA (सम्झौता रकम ३२३९२१६.७ ठेक्का नः १०/०७९/८० (ELE+PH) 2375740	209 m 6" uPVC,2 outlets (2082/83) 395703	४७६९९३ ३	पानी सञ्चालन भएको	पाइप लाइन निर्माण (१५००)
२	सुनवल डिप ट्यूववेल सिंचाइ योजना (देवदह ज.उ.स. सुनवल ७ तरगौली)	२७.६५६३, ८३.५८६९	शिवलाल ढकाल 9800709047	DD-171m,LD-144.5m,S-14(62-68,120-125,129-132m) MS (WS 8"), Q=16.5LPS,SWL-14.15,DWL-18.67m	20 HP, 5" Cl-42m, 25 KVA Trans, 12.5 HP, 4" Col, 42v low,		6912148.73	पानी सञ्चालन भएको	पाइप लाइन (१५००)
३	विजयपुर डिप ट्यूववेल सिंचाइ, उप-आयोजना बर्दघाट ११(विजयपुर ज.उ.स.)	२७.५५६२९४, ८३.७५३८८	यम छेत्री 9847057078	DD-170, LD-167, H-48, S-18(129-132, 141-147, 152-161) (76/77)	5 HP, 3" 15 Col., 25 KVA Trans., पानी कम भएर ठेक्का तोडेको र २० HP पम्प फेरी ५ HP जडान		४३९८०४ ३		नयाँ वेल (Redrill)
४	कोटस्थान डिप ट्युवबेल सिंयो, सरावल ४ (कोटस्थान ज.उ.स, सरावल ४ हात्तीवन)	२७.४९४७६११, ८३.७२७७०५	मनोज पाण्डे ९८२६४३६३२४	DD-172m, LD- 172m, H-48m, Screen-(147-150), (152-155), (160-166)m Q-22lps	15 HP, 4" CP-42m ,19 pole, 25 KVA ,		4038623	पानी सञ्चालन भएकोमा ट्रान्सफरमर चोरी	पाइप लाइन (१५००)+ट्रान्सफर्मरर
५	जय समईमाई डिप ट्यूववेल, गैडहवा ३ वर्गदहा (समईमाई ज.उ.स.)	२७.५४०५५५, ८३.२७१३८८	तुलसी हरिजन ९८१४४१४६५० ९७०८५२१०६४	DD-150, LD-150, H-48, S-12(108-111, 132-135, 138-144, 1mm SS, SWL-0m, Q-16 lps, ddr.-15.33	६/७९/८०(ELE+PH) १५ hp, ४" 39m- cp	260 m 6" uPVC,2 outlets	३८९७९९०	पानी सञ्चालन भएको	पाइप लाइन (१५००)
६	लुम्बिनि हरियाली डिप ट्युबवेल लु.स.न.पा. ११ महदेवा रुपन्देही (लुम्बिनी हरियाली कृषक जउस)	२७.४९५२, ८३.२३०५	सहिद्धुन निसा ९८२४४९०७०५.	DD-150, LD-१५०, H-48, S-15(९८-१०७, १४०-१४६ 1mm SS, SWL-11.4m, Q-१८ lps, ddr.-25.15 m	PH,७.५ hp पम्प, ३" कोलम पाईप, २५ KVA ट्रान्सफर्मर	1582 m 4" uPVC, 16 outlets	४२०९८९१	पानी सञ्चालन भएको	थप पाइप लाइन (३००)

क्र. सं.	योजनाको नाम (ज.उ.स.को नाम)	GPSS	अध्यक्षको नाम, सम्पर्क नं.	हालसम्म सम्पन्न कार्य			हालसम्मको खर्च	हालको अबस्था	बाँकी गर्नु पर्ने कार्य
				DTW निर्माण	पम्प घर /पम्प जडान/बिधुतिकरण	uPVC निर्माण			
७	हनुमान डिप ट्युववेल सिँचाइ योजना, कन्चन ३ (हनुमान ज.उ.स,)	२७.५९५०५, ८३.२४३६३	अर्जुन ढकाल ९८६७७९४२६७	DD-149m, LD-136m, H-48m SP-(63-69, 95-101, 124-130)m=18m	Ph,21 pole २५ KVA T/F 20 hp,4" 42m-cp	१०८७+२५० m upvc 6", १२ OV	6522746	पानी सञ्चालन भएको	थप पाइप लाइन (२००)
८	शांतिटोल डिप ट्युबवेल योजना, कन्चन ५ रुद्रपुर रुपन्देही (शान्तिटोल ज.उ.स)	२७.६३५६ ८३.२३४	टिकाराम ढकाल ९८४६९३०७०९	DD-१५०m, LD-११७m, H-४८m SP-(६०-६३, 75-८१, ९२-९५, १०८-१११)m=15m	५/७९/८०(ELE+PH) २५ KVA 15 hp, 4" 30m cp	१०८५+२५० मि./१२+२ OV	5632422	पानी सञ्चालन भएको	थप पाइप लाइन (३००)
९	ब्रम्पुरा (सुनौलो बिहानी) डिप ट्युववेल सिँचाइ प्रणाली रामग्राम-९, नवल्परासि (सुनौलो बिहानी ज.उ.स)	२७.५०५४६, ८३.५५९३४	जगदिश चौधरी ९८०७४३२२१०	DD-२३०m, LD-२२८m, H-४८m SP-(८९.५०८२.५, ११६-१२२, २१३-२१६,)m=१२m, Q-१६.०६ lps,	ठेक्का नं.. ७/०८०/८१(ELE+PH); १२.५ hp पम्प, 4 इन्च ३६ मि. कोलम पाईप, २५ KVA ट्रान्सफर्मर 12.5 HP New Pump	422 m 6" uPVC, 4outlets		पानी सञ्चालन भएको	थप पाइप लाइन (१५००)
१०	जय मा दुर्गा डिप ट्युववेल सिँचाइ प्रणाली रामग्राम-१७, नवलपरासी (जय माँ दुर्गा ज.उ.स)	२७.५१६८८ ८३.७०१३५३	गिरीधारी प्रसाद कोहार ९८४४७३३८०४ अर्जुन चौधरी ९८५७०४५५४०	DD-२००m, LD-१८९m, H-४८m SP-(१३१-१३४, १४१-१४४, १५२-१५५, १७४-१७७)m=१२m, Q-१५ lps,	ठेक्का नं.. ६/०८०/८१(ELE+PH); खर्च ९८४०२७; १२.५ hp पम्प, 4 इन्च ४५ मि. कोलम पाईप, २५ KVA ट्रान्सफर्मर	३५६+४३१ m/४+४ (6" uPVC)	५०२१३६८	पानी सञ्चालन भएको	थप पाइप लाइन (८००)
११	गंगा पृथिवी ट्युववेल सिँचाइ प्रणाली बर्दघाट-१४, नवलपरासी (गंगा पृथिवी ज.उ.स.)	२७.४९४३९ ८३.७९९६८	शालिकराम पाण्डे ९८४७२५६४६२	DD-१७०m, LD-१५५m, H-४२m SP-(४४-५३ १३६-१३९, १४६-१४९)m=१५m, Q-१५ lps	ठेक्का नं.. ३/०८०/८१(ELE+PH); १० HP पम्प, 4 इन्च ३६ मि. कोलम पाईप, २५ KVA ट्रान्सफर्मर	३७०+४०१ /४+४ (6" uPVC)	५१९१५१८	पानी सञ्चालन भएको	थप पाइप लाइन (८००)
१२	सानो गैडहवा डिप ट्युववेल सिँचाइ प्रणाली गैडहवा-३, रुपन्देही (सानो गैडहवा ज.उ.स)	२७.५९६०६ ८३.२६५५३	सुरेन्द्र कोहार 9821921898	DD-१४५m, LD-१३५m, H-४८m SP-(६९-७२ १०६-१०९ १२०-१२६)m=१२m, Q-१२.५ lps,	१० hp पम्प, 4 इन्च ३६ मि. कोलम पाईप, २५ KVA	४८८+४६२ /५+६ (6" uPVC)	५४१६७०४	पानी सञ्चालन भएको	थप पाइप लाइन (८००)

क्र. सं.	योजनाको नाम (ज.उ.स.को नाम)	GPSS	अध्यक्षको नाम, सम्पर्क नं.	हालसम्म सम्पन्न कार्य			हालसम्मको खर्च	हालको अबस्था	बाँकी गर्नु पर्ने कार्य
				DTW निर्माण	पम्प घर /पम्प जडान/बिधुतिकरण	uPVC निर्माण			
१३	शान्ति डिप ट्युवबेल सिँचाइ प्रणाली गैडहवा-७, रुपन्देही (शान्ति ज.उ.स.)	२७.५९०२१ ९/८३.२९३	विजय थारु ९८५८३२००४०	DD-१५०m, LD-१४९m, H-४८m SP-(११३-११९, १२१-१२४, १३७-१४३)m=१२m, Q-२४ lps,	ठेक्का नं.. १६/०८०/८१(ELE+PH); 15 HP पम्प, 4 इन्च ३६ मि. कोलम पाईप, २५ KVA ट्रान्सफर्मर	722 m 6" uPVC, 7 outlets	४२४३७९२	पानी सञ्चालन भएको	थप पाइप लाइन (१०००)
१४	मोतिबस्ती डिप ट्युवबेल सिँचाइ प्रणाली बर्दघात-१, नवलपरासी (मोतिवस्ती ज.उ.स)	२७.५१४१५ ५/८३.७८५	रेम राना ९८४७०८०००५	DD-१८०m, LD-१७८m, H-४८m SP-(१२८-१३१, १४१-१४४, १५०-१५३, १६२-१७१)m=१२m, Q-१७ lps	१२.५ hp पम्प, 4 इन्च 45 मि. कोलम पाईप, २५ KVA ट्रान्सफर्मर	829.9 m 6" uPVC, 8 outlets	५०९२४९१	पानी सञ्चालन भएको	थप पाइप लाइन (१०००)
१५	रानीबारी प्रगती टोल डिप वोरीङ्ग, बुटवल १९ (प्रगतीनगर ज.उ.स)	२७.६४९४८ १,८३.४२००	राम वस्ती ९८५७०२७५२७	DD-110,LD-108,SP(54-60,72-75,81-87,96-99=18)MS Slotted,SWL-22.2m,DWL-25.32m,Q-24.5LPS , 8"	PH+ELE(05/2082/83), 6 pole, २५ KVA ट्रान्सफर्मर 20hp,4",42m-cp		4275854	पानी सञ्चालन भएको	थप पाइप लाइन (१५००)
१६	बुटवल उ.म.न.पा. मोटीसर १ रानीगञ्ज, डिप ट्युवबेल सिँचाइ (रानिगण्ज ज.उ.स बुटवल १७)	२७.६७२८३, ८३.४४३७७	भिम लाल शर्मा ९८४७२९२२८५	DD-118,LD-104,SP(52-55,68-74,91.5-97.5,=15)SS,SWL-35.90m,DWL-39.8m,Q-12LPS,10/6", Housing=48m	ट्यूवबेल मात्र निर्माण भएको जग्गा विवादले गर्दा थप कार्य नभएको ।		1648310		सबै बाँकी
१७	कृषि सिंचाइ योजना, बर्दघाट-११, नवलपरासी (कृषि सिँचाइ ज.उ.स)	२७.५३०२८, ८३.७५३७५	टेकनारायण चौधरी ९८४७४८२८१८	ठे.न. २५/2079/80 अन्तर्गत निर्माण सम्झौता भएको, हालसम्म निर्माण सम्पन्न नभएको ।					
१८	रुपौलिया डिप ट्युब वेल सिंचाइ योजना, सुस्ता-१, नवलपरासी (रुपौलिया डिप ट्युवबेल जउस)	२७.४८३६२ ८,८३.८४३८	हंसराज क्षेत्री ९८२१४४४३४७	DD-117,LD-86,SP(37-40,53.5-56.5,67-76=15m)SS, SWL-5.5m,DWL-8.36m,Q-28LPS, 10/6",Housing=36.5m	पम्प घर निर्माण कार्य ठेक्कामा रहेको		1913046		घर बाहेक सबै
१९	कुमारगड्डी डिप ट्युबवेल सिं. यो., सैनामैना-९, रुपन्देही (कुमारगड्डी डिप ट्युवबेल जउस)	27.704465, 83.278078	भिष्म प्रताप अर्याल ९८४६९२९७३८	DD-137, LD-124, SP(52-55,91-102,105-111=18m)MS Slotted,SWL-11.03m, DWL-14.66m, Q-22LPS , 8"					सबै

क्र. सं.	योजनाको नाम (ज.उ.स.को नाम)	GPSS	अध्यक्षको नाम, सम्पर्क नं.	हालसम्म सम्पन्न कार्य			हालसम्मको खर्च	हालको अबस्था	बाँकी गर्नु पर्ने कार्य
				DTW निर्माण	पम्प घर /पम्प जडान/बिधुतिकरण	uPVC निर्माण			
२०	रामग्राम डिप ट्युबवेल सिं. यो., रामग्राम-१४, नवलपरासी (रामग्राम डिप ट्युववेल जउस)	२७.५४९८२, ८३.६४८१७	नेत्र चौधरी ९८०४४८२९८९	DD-240, LD-236, SP(92-95, 211-220m=12m)MS Slotted,SWL-15.8m, DWL-21.09m, Q-13LPS , 8"	PH+ELE(04/2082/83) 8 pole,25 Kva 10hp,4",39m-cp		4586898		वितरण प्रणाली (१५००)
२१	लघुनाहा डिप ट्युबवेल सिँचाइ प्रणाली बर्दघाट ३ नवलपरासी (लघुनाह डिप ट्युबवेल जउस)	२७.५२९१५, ८३.७३२२९	राम प्रसाद न्यौपाने ९८५७०८०७५०	DD-168, LD-165, SP (124-127,131-136,141-150,154-158=21m) MS Slotted, SWL-19m, DWL-23m, Q-18 LPS , 8"	पम्प घर मात्र निर्माण भएको		2713359		घर बाहेक सबै
२२	न्यु सृजलशिल युवा क्लब डिप ट्युबवेल सिं. यो., बर्दघाट-६, नवलपरासी (न्यु सृजलशिल युवा क्लब डिप ट्युबवेल जउस)	२७.५२९४८, ८३.७८२५७१	राम किसन चौधरी ९८४७०३३५०९	DD-161, LD-161, SP(126--129, 134-139, 146-152=14m)MS Slotted, SWL-20.18m, DWL-21.32m, Q-14 LPS , 8"	PH+Pump(04/2082/83),12.5Hp, 4" 36m-CP (पानी चलाउन विद्युत्को काम बाकि)		3856072		बिद्युत+वितरण प्रणाली
२३	तिलौली डिप वोरिङ्ग सरावल गा. पा. -२ नवलपरासी पश्चिम (तिलौली डिप ट्युववेल जउस)	२७.५३२८०४, ८३.७२२०२	रघुनाथ राय ९८४७२२९१६२ ९८१८०६२७८५	DD-180, LD-175, SP(131-134, 137-145, 165-172=18m)MS Slotted, SWL-16m, DWL-18.45m, Q-17 LPS , 8"	PH+Pump(03/2082/83),12.5Hp, 4" 36m-CP (पानी चलाउन विद्युत्को काम बाकि)		3254118		बिद्युत+वितरण प्रणाली
२४	बाँसा डिप वोरिङ्ग सरावल -१ नवलपरासी (बाँसा डिप ट्युबवेल जउस)	२७.५७०२४, ८३.७१९५४	भोला चौधरी ९८४७१२६०६८	DD-230, LD-229, SP(171-174, 207-216=12m)MS Slotted, SWL-25.47m, DWL-53.01m, Q-13.5 LPS , 8"	PH+Pump(03/2082/83),12.5Hp, 4" 36m-CP		4416018		बिद्युत+वितरण प्रणाली
२५	मुखिया टोल बङ्गाली डिप ट्युबवेल सिं. यो., देवदह-८, रुपन्देही (मुखिया टोल बँगाली डिप ट्युबवेल जउस)	२७.६३७१७, ८३.५६४७३	निलध्वज मल्ल ९८४७३१७६८९	DD-120, LD-107, SP(55.5-58.5, 78.5-83.5,91-94=11m)MS Slotted, SWL-9.5m, DWL-12.17m, Q-12 LPS , 8"	PH+ELE(05/2082/83), 6 pole, २५ KVA ट्रान्सफर्मर 15hp,4",39m-cp		4355023	पानी सञ्चालन भएको	पाइप लाइन (१५००)

क्र. सं.	योजनाको नाम (ज.उ.स.को नाम)	GPSS	अध्यक्षको नाम, सम्पर्क नं.	हालसम्म सम्पन्न कार्य			हालसम्मको खर्च	हालको अबस्था	बाँकी गर्नु पर्ने कार्य
				DTW निर्माण	पम्प घर /पम्प जडान/बिधुतिकरण	uPVC निर्माण			
२६	मदनपोखरा डिप ट्युबवेल सिं. यो., ता.न.पा., पाल्पा (मदनपोखरा डिप ट्युबवेल जउस)	२७.४९२९, ८३.३२५२	दिनेश गौतम ९८५७०२०५००	LD-84, Screen=15m,MS Slotted, SWL-9.1m, DWL-24.15m, Q-6 LPS , 8/6", Housing 55m (DTH Method)	PH (2.15*2.15*2.2m), RVT (4.8*3.2*1.75m), Pump (5 HP, 3PH, 2" 48m-GI Column Pipe)	HDpE pipeline (300m 63mm),		पानी सञ्चालन भएको	
२७	माझा डिप ट्युबवेल सिं.यो, तानसेन-९, पाल्पा (माझा डिप ट्युबवेल जउस)	२७.८२३१९, ८३.५७०८२	लोकनाथ घिमिरे ९८४७१०१९८२	DD-91, LD-84, SP(54-60,66-78=18m),MS Slotted, SWL-9.4m, DWL-31.5m, Q-12.5 LPS , 8",	PH (2.44*2.44*2.85m), RVT(4.8*3.6*1.5),), Pump(10 HP, 3" 45m-GI Column Pipe) C.n.12/2082/83	HDpE pipeline (280m, 90mm)	3393239	पानी सञ्चालन भएको	
२८	माडी थटिया डिप ट्युबवेल सिं.यो, बगनासकाली-२, पाल्पा (माडी थटिया डिप ट्युबवेल जउस)	२७.८३२६८, ८३.५८५००	भरत प्रसाद न्यौपाने ९८५७०६०६२४	DD-88, LD-88, SP(66-81=15m),MS Slotted, SWL-7.27m, DWL-37.76m, Q-8.5 LPS , 8".	पम्प घर तथा विद्युतिकरण कार्य ठेक्कामा रहेको		2263647		पम्प+ पाइप लाइन (१५००)
२९	अर्गली डिप बोरिङ सिँचाई योजना, तानसेन १४, पाल्पा (अर्गली डिप ट्युवबेल जउस)	२७.९१६०२, ८३.४५१००	कपिल पाण्डे ९८४१३५१५२४	LD-120, Screen=24m,MS Slotted, SWL-64m, DWL-70m, Q-6 LPS , 8", (DTH)			1123288		सबै
३०	कुन्सेरे डिप ट्युबवेल सिं. यो, तानसेन-७, पाल्पा (कुन्सेरे डिप ट्युवबेल जउस)	२७.८३४८६, ८३.५६४०३	जगन्नाथ ढकाल ९८४४७५६३५४	LD-108, Screen=24m,MS Slotted, SWL-4.67m, DWL-8.12m, Q-2.5 LPS , 8", (DTH Method)			1106249		सबै
३१	सभद्रा डिप ट्युबवेल सिं. यो, सैनामैना ३ (गंगानगर ज.उ.स.)	२७.४२६७, ८३०२०.९१	चित्र थापा ९८४७२५१२३५	DD-90m, LD-82m, H-48m, S-18m (36-42,48-51,61-64,69-72,75-78), Q-10 lps, dd-32m	PH without OHT 10HP, 3" Col, 39m Low 10 Pole, 25 KVA T/f		3700812.27		पाइप लाइन (१०००)

क्र. सं.	योजनाको नाम (ज.उ.स.को नाम)	GPSS	अध्यक्षको नाम, सम्पर्क नं.	हालसम्म सम्पन्न कार्य			हालसम्मको खर्च	हालको अबस्था	बाँकी गर्नु पर्ने कार्य
				DTW निर्माण	पम्प घर /पम्प जडान/बिधुतिकरण	uPVC निर्माण			
३२	नयाँ मेशिन डिर्ल ट्यूबवेल बोरिङ्ग, मायादेवी, सियारी, कोटाहिमाई, रुपन्देही (बोहरहावा ज.उ.स. बोहरहवा सियारी-३)	२७.६२२१५, ८३.४२८८०२	महेन्द्र यादव ९८४७०१२०५७	DD-110, LD-109, H-42, S-15 (47-50,54-87,60-66,98-101), Q-20 lps, dd-18m,	12.5 hp, 36m column pipe, 4", 12 nos. & 25 KVA		४१७१२५६.२६	ट्रान्सफर्मर चोरी भ	पाइप लाइन+ट्रान्स फर्मर
३३	डिप बोरिङ्ग सिंचाइ योजना, कोटाइमाई-६ (नवदुर्गामाता ज.उ.स., मर्चावारी मन्दिर)	२७.०२५२१, ८३.०२२२५		DD-130,LD127,H-39,S-15 (42-48,79-82,115-121 lcg)Q-20,dd-19.91, Exp- . (FY 75/76)	20hp,5" column, 36m lowering, 7 Pole, 25 KVA Transformer, (27/76/77)		४२००७५५	लाइन चार्ज नभएको	TOD+पाइप लाइन (१५००)
३४	जनकपुर डिप ट्युबवेल सिं यो, सुद्दोधन ३ (जनकपुर ज.उ.स,)	२७.६४९२, ८३.४१९९०	शेर व क्षेत्री ९८४७२४६४४३	DD-130, LD-124, H-48, S-18(50-56, 102-111, 115-118),10/6"	20 HP, 4" Col., 36m low., 8 Pole, 25 KVA Trans		३७४०२४८		पाइप लाइन (१५००)
३५	हाटीर्सटिकर ९ गाउँको सार्वजनिक ठाउँ, डिप ट्युववेल सिँचाइ प्रणाली ओमसतिया ३ रुपन्देही	२७.५३६११, ८३.५११११	चन्नार यादव ९८५७०१६२४८	DD-148, LD-146, H-48, S 15 (97-103,112-115,137-140 ss), २०७७/78			१३६४०६५.		सबै
३६	हरिफसवा टिकर केकरवारी, डिप ट्युववेल सिँचाइ प्रणाली ओमसतिया ३ बरसरी, रुपन्देही	२७.५४४४४, ८३.५१३८८	चन्नार यादव 9857016248	DD-146, LD-141, H-48, S 15 (94-103, 109-112, 132-135, ss), 2077/78			१३६४०६५.		सबै

(नोटः- माथि उल्लेखित डिप ट्युबवेल योजनाहरु प्रदेश सरकार स्थापना पछि सुरु भएका र आ.ब २०८२/८३ सम्म सम्पन्न नभएका योजनाहरु हुँन, क्रमागत योजना भएतापनि सालबासाली बजेट बिनियोजन हुने हुँदा बजेटको कमिको कारणले योजना सम्पन्न हुन नसकेको र कुनै पनि योजनाको ठेक्का दायीत्व नरहेको)

अनुसूची-१२: आ.व. २०८२/०८३ मा निर्माण सम्पन्न भएका डिप ट्यूववेलको विवरण

S.N.	Name of Project	Location	TW Size	Latitude	Longitude	Drilling Depth (m)	Lowering Depth(m) With AGL	Housing (m)	Screen Position (m)	Discharge (lps)	SWL (m)	DWL (m)	Remarks
1	Malangababa DTW ISP	Bardhaghat-12, Pajarkatti Nawalparasi	Dia. 10/8"	27.502235	83.74068147	169.5	169.5	44.5	18m (45-51, 136-139, 154-163) =18 m SS	16	12.05	17.92	Rotary Drilling (Redrill TW)
2	Kunsare DTW ISP	Ta Na Pa 7 Kunsare Palpa	Dia. 8"	27.834862	83.564037	108	108	Throughout 8”	24	2.5	4.67	8.12	DTH Drilling
3	Argali DTW ISP	Ta Na Pa 14 Argali Palpa	Dia. 8"	27.916028	83.451008	120	120	Throughout 8”	18	6	64	70	DTH Drilling

अनुसूची-१३ आ.व. २०८२/०८३ मा निर्माण भएका स्यालो ट्युववेलको विवरण

(क) स्यालो ट्यूववेल विवरण-आ.ब. २०८२/०८३ (समानिकरण) जिल्ला-रुपन्देही

S. N	WUA'S Name	GPs	Chairman	Land Owners Name	Depth	TW	Pump	Remarks
1	Chisapani STW WUA Sainamaina-11, Chisapanitole Rupandehi	27.661184 83.255582	Dhundiraj Bhusal	Tama Kumari Bhusal	61	1	2 HP Electric	4" PD Rotary
2	Salghari STW WUA Gaidahawa-7, Salgharitole Rupandehi	27.621284 83.277755	Kalpana Acharya Panthi	Nirajan Panthi	64	1	3 HP Submersible	6" PD Rotary
3	Laharepipaltol Jharabaira STW WUA Sainamaina-4, Jharabaira Rupandehi	27.67686 83.34597	Jibnath Gyawoli	Tika Kumari Gyawali	47	1	2 HP Submersible	6" PD Rotary
4	Khakanpur STW WUA Sainamaina-2, Khakanpur Rupandehi	27.69541 83.34906	Ramlal Tharu	Umadebi Bhusal Jaisi	66	1	5 HP Submersible	6" PD Rotary
5	Sisai Kirshak Samuha STW WUA Suddhodhan-1, Sisai Rupandehi	27.645495 83.344605	Chinnu Pd. Yadav	Dhaniram Tharu	25	6		4" PD Rotary
		27.647070 8 83.344135		Santa Kumar Chaudhary	22			
		27.649225 83.344135		Raju Yadav	29			
		27.652436 83.343115		Adalat Musalman	27			
		27.654422 83.344621		Amrita Tharu	25			
		27.656867 83.349547		Dhukharam Teli	26			
6	Jagaruk STW WUA Tilottama-8, Dipnagar Rupandehi	27.627818 83.509449	Yadhulal Acharya	Jaylal Gotame	58	1	3 HP Submersible	6" PD Rotary
7	Sumeru STW WUA Tilottama-8, Rupandehi	27.616216 83.489526	Dugendraraj Gyawali	Dugendraraj Gyawali	57	1	3 HP Submersible	6" PD Rotary

S. N	WUA'S Name	GPs	Chairman	Land Owners Name	Depth	TW	Pump	Remarks
8	Kumbichowk Burjatol STW WUA Devdaha-2, Rupandehi	27.599053 83.573127	Purna Bdr. Thapa	Humakanta Tiwari	71	1	3 HP Submersible	6" PD Rotary
9	Ujjal Kirshak WUA Devdaha-6, Jyotinagar Rupandehi	27.657842 83.600945	Khem Bdr. Chhetri	Deu Bdr. Gurung	54	1		6" PD DTH
10	Inguriya STW WUA Sainamaina-6, Inguriya Rupandehi	27.718291 83.306833	Krishna Bdr. Raskoti	Krishna Bdr. Raskoti	54	1		6" PD DTH
11	Kotahimai STW WUA Kotahimai-4, Marchawar Rupandehi	27.442278 83.364682	Rambrichhaya Gadariya	Bechuram Gadariya	116	2		4" PD Rotary
		27.439524 83.361399		Rambrichhaya Gadariya	74			
12	Dolai STW WUA Gaidahawa-8, Dolai Rupandehi	27.599081 83.311915	Ramkumar Lodha	Ramlaut Lodha	114	2	5 HP Diesel Pumpset	4" PD Rotary
		27.606844 83.319842		Ram Pd. Lodha	32		2 HP Monobloc k	
13	Piparhiya STW WUA Rohini-7, Tikar Rupandehi	27.475238 83.546463	Dinesh Yadav	Amit Kumar Yadav	57	1		4" PD Rotary
14	Debistathan STW WUA Butwal-19, Debistathantole Rupandehi	27.649648 83.407786	Liladhar Sharma	Liladhar Sharma	54	1	3 HP Submersible	6" PD DTH
15	Diamondpath STW WUA Devdaha-5,Diamondpath Rupandehi	27.654146 83.60446	Kalpana Lakai	Purna Giri	54	1	3 HP Submersible	6" PD DTH
16	Samayamai STW WUA Marchawari-4, Mahadewa Marchawar Rupandehi	27.387306 83.350585	Prakash Tiwari	Santalal Chamar	11	4	2 HP Electric	4" Sludge
		27.387562 83.348665		Sudhadebi Pathak	10		2 HP Electric	

S. N	WUA'S Name	GPs	Chairman	Land Owners Name	Depth	TW	Pump	Remarks
		27.388259 83.344472		Prakash Tiwari	34		5 HP Diesel Pumpset	
		27.386893 83.349584		Ramdhani Kurmi	10		2 HP Electric	
17	Hariyali Kirshak Bhumigat Sinchai STW WUA Suddhodhan-1, Belawa Rupandehi	27.630834 83.336409	Jayram Mallaha	Chhedi Pd. Loniya	10	13	2 HP Electric	
		27.629585 83.34249		Manati Mallaha	10			
		27.630693 5 83.343435		Durgabati Mallaha	10			
		27.630829 83.341854		Prem Chandra Lodha	10		5 HP Diesel	
		27.631019 83.347276		Shivakaran Harijan	10		2 HP Electric	
		27.636033 83.347685		Sriprakash Chamar	10			
		27.633963 83.346473		Ramkesh Lohar	11			
		27.633156 83.34394		Sukdeb Lohar	10			
		27.634145 83.341671		Krishna Loniya	10.5			
		27.634253 83.341248		Jawahir Loniya	10			
		27.634628 83.340722		Santaram Loniya	10			
		27.632949 83.340405		Jayram Mallaha	10			
		27.636097 83.342457		Sibad Mallaha	10			
					Total		39	

(ख) स्यालो ट्यूववेल विवरण-आ.ब. २०८२/०८३ (समानिकरण) –जिल्ला नवलपरासी

S.N	WUA'S Name Address	GPs Location	Chairman	Land Owners	Depth (m)	Screen (m)	TW	Pump (H.P)	Remarks
1	Himali STW WUA Ramgram-16, Hakui	27.510308 83.620289	Binay Yadav	Sharban Yadav	159	3	1	3 HP Submersible	4" PD Rotary
2	Nabadurga STW WUA Ramgram-16, Hakui	27.50155 83.61249	Chulahi Yadav	Chulahi Yadav	159	3	1	3 HP Submersible	4" PD Rotary
3	Unawochha STW WUA Ramgram-8, Unawochha	27.51861 83.676857	Rambrichhaya Kewat	Jadawati Kumari Ahir	149	3	1	3 HP Submersible	4" PD Rotary
4	Jyoti Mahila Kirshak Samuha WUA Ramgram-13 Siwangadha	27.539312 83.699149	Rekha Sharma	Bhim Narayan Sharma	176	3	1	3 HP Submersible	4" PD Rotary
5	Balmiki STW WUA Bardhaghat-1, Punarbas	27.508818 83.785808	Shankar Kumal	Dalmika Pantha	48	3	1	2 HP Submersible	6" PD Rotary
6	Bhusunapur STW WUA Ramgram-14, Bhusunapur	27.574431 83.623553	Shiva Pd. Bhattarai	Narayan Pd. Bhattarai	135	3	1	3 HP Submersible	4" PD Rotary
7	Kumarbarti STW WUA Ramgram-16, Hakui	27.513762 83.620181	Dhurba Narayan Chaudhary	Nima Chaudhary	147	3	1	2 HP Mono block	4" PD Rotary
8	Badago STW WUA Ramgram-18, Badago	27.540607 83.603139	Chaudhary Kathariya	Chaudhary Kathariya	159	3	1	3 HP Submersible	4" PD Rotary
9	Shiva Parbati STW WUA Palhinandan-4, Nawalparasi	27.487663 83.668068	Pannalal Kewat	Pannalal Kewat	19	6	1		4" Sludge Drilling
		27.490898 83.663006		Gyayatridebi Patanwar	16	6	1		
		27.492335 83.669448		Markandedas Patanwar	16	6	1		
		27.492292 83.667509		Madan Kewat	16	6	1		
		27.492123 83.665353		Ghanashayamdas Patanwar	16	6	1		
		27.491122 83.673538		Kusumdebi Shahani	17	6	1		
10	Mahalwari Kudiya STW WUA Susta-2, Kudiya Nawalparasi	27.447329 83.830989	Ramabadha Gupta	Rambrichhaya Baniya	12	3	1		4" Hammering Drilling
		27.453976 83.883762		Jogendra Gupta	10	3	1	×	
		27.460863 83.874249		Bhimlal Neupane	12	3	1		
		27.46706 83.882912		Dilliraj Bhusal	12	3	1		
		27.47137 83.885102		Prabhu Lohar	16	3	1		

S.N	WUA'S Name Address	GPs Location	Chairman	Land Owners	Depth (m)	Screen (m)	TW	Pump (H.P)	Remarks
11	Guthiparsauni STW WUA Pratappur 3,5,6,7 & 9 Nawalparasi	27.462872 83.800176	Sandip Kumar Kurmi	Dinesh Kumar Upadhayaya	13	3	1	×	4" Hammering Drilling
		27.466352 83.801808		Motilal Koiri	13	3	1	×	
		27.4471 83.787109		Sangita Kumari Koiri	15	3	1	×	
		27.42779 83.784419		Ali Husen	12.5	3	1	×	
		27.404782 83.80401		Mannar Pasi	15.5	3	1	×	
		27.394143 83.803226		Manoj Yadav	18	3	1	×	
		27.394974 83.81122		Sanjay Koiri	12	3	1	×	
		27.408942 83.810134		Kamalesh Kumar Gupta	12.5	3	1	×	
		27.408994 83.810134		Alisher Hajam	16.5	3	1	×	
12	Motibari STW WUA Sarawol-3, Nawalparasi	27.512266 83.732638	Khemlal Chaudhary	Khemlal Chudhary	16	6	1	2 HP Electric	4" Sludge Drilling
		27.512042 83.736505		Tribhuvan Faujadar	19	6	1	2 HP Electric	
		27.509567 83.737571		Chhabilal Chaudhary	19.5	6	1	2 HP Electric	
		27.512505 83.742159		Meghalal Chaudhary	18.5	6	1	2 HP Electric	
		27.506667 83.740851		Hari Pd. Chaudhary	16.5	5	1	2 HP Electric	
		27.509046 83.739413		Krishna Bdr. Chaudhary	18.5	5	1	2 HP Electric	
		27.502638 83.735226		Laxmi Chaudhary	15.5	6	1	2 HP Electric	
		27.50021 83.73459		Chaturbhuj Chaudhary	18	9	1	2 HP Electric	
		27.50372 83.727166		Dharma Kumari Chaudhary	15.5	6	1	2 HP Electric	
13	Daunne STW WUA Palhinandan-5, Germi Nawalparasi	27.457832 83.664481	Santosh Baniya	Balgobinda Mourya	22	6	1	×	
		27.461638 83.670046		Nathu Sahani Kewat	21.5	6	1	×	
		27.45677 83.67165		Ramharaf Gupta	24	6	1	×	
		27.455765 83.66575		Ramananda Patel	22	6	1	×	

S.N	WUA'S Name Address	GPs Location	Chairman	Land Owners	Depth (m)	Screen (m)	TW	Pump (H.P)	Remarks
		27.458746 83.663559		Buddrihi Kurmi	22	6	1	×	
		27.451991 83.660253		Ramlachhayan Das	21.5	6	1	×	
		27.458296 83.660393		Urmiladebi Yaday	22	6	1	×	4" Sludge
		27.462351 83.660917		Kasim Ali	22	6	1	×	
		27.462131 83.659349		Gobinda narayan Gupta	22	6	1	×	
		27.459994 83.658082		Lalchan Baniya	22	6	1	×	
		27.459397 83.651766		Bisuni Yadav	21.5	6	1	×	
		27.461977 83.651862		Bisun Koiri	21.5	6	1	×	
		27.46142 83.65022		Ajameru Nisha	20.5	6	1	×	
						Total Number of STW	50		

(ग) स्यालो ट्यूववेल विवरण-आ.ब. २०८२/८३ (संघीय ससर्त अनुदान)

SN	WUA Name	GPS		Well Detail					Remark
			Land Owner	Size (in)	Depth (m)	Screen (m)	TW	SWL (m)	
1	*Susta-1 STW WUA* (Susta-1 Chhebeni, Fechuwa, Rupauliya, Singaha Nawalparasi) संघ ससर्त अनुदान तर्फको कार्यक्रमबाट निर्मित ज.उ.स. अध्यक्ष Janardan Pd. Chaudhary	27.469202 83.858708	Aausari Neupane	4	9.5	3	1	1.9	Hammering Method (5 HP Diesel Pump)
2		27.4682 83.859517	Aeknarayan Neupane	4	10.2	3	1	1.8	
3		27.466281 83.85779	Dhan Kumari Neupane	4	8.1	3	1	1.3	
4		27.465491 83.856021	Krishna Kumari Dumre	4	12.9	3	1	2.3	
5		27.465478 83.853034	Ram Pd. Neupane	4	11	3	1	3.3	
6		27.470717 83.85036	Kisun Bdr.Tharu	4	11.5	3	1	2.6	
7		27.473851 83.85388	Netiram Chaudhary	4	11.8	3	1	4.4	
8		27.473314 83.8466629	Prem Kumari Tharuni	4	12.65	3	1	5.3	
9		27.47267 83.847633	Jugnarayan Gurau	4	10.6	3	1	5.3	
10		27.470717 83.846842	Baburam Tharu	4	11.8	3	1	3.6	
11		27.479312 83.846259	Sitadebi Upadhayaya	4	10.4	3	1	3.8	
12		27.472768 83.8457	Muni Narayan Tharu	4	12.65	3	1	4.1	
13		27.473477 83.846682	Tej Narayan Chaudhary	4	10.5	3	1	5.9	
14		27.475243 83.849233	Fagu Tharu	4	10.8	3	1	5.5	
15		27.472493 83.839724	Chet Kumari Tharu	4	11.5	3	1	4.4	

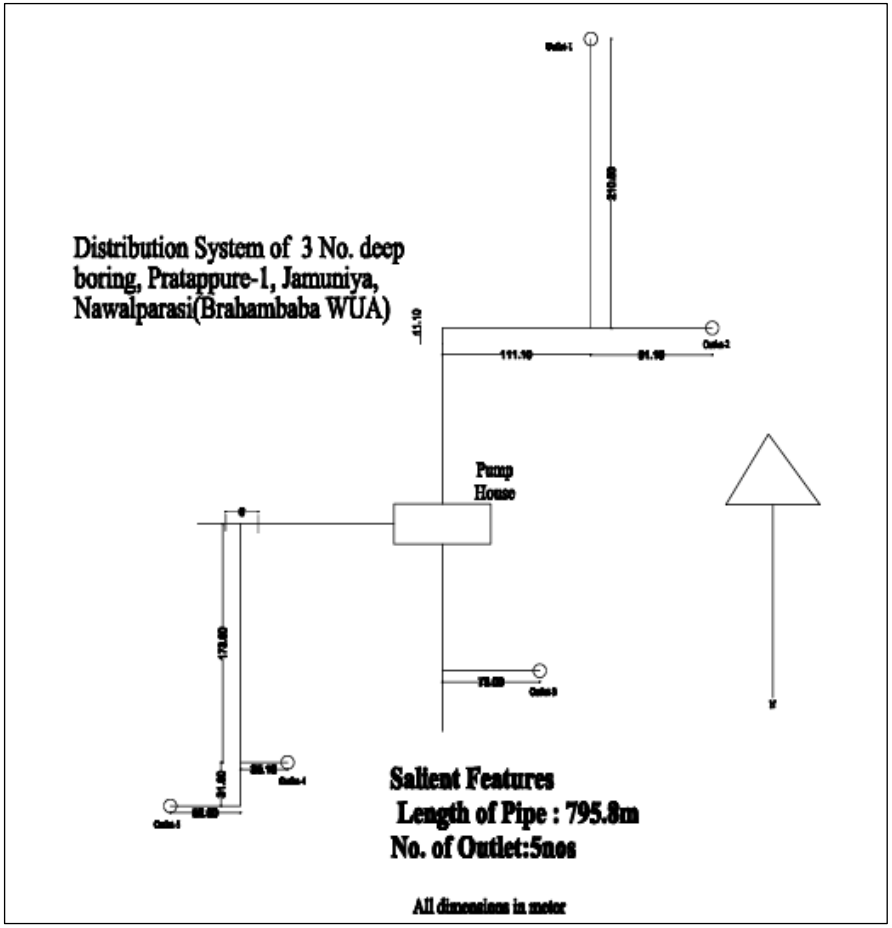
SN	WUA Name	GPS		Well Detail					Remark
			Land Owner	Size (in)	Depth (m)	Screen (m)	TW	SWL (m)	
16		27.467695 83.835471	Mithailal Chaudhary	4	11.1	3	1	2.2	
17		27.471156 83.835777	Ganesh Bdr. Chaudhary	4	11.7	3	1	3.3	
18		27.474535 83.833907	Kamalraj Dhakal	4	13.2	3	1	2.1	
19		27.476772 83.83581	Prem Kumari Tharu	4	13.6	3	1	3.2	
20		27.478755 83.837134	Mohan Chaudhary	4	14.1	3	1	2.7	
21		27.479746 83.83561	Laxmi Chaudhary	4	15	3	1	3.4	
22		27.469659 83.836878	Balkrishna Pangeni	4	12.8	3	1	4.3	
23		27.47278 83.85708	Gangadebi Gyawali	4	13.4	3	1	5.2	
24		27.46569 83.849671	Bindadebi Kuswa	4	11.1	3	1	4.8	
25		27.469716 83.823976	Ram Suresh Bhedihar	4	12	3	1	2.3	
26		27.473383 83.829912	Likharam Panjiyar	4	13.2	3	1	2.0	
27		27.475032 83.831457	Punamdebi Nau	4	14	3	1	2.2	
28		27.482957 83.83537	Nirmala Chaudhary	4	13.2	3	1	3.4	
29		27.483871 83.834023	Gobinda Pd. Gurau	4	13.15	3	1	4.5	
30		27.480011 83.840198	Yamnarayan Chaudhary	4	14.3	3	1	4.7	
कुल ३० ट्युबवेल निर्माण भएको									

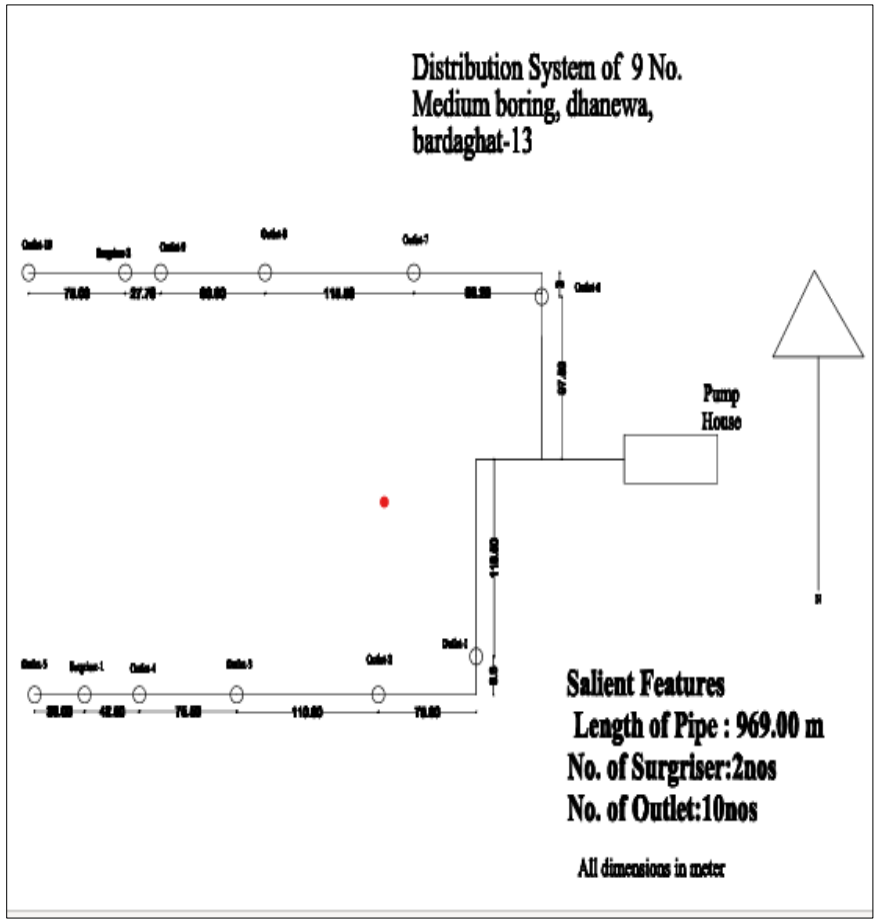
अनुसूची-१४: आ. व. २०८२/८३ मा बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चित भएका योजनाहरू

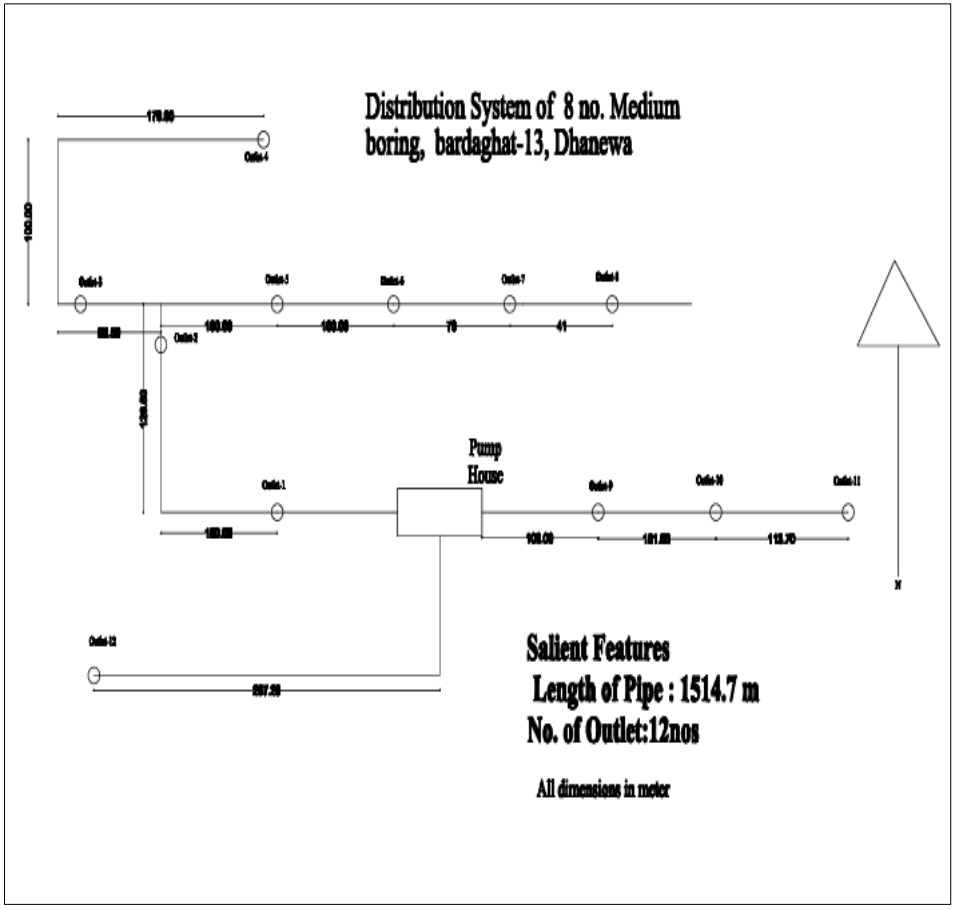
सि. नं	आयोजनाको नाम	जिल्ला	स्रोत सुनिश्चित भएको रकम (हजारमा)	ठेक्का रकम (हजारमा) (पहिलो चरण कार्य)	ठेक्का सम्झौता मिति	०८२/८३ सम्मको खर्च	०८३/०८४ मा विनियोजित रकम	०८३/८४ पछिको दायित्व (सम्भावित)	कैफियत
१	११.४.१५.२१४६. श्रीनगर डिप ट्यूववेल सिँचाइ उपयोजना, रामग्राम-१४	नवलपरासी	१३६२८	४४३८.३९	३०५९	०	२७००	४४८४	
२	११.४.१५.२२५९ घोडपाली डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना, रामग्राम-३	नवलपरासी	१४१९५.१५	४४३८.३९	२७९१.४६	०	2900	३६१७	
३	११.४.१५.२२६२. जोकवार ललितपुर डिप ट्यूववेल सिँचाइ उपयोजना, रामग्राम-९	नवलपरासी	१३६९२.६	४४३८.३९	३६००	०	३३००	५०१४	
४	११.४.१५.२२६० भुस्नापुर डिप ट्यूववेल सिँचाइ उपयोजना रामग्राम-१४ नवलपरासी	नवलपरासी	१३०१७.७९	४४३८.३९	३०६२.६६	०	२७००	४९३८	
५	११.४.१५.२२२५ कर्वलाटोल डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना सैनामैना-४,	रुपन्देही	१३३७६.४१	३५०८.६५	१९००	०	२०००	५००५	
६	११.४.१५.२२४९ शुक्रौलि घिनाह (उत्तरटोला) डिप ट्यूववेल सिँचाइ उपयोजना रामग्राम-१५	नवलपरासी	१३२३५.२२	४४०३.४३	२३३४	०	१८००	४३८७	
७	११.४.१५.२२५८ शुक्रौलि घिनाह डिप ट्यूववेल सिँचाइ उपयोजना रामग्राम-१५	नवलपरासी	१३७४६.४४	४४०३.४३	२३३४	०	२०००	५५६८	

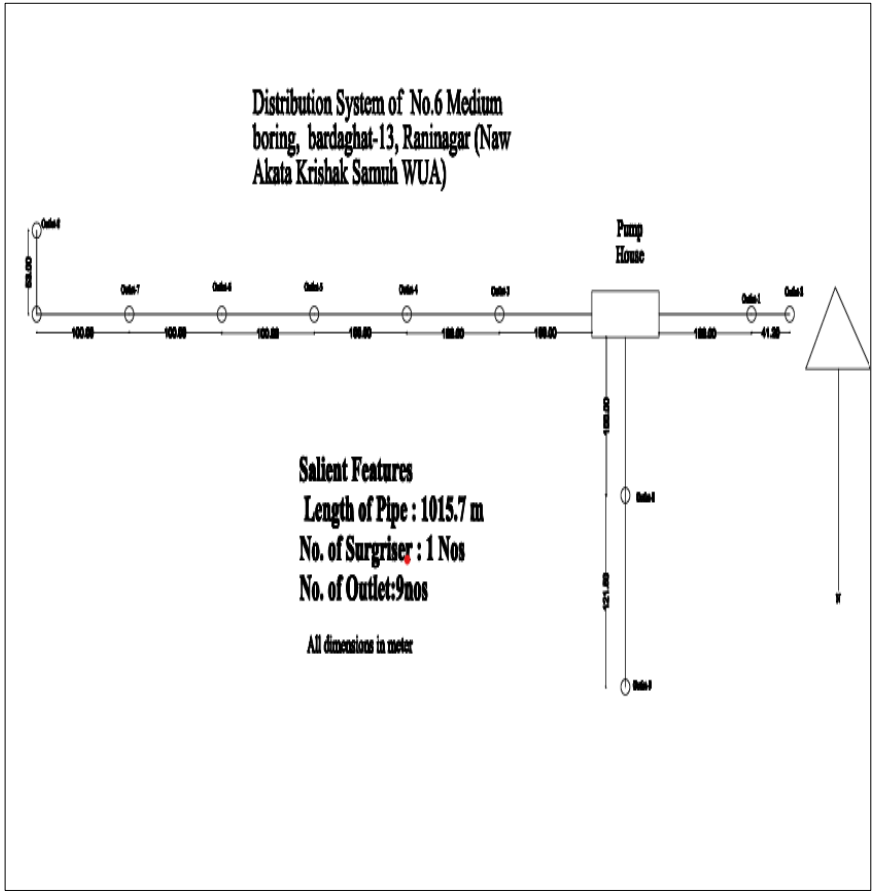
सि. नं	आयोजनाको नाम	जिल्ला	स्रोत सुनिश्चित भएको रकम (हजारमा)	ठेक्का रकम (हजारमा) (पहिलो चरण कार्य)	ठेक्का सम्झौता मिति	०८२/८३ सम्मको खर्च	०८३/०८४ मा विनियोजित रकम	०८३/८४ पछिको दायित्व (सम्भावित)	कैफियत
८	११.४.१५.२२६१ जय गणेश डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना रामग्राम-१७	नवलपरासी	१३११५	४४०३.४३	२३३४	०	2000	४५५४	
९	११.४.१५.१८४२ अर्गली डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना तानसेन-१४	पाल्पा	८१६३.०४३	१५६५.२३		११२३.२९	**१०००**	२७३६	प्रथम चरणको सम्पन्न
१०	११.४.१६.४८२६ रेक्सहवा डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना रामग्राम-१४	नवलपरासी	१३३४०.३९	४४३८.३९	२७८६	०	**२९००**	४२६१	
११	११.४.१६.४८२३ लंकहवा डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना रामग्राम-१०	नवलपरासी	१३२९८.३४	४४०३.४३	**२४०३**	०	**२०००**	४३७३	
१२	११.४.१६.४८२५ घिनाह डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना रामग्राम-१५	नवलपरासी	१३४४३	४४०३.४३	**२३३३**	०	**२०००**	४५०२	
		कुल	**१५६२५१.३९**	११२३.२९	**२८९३७**		**२७३००**	**५३४३९**	

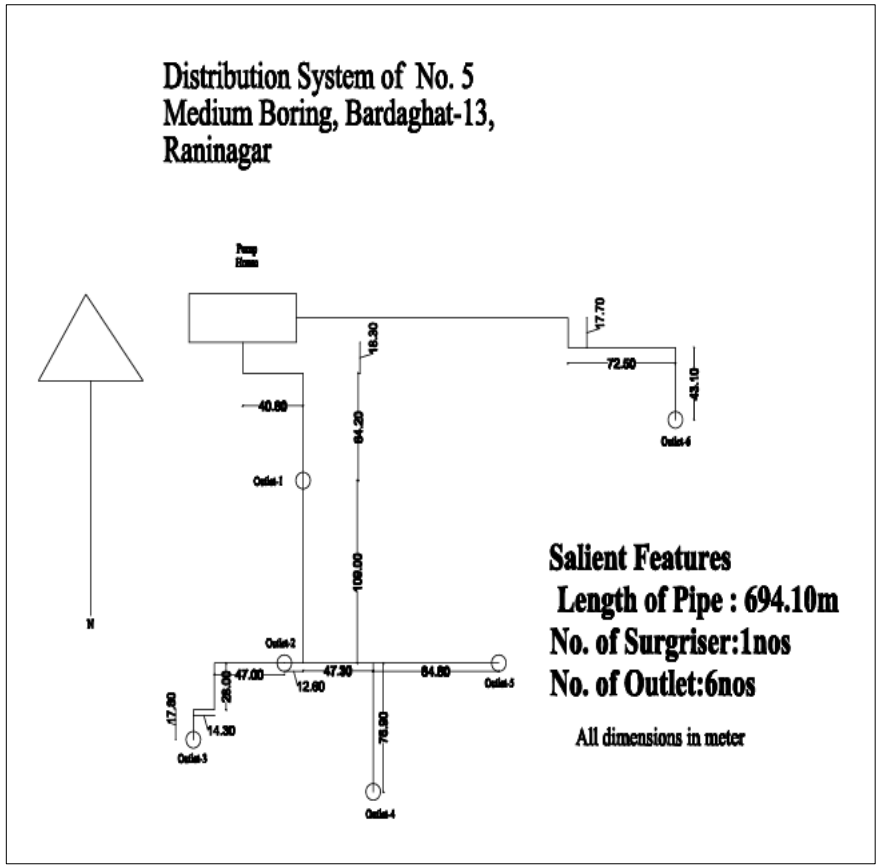
अनुसूची -१५: आ.व. २०८२/८३ मा निर्माण भएका सिँचाइ प्रणाली सम्बन्धी नक्साहरु

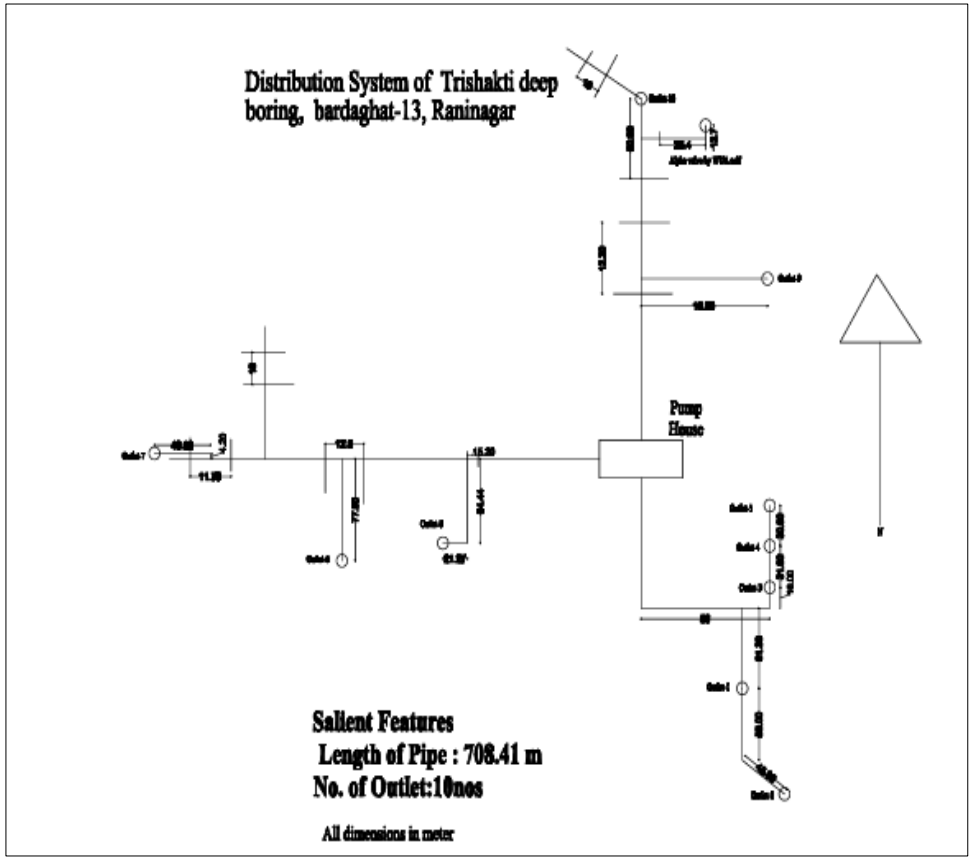


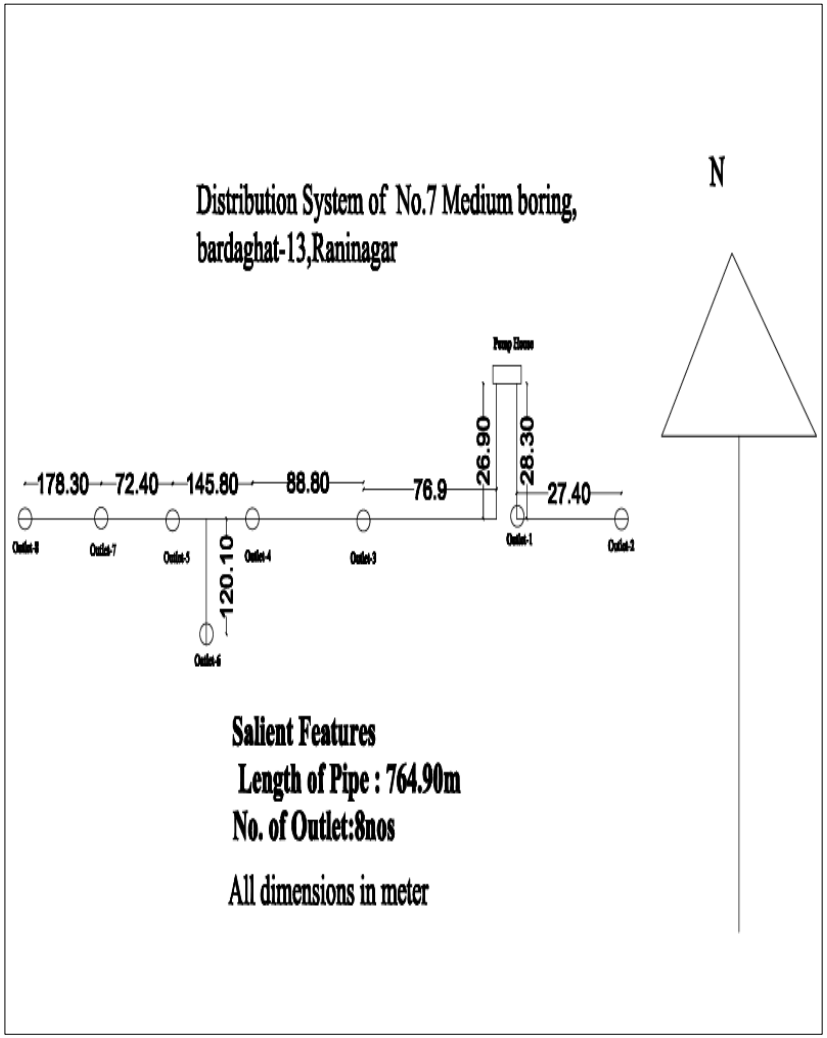


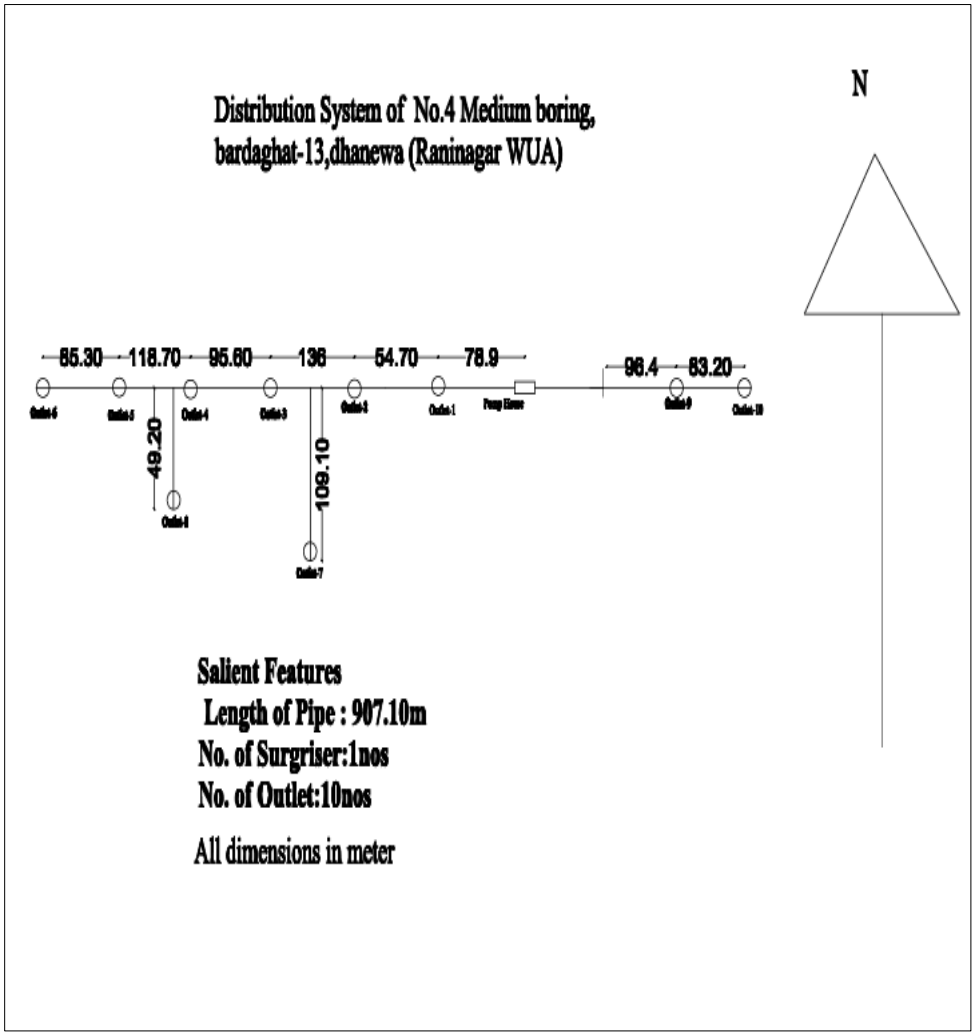

Distribution System of 8 no. Medium boring, bardaghat-13, Dhanewa
Pump House
Salient Features
Length of Pipe : 1514.7 m
No. of Outlet:12nos
All dimensions in meter


Distribution System of No.6 Medium boring, bardaghat-13, Raninagar (Naw Akata Krishak Samuh WUA)
Pump House
Salient Features
Length of Pipe : 1015.7 m
No. of Surgriser : 1 Nos
No. of Outlet:9nos
All dimensions in meter

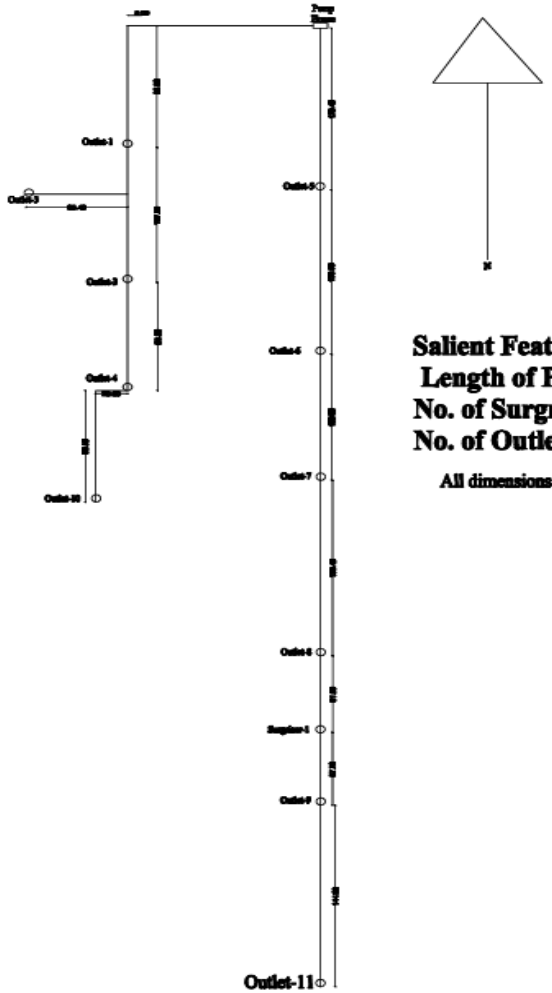

Distribution System of No. 5
Medium Boring, Bardaghat-13,
Raninagar
Pump House
17.70
72.60
43.10
16.30
84.20
40.80
Outlet-1
100.00
Outlet-2
47.00
47.30
84.80
Outlet-5
12.60
28.00
17.80
14.30
Outlet-3
76.80
Outlet-4
Outlet-6
N
Salient Features
Length of Pipe : 694.10m
No. of Surgriser:1nos
No. of Outlet:6nos
All dimensions in meter


Distribution System of Trishakti deep
boring, bardaghat-13, Raninagar
Pump
House
N
Salient Features
Length of Pipe : 708.41 m
No. of Outlet:10nos
All dimensions in meter


Distribution System of No.7 Medium boring,
bardaghat-13,Raninagar
N
178.30
72.40
145.80
88.80
76.9
26.90
28.30
27.40
120.10
Outlet-8
Outlet-7
Outlet-5
Outlet-6
Outlet-4
Outlet-3
Outlet-1
Outlet-2
Salient Features
Length of Pipe : 764.90m
No. of Outlet:8nos
All dimensions in meter


Distribution System of No.4 Medium boring,
bardaghat-13,dhanewa (Raninagar WUA)
N
65.30
118.70
95.60
136
54.70
78.9
96.4
83.20
49.20
109.10
Outlet-6
Outlet-5
Outlet-4
Outlet-3
Outlet-8
Outlet-1
Pump House
Outlet-9
Outlet-10
Outlet-2
Outlet-7
Salient Features
Length of Pipe : 907.10m
No. of Surgriser:1nos
No. of Outlet:10nos
All dimensions in meter

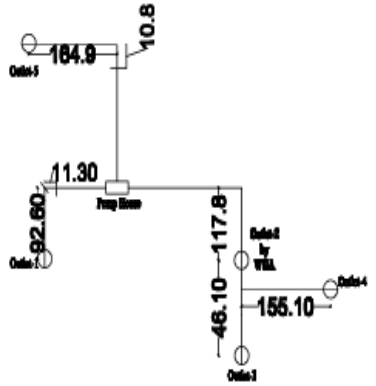
Distribution System of kalika deep tubewell, Bardaghat-13



Salient Features
Length of Pipe : 1234.10m
No. of Surgriser:1nos
No. of Outlet:11nos

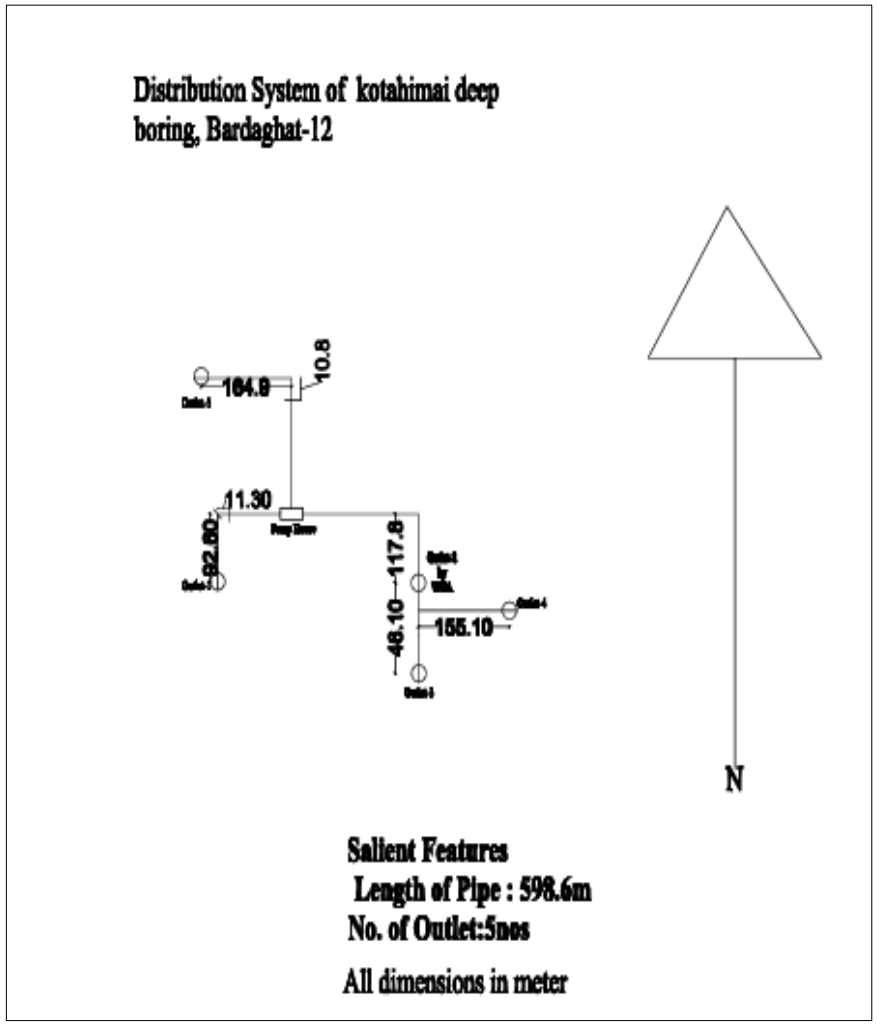
All dimensions in meter

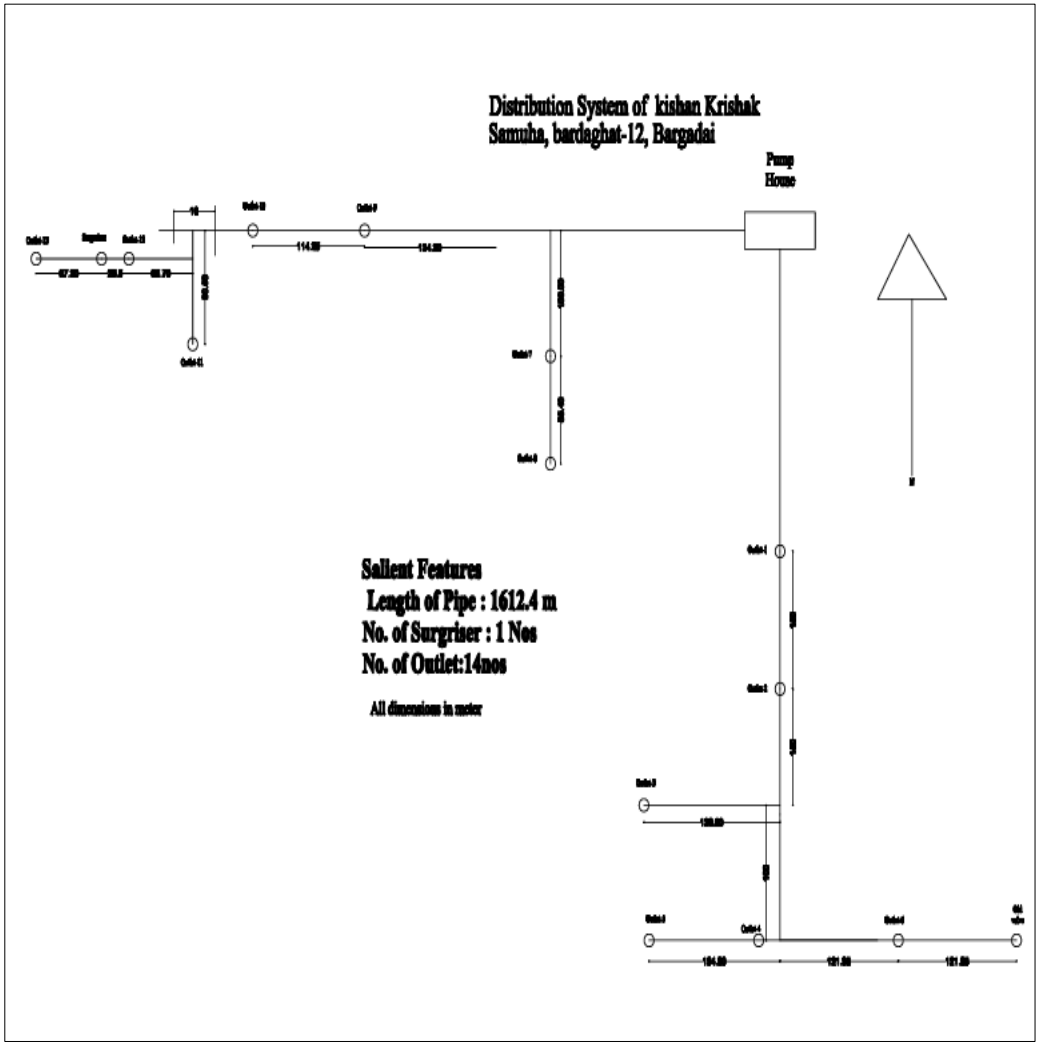
Distribution System of kotahimai deep boring, Bardaghat-12



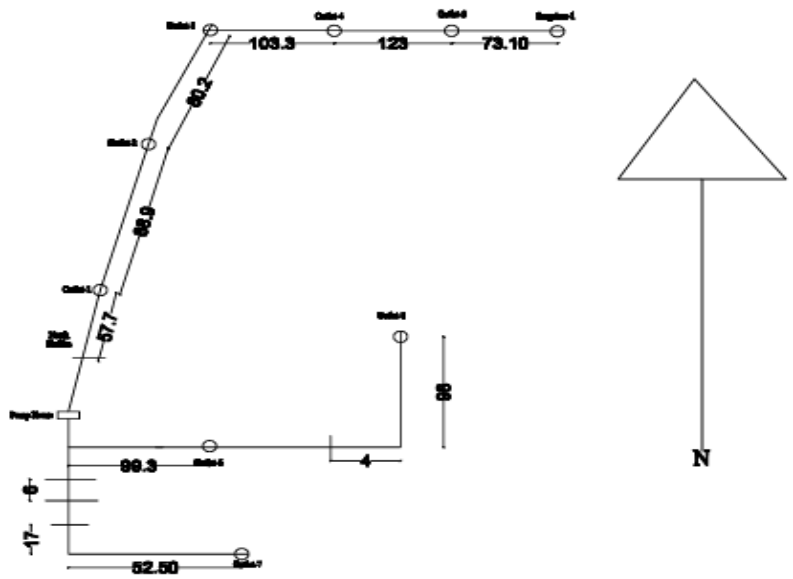
Salient Features
Length of Pipe : 598.6m
No. of Outlet:5nos

All dimensions in meter


Distribution System of kotahimai deep boring, Bardaghat-12
164.9
10.8
11.30
92.60
117.8
48.10
155.10
N
Salient Features
Length of Pipe : 598.6m
No. of Outlet:5nos
All dimensions in meter

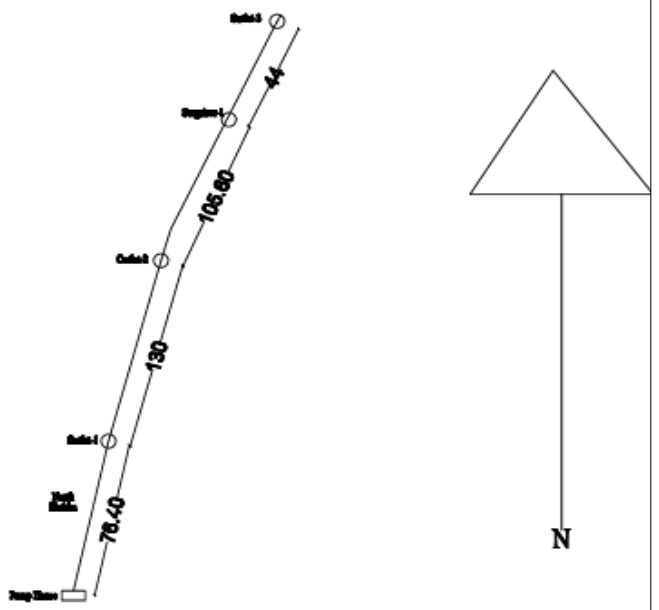

Distribution System of kishan Krishak Samuha, bardaghat-12, Bargadai
Pump House
Salient Features
Length of Pipe : 1612.4 m
No. of Surgriser : 1 Nos
No. of Outlet:14nos
All dimensions in meter

Distribution System of Santoshi mata deep boring, Bardaghat-12, kusumchowk

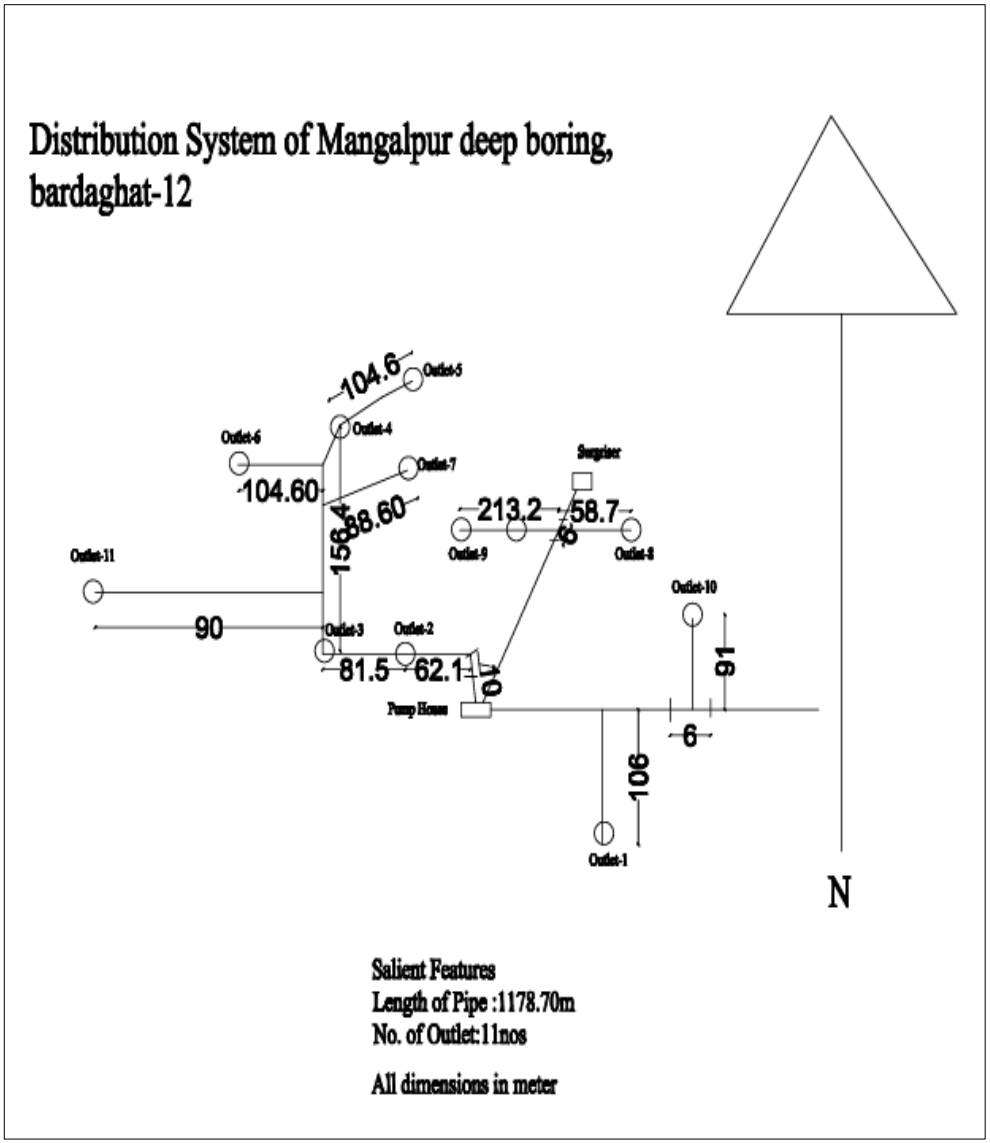


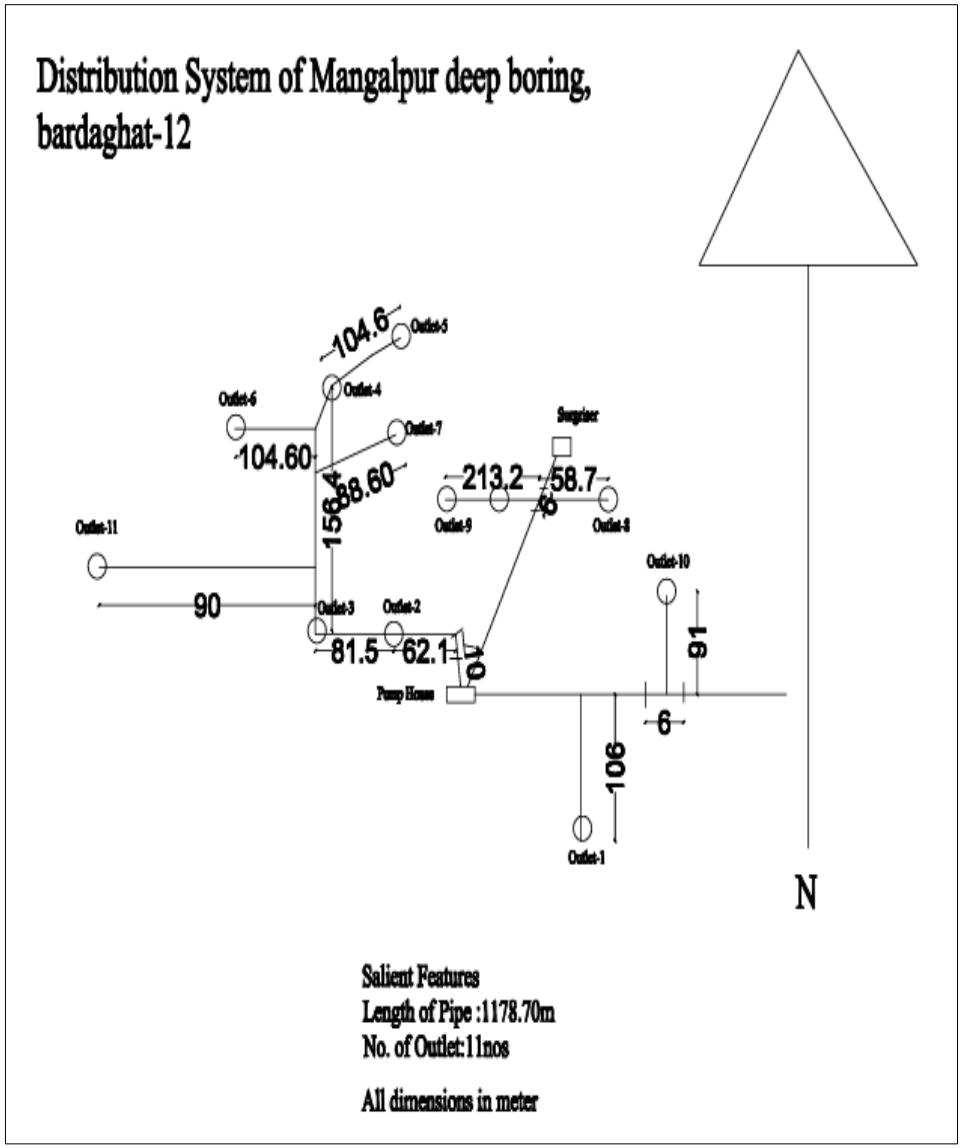
Salient Features
Length of Pipe : 803m
No. of Surgriser:1nos
No. of Outlet:8nos
All dimensions in meter

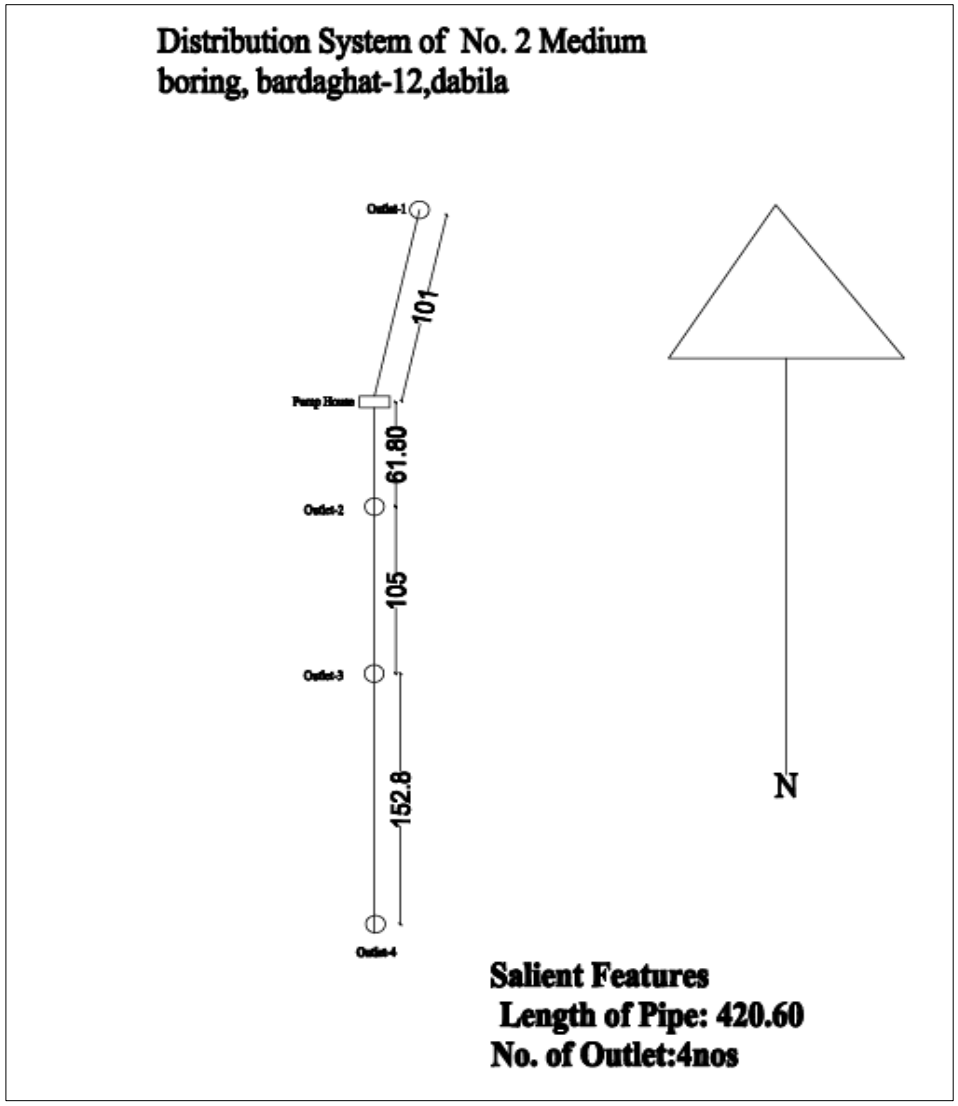
Distribution System of 1 no. DTW, Bhatauliya, Bardaghat-12

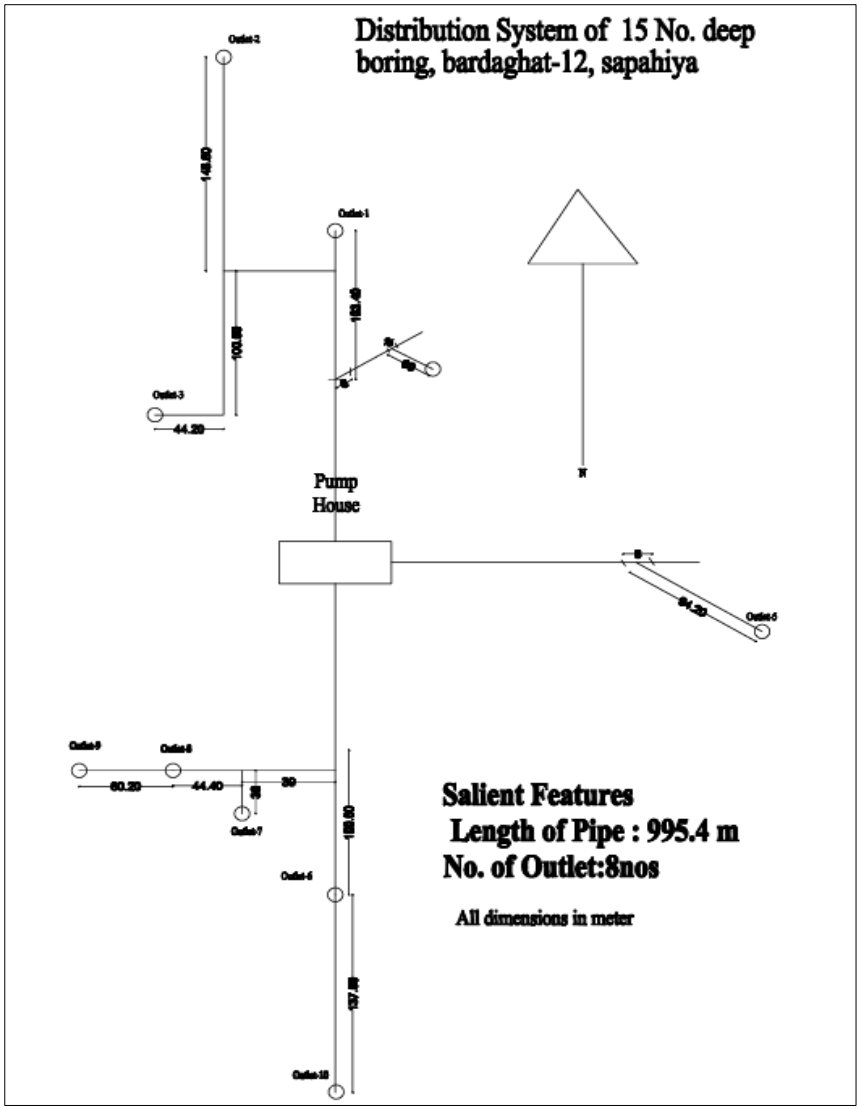


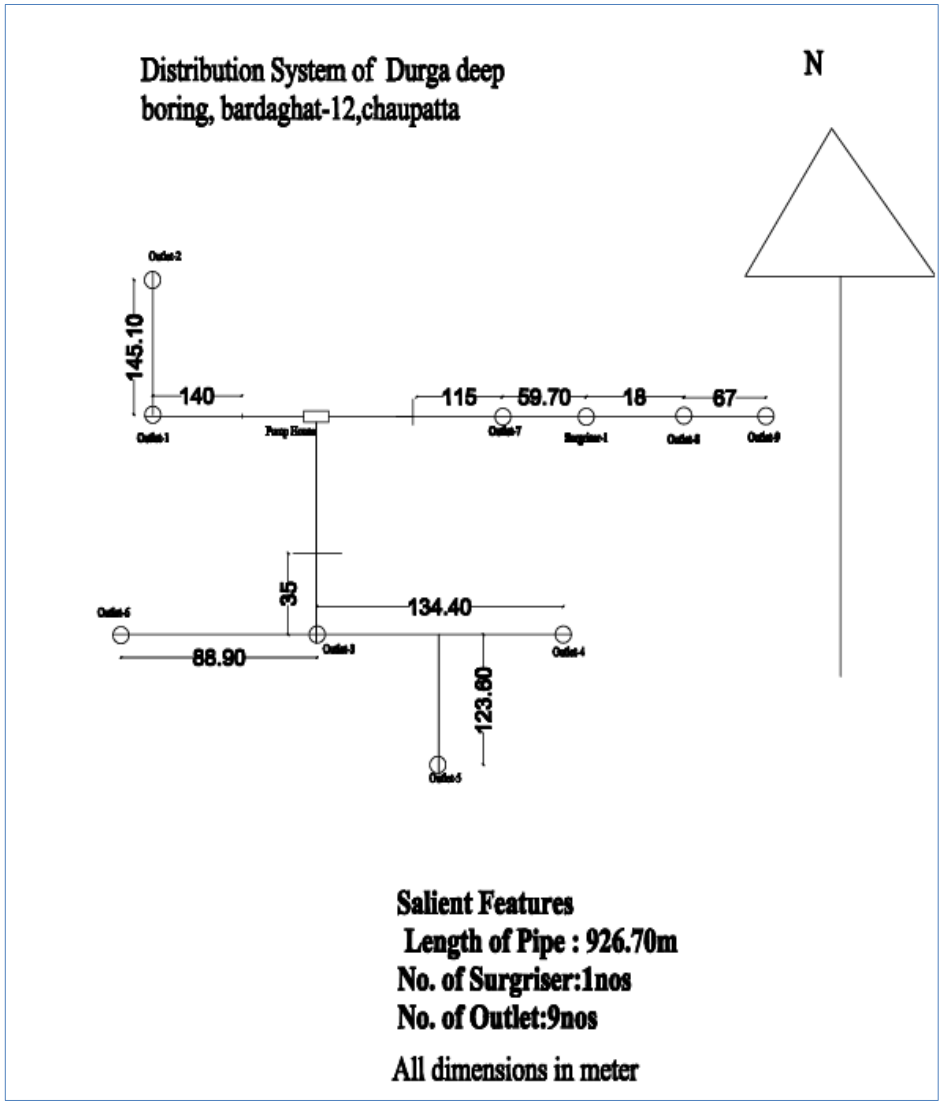
Salient Features
Length of Pipe with outlet & Surgeriser: 365m
No. of Surgriser:1nos
No. of Outlet:3nos
All dimensions in meter

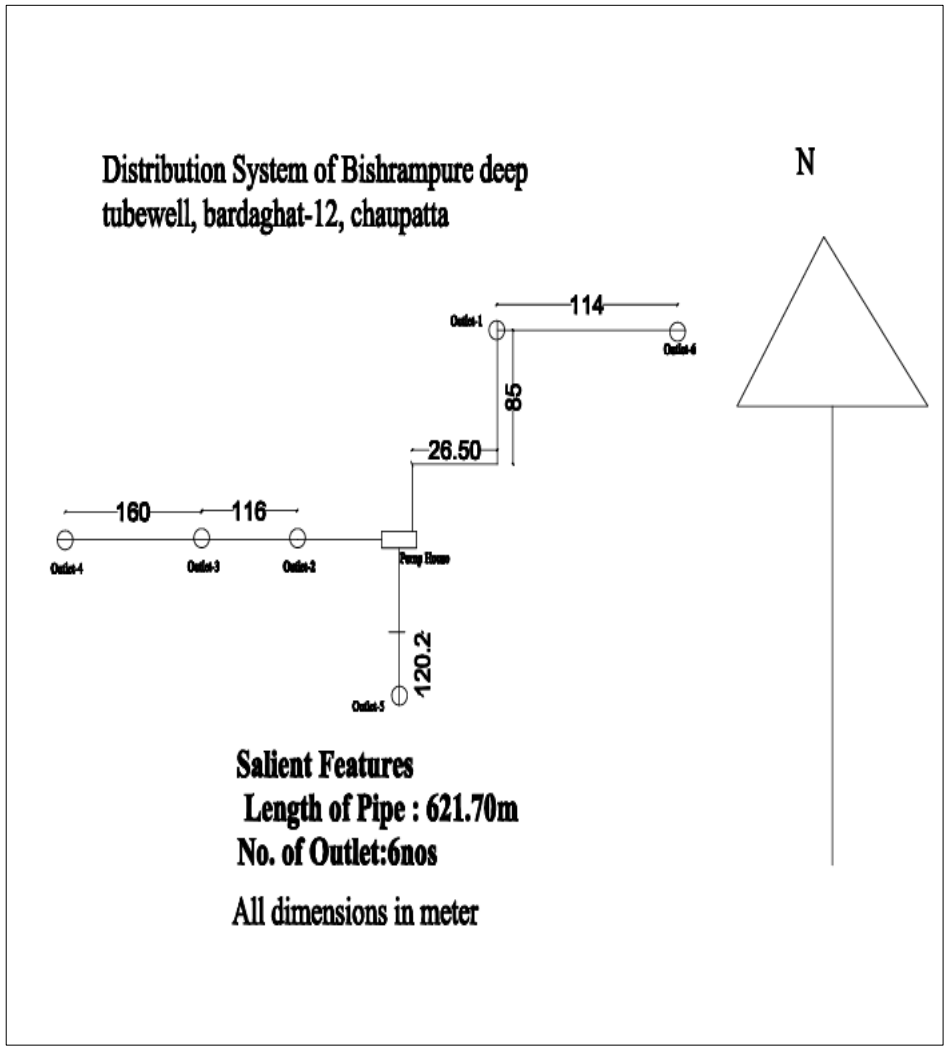

Distribution System of Mangalpur deep boring,
bardaghat-12
104.6
Outlet-5
Outlet-4
Outlet-6
Outlet-7
104.60
Surgicer
213.2
58.7
88.60
156.4
Outlet-9
Outlet-8
Outlet-11
Outlet-10
90
Outlet-3
Outlet-2
81.5
62.1
10
91
Pump House
6
106
Outlet-1
N
Salient Features
Length of Pipe :1178.70m
No. of Outlet:11nos
All dimensions in meter

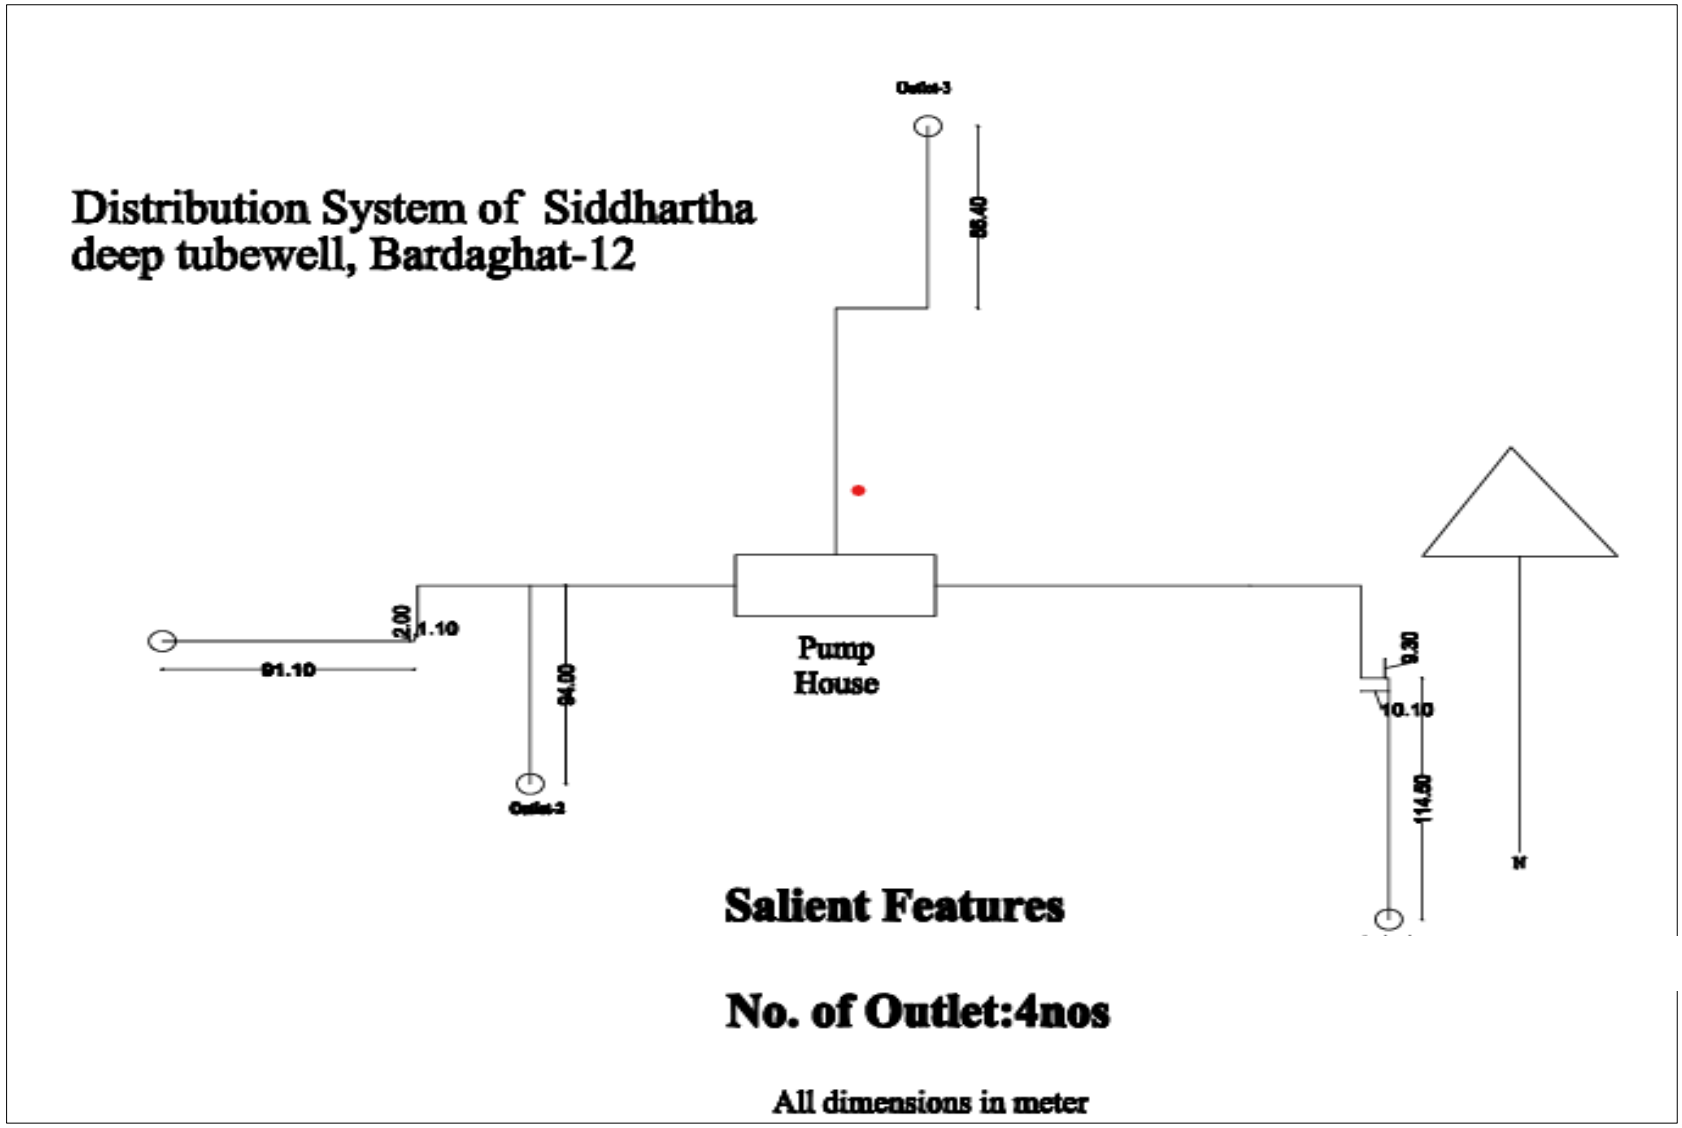

Distribution System of Mangalpur deep boring,
bardaghat-12
104.6
Outlet-5
Outlet-4
Outlet-6
Outlet-7
104.60
Surgicer
213.2
58.7
88.60
156.4
Outlet-9
Outlet-8
Outlet-11
Outlet-10
90
Outlet-3
Outlet-2
81.5
62.1
10
91
Pump House
6
106
Outlet-1
N
Salient Features
Length of Pipe :1178.70m
No. of Outlet:11nos
All dimensions in meter


Distribution System of No. 2 Medium boring, bardaghat-12,dabila
Outlet-1
101
Pump House
61.80
Outlet-2
105
Outlet-3
152.8
Outlet-4
N
Salient Features
Length of Pipe: 420.60
No. of Outlet:4nos


Distribution System of 15 No. deep boring, bardaghat-12, sapahiya
Outlet-2
140.60
Outlet-1
183.40
100.60
Outlet-3
44.20
Pump House
94.20
Outlet-5
Outlet-9
Outlet-8
80.20
44.40
30
Outlet-7
Outlet-6
Outlet-10
Salient Features
Length of Pipe : 995.4 m
No. of Outlet:8nos
All dimensions in meter

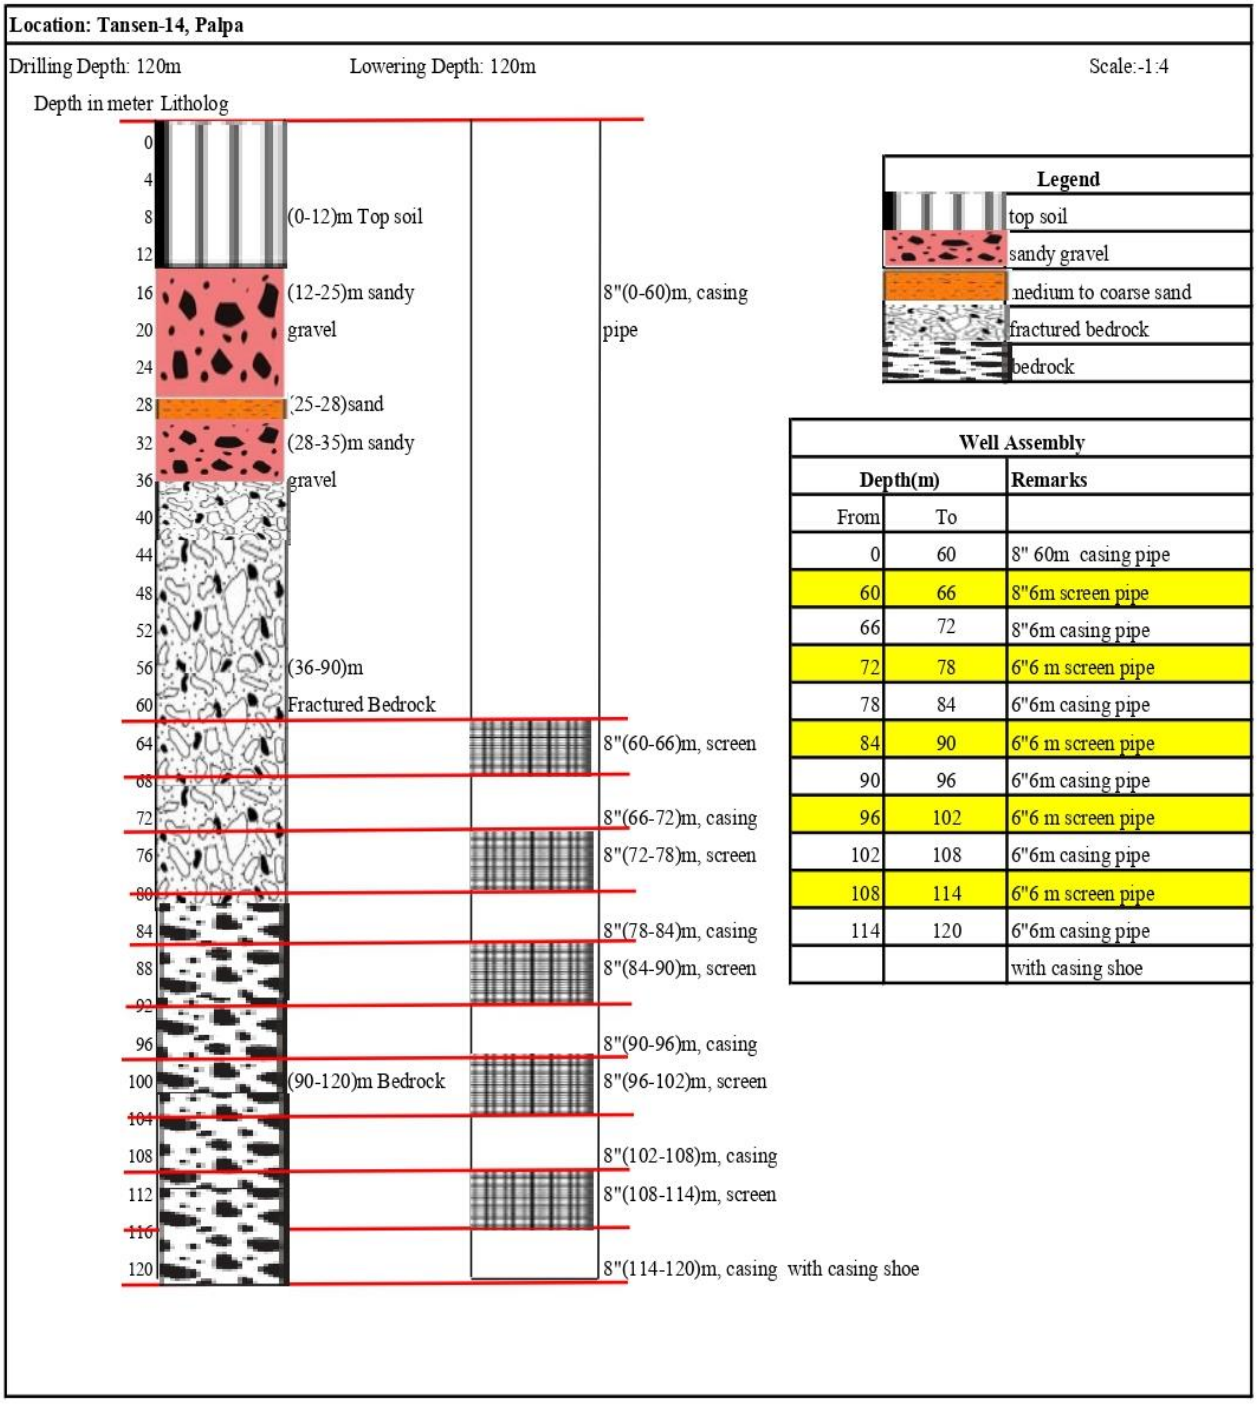

Distribution System of Durga deep boring, bardaghat-12,chaupatta
N
145.10
140
115
59.70
18
67
35
134.40
88.90
123.80
Salient Features
Length of Pipe : 926.70m
No. of Surgriser:1nos
No. of Outlet:9nos
All dimensions in meter


Distribution System of Bishrampure deep tubewell, bardaghat-12, chaupatta
N
114
85
26.50
160
116
120.2
Salient Features
Length of Pipe : 621.70m
No. of Outlet:6nos
All dimensions in meter


Distribution System of Siddhartha deep tubewell, Bardaghat-12
Outlet-3
88.40
Pump House
2.00
1.10
91.10
84.00
Outlet-2
9.30
10.10
114.80
N
Salient Features
No. of Outlet:4nos
All dimensions in meter

अनुसूची-१६: आ.व २०८१/०८२ मा निर्माण भएका डिप ट्युववेलहरुको डाटा

WELL ASSEMBLY OF AT TANSEN–14, PALPA



Well Assembly

Depth(m)		Remarks
From	To	
0	60	8" 60m casing pipe
60	66	8"6m screen pipe
66	72	8"6m casing pipe
72	78	6"6 m screen pipe
78	84	6"6m casing pipe
84	90	6"6 m screen pipe
90	96	6"6m casing pipe
96	102	6"6 m screen pipe
102	108	6"6m casing pipe
108	114	6"6 m screen pipe
114	120	6"6m casing pipe
		with casing shoe

ANNEX: DATA OF PUMPING TEST OF ARGALI DTW ISP

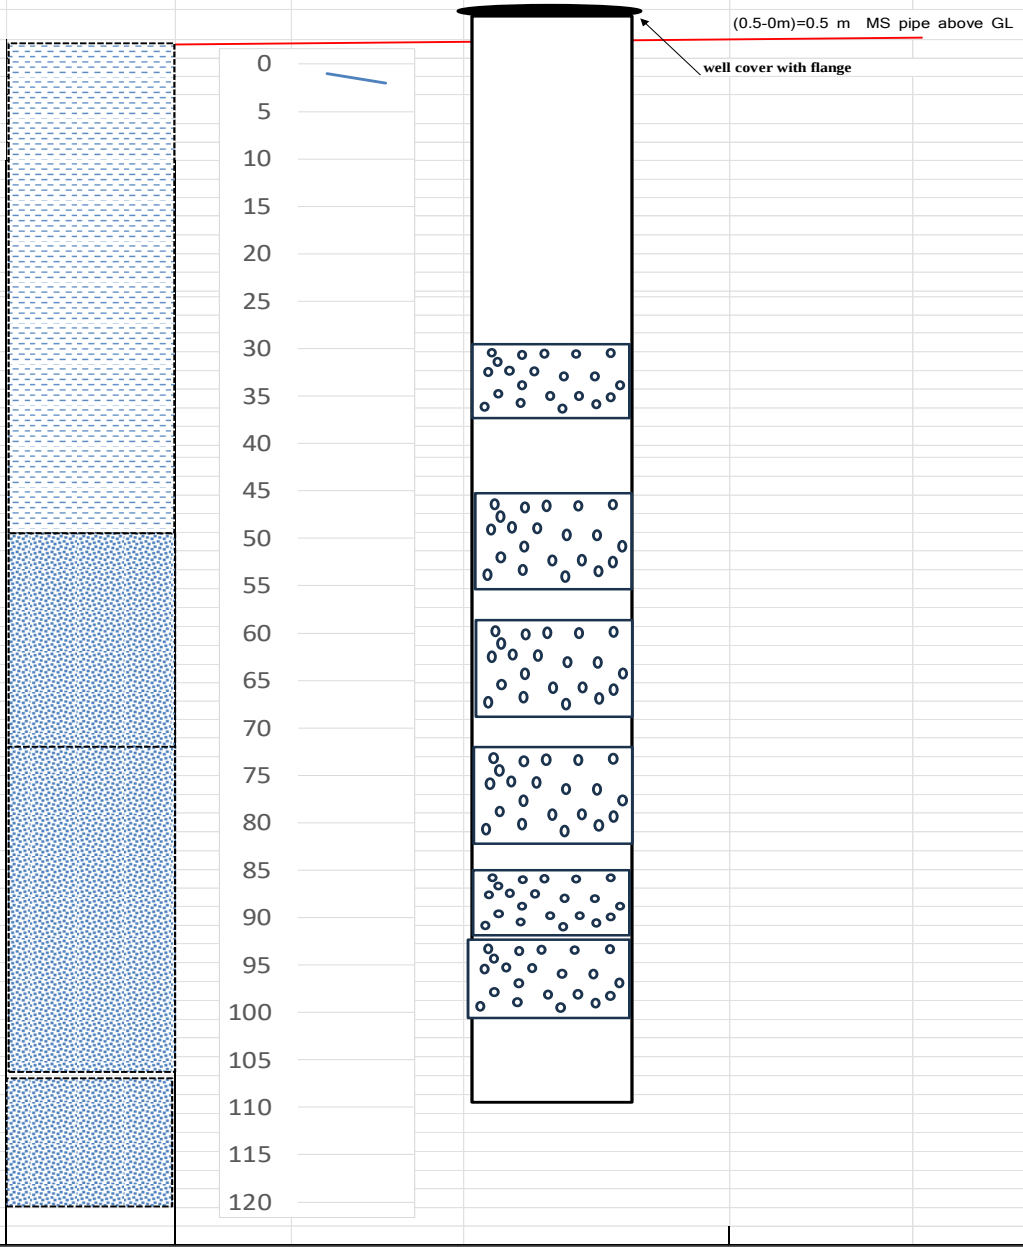
Pump Test Measurement Sheet					
Location: Argeli, Palpa					
Well Size : 8"		Lat: 27°54'57.8"N			
Static water level (m) : 64.40 m		Long: 83°27'03.0"E			
Dynamic water level (m) : 68.71 m		pump size in HP: 12.5HP		Size of pipe: 3" G.I pipe	
Recovery : 37 min		Pump Lowered depth: 81 m			
Time	**Time (Min)**	**Static water level (m)**	**Drawdown (M)**	**Discharge**	**Remarks**
12pm	0	64.4	0.00		
	1	66.05	1.65		
	2	66.25	1.85		
	3	66.4	2.00		
	4	66.48	2.08		
	5	66.6	2.20		
	6	66.67	2.27		
	7	66.77	2.37		
	8	66.88	2.48		
	9	67	2.60		
	10	67.22	2.82		
	15	67.63	3.23		
	20	67.91	3.51		
	30	68.28	3.88	7.33lps	
	45	68.57	4.17		
1pm	60	68.62	4.22		
2pm	120	68.66	4.26		
3pm	180	68.68	4.28		
4pm	240	68.69	4.29	7.33lps	
5pm	300	68.7	4.30		
6pm	360	68.7	4.30		
7pm	420	68.7	4.3		
8pm	480	68.7	4.3		
9pm	540	68.71	4.31		
10pm	600	68.71	4.31	7.33lps	
11pm	660	68.71	4.31		
12am	720	68.71	4.31		

ANNEX: WELL DESIGN OF KUNSARE DTW ISP,TANSEN-7

Well Design

Name of Client:-		**Grounwater Resources and Irrigation Development Division Office,Rupandehi**				
Name of WUA:-		Kunsare Dtw Wua				
Location:		Tansen-7 Palpa		Drilling Starting Date:-		
Drilling Depth:		120.00	meter	Contractor Name.	Asian Drilling Construction	
Lowering Depth:		108.00	meter	Contract ID	20/2082/83	
Well size:		8"	Dia	**Coordinates:**	**27.834950°**	**83.564068°**
Screen Positon:		**as of design**		Drilling Method	DTH Method	
Screen Length:		36.00	meter	Name of Land Owner:-	..	
				Name of WUA Chairman:-		

Litholog (As Per Driller Collected Sample)	Depth	Resistivity Log	Well Design



ANNEX: DATA OF PUMPING TEST OF KUNSARE DTW ISP

Project Name:-Kunsare DTW Isp

Location: Tansen-7 Palpa. *Gps* **27.835029° 83.564118°**
Pump Lowered: 40 m **Lowering Depth: 108m** **Well Size: 8"**
F.Y. 2082/83 **S.W.L.-12.05** m **Pump Size: 2"**
Date: **1/26/2083**

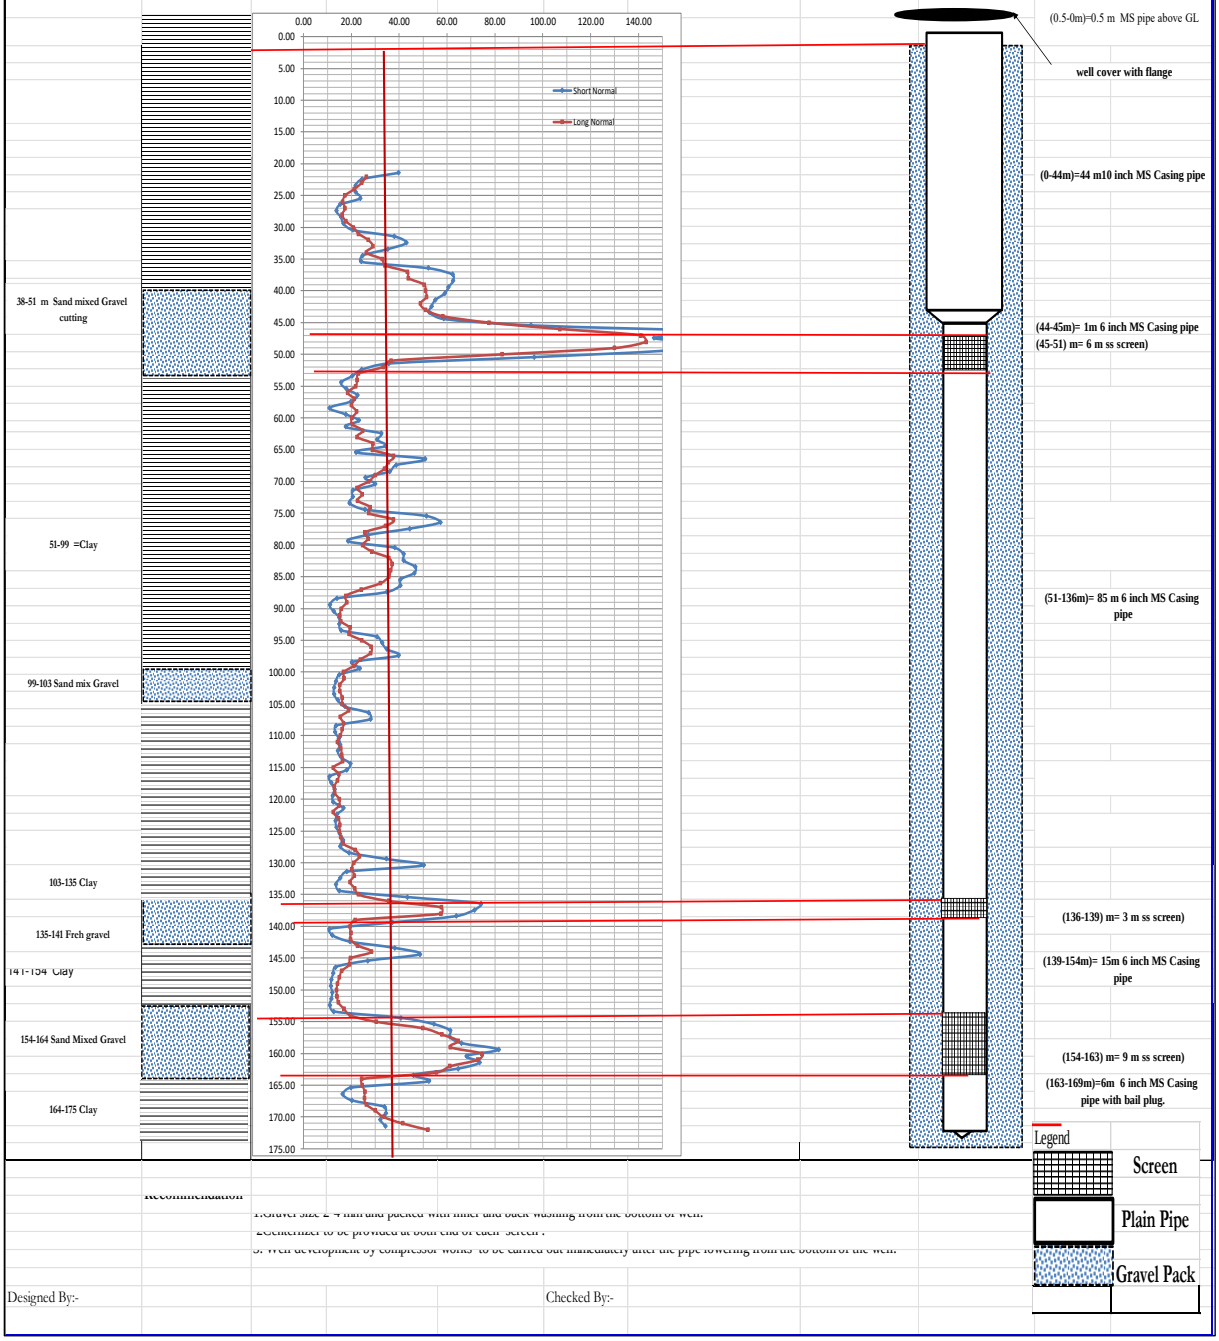
S.N	Time in Min.	Depth of W.L. in Meter	Discharge
Draw Down test			
1	0	4.67	**2.58 LPS**
2	1	4.98	
4	3	4.40	
6	5	5.60	
7	6	5.63	
11	10	5.66	
12	15	5.70	
13	20	5.72	
14	30	5.73	
15	40	5.75	
16	50	5.78	
17	60	5.81	
18	90	5.84	
19	120	5.87	
20	150	5.90	
21	180	6.70	
22	240	7.4	
23	300	7.65	
24	360	7.94	
25	420	8	
26	480	8.07	
27	540	8.12	
28	600	8.12	

ANNEX: WELL DESIGN OF MALANGABABA DTW ISP, BARDHAGHAT-12 NP

Well Design

Name of Client:-		Grounwater Resources and Irrigation Development Division Office,Rupandehi							
Name of WUA:-		Malangababa Dtw Wua							
Location:		Bardhaghat-12 Nawalparasi			Drilling Starting Date:-				
Drilling Depth:		170.00	meter		Logging Date:	10/25/2082			
Logging Depth:		170.00	meter		Contractor Name.	Evergreen Construction			
Lowering Depth:		169.00	meter		**Coordinates:**	**27.502062°**	**83.740488°**		
Well size:		10/6"	Dia		Logger Machine: Resistivity Cum Logger, Model-SSR MP-LOG				
Screen Positon:		**45-51m154-163m**			Drilling Method	Rotary Method			
Screen Length:		18.00	meter		Name of Land Owner:-				
6" MS Casing Pipe:-		107.00	meter		Name of WUA Chairman:-				

Litholog (As Per Driller Collected Sample)	Depth	Resistivity Log	Well Design



Recommendation

1. Gravel size 2-4 mm and packed with inner and back washing from the bottom of well.
2. Centerlizer to be provided at both end of each screen.
3. Well development by compressor works to be carried out immediately after the pipe lowering from the bottom of the well.

Designed By:- Checked By:-

ANNEX: DATA OF PUMPING TEST OF MALANGABABA DTW ISP

Project Name:-Malangababa DTW Isp
Location: Bardhaghat-12 Nawalparasi ***Gps*** **27.502062°** **83.740488°**
Pump Lowered: 33m **Lowering Depth:169 m** **Well Size: 10/6"**
Pump Size: 3" 15
F.Y. 2082/83 **S.W.L.-12.05** m **hp**
Date: **12/25/2082**

S.N	Time in Min.	Depth of W.L. in M	Discharge
1	0	12.05	
2	1	15.20	
3	2	16.40	
4	3	16.80	
5	4	16.95	**17 cm in V notch Tank**
6	5	17.02	
7	6	17.03	
8	7	17.05	
9	8	17.10	
10	9	17.11	
11	10	17.12	
12	15	17.24	**16.3 l/sec**
13	20	17.32	
14	25	17.35	
15	30	17.37	
16	40	17.40	
17	50	17.44	
18	60	17.47	
19	70	17.55	
20	80	17.62	
21	90	17.68	
22	100	17.75	
23	120	17.79	
24	180	17.84	
25	240	17.87	
26	300	17.88	
27	360	17.88	
28	420	17.89	
29	480	17.9	
30	540	17.91	
31	600	17.92	
32	660	17.93	
33	720	17.94	
34	780	17.95	
35	840	17.95	
36	900	17.96	
37	960	17.97	
38	1020	17.98	
39	1080	17.99	
40	1140	18.01	
41	1200	18.02	
42	1260	18.03	
43	1320	18.04	
44	1380	18.05	
45	1440	18.05	

अनुसूची-१७: आ.ब. २०८२/८३ मा सम्पादित कार्यबाट भएको उपलब्धि

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	आ.ब ०८२/८३ मा भएको उपलब्धि सूचक									सिँचित क्षेत्र (हे)		कैफियत
		DTW	PD-STW	STW	पम्पघर	पम्प	ट्रान्सफर्मर	विधुत (मि)	विधुत पोल	पाइप लाइन (मि)	आउट लेट	नयाँ	सुद्रिढिकरण	
१	जोकवार र सनहहीको बीचमा पिपरीया निर वाड नं. DTW									२०९.८	२	५.००		
२	लुम्बिनी सास्कृतिक नं.पा. सिविक मधुवन ७, मेहालवारी, DTW									२५८.९	२	५.००		
३	पालडाँडा DTW, बर्दघाट-५									२२२.५	२	५.००		
४	पावर ड्रिल STW पाल्पा विभिन्न		२									५.००		
५	पावर ड्रिल STW गुल्मी विभिन्न		१									२.५०		
६	न्यु सृजलशिल युवा क्लब डिप ट्युबवेल सिं. यो., बर्दघाट-६, नवलपरासी				१	१								
७	कुमारगड्डी DTW सैनामैना-९	१												
८	रामग्राम DTW, रामग्राम-१४,				१	१	१	२६९	८					
९	मदनपोखरा DTW ता.न.पा., पाल्पा				१	१								
१०	कुन्सेरे DTW तानसेन-७, पाल्पा	१												
११	नौड़िया STW बर्दघाट-१५,													
१२	झारबैरा रन्यौरा STW सैनामैना-४		१									२.५०		
१३	माझा DTW तानसेन-९, पाल्पा				१	१								
१४	माडीथटिया DTW बगनासकाली-२, पाल्पा							४५०	१२					

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	आ.ब ०८२/८३ मा भएको उपलब्धि सूचक										सिँचित क्षेत्र (हे)		कैफियत
		DTW	PD-STW	STW	पम्पघर	पम्प	ट्रान्सफर्मर	विधुत (मि)	विधुत पोल	पाइप लाइन (मि)	आउट लेट	नयाँ	सुद्रिढिकरण	
१५	लघुनाहा DTW बर्दघाट ३				१									
१६	खनकपुर STW सैनामैना-२		१									२.५०		
१७	तिलौली DTW सरावल-२				१	१								
१८	मुखियाटोल बङ्गाली DTW देवदह-८, रुपन्देही				१	१	१	१६१	६					
१९	वाँसा DTW सरावल १				१	१								
२०	अर्गली DTW तानसेन १४, पाल्पा	१												
२१	कृषकहरुका लागी STW-कोटहीमाइ ४, रुपन्देही		२									५.००		
२२	रानीबारी प्रगतीटोल DTW, बुटवल १९				१	१	१	१६४	६					
२३	भडच्छी बगाहा DTW सैनामैना					१								
२४	बुटवल मोटीसर १ रानीगञ्ज, DTW													
२५	पवित्र बस्ति DTW, बर्दघाट-१४,									२०१.२७	२	५.००		
२६	जयमाँ कोटाही DTW रामग्राम ८ नवलपरासी									४२४	४	१०.००		
२७	गणेशपुर डाडाटोल DTW, तिलोत्तमा ६											०.००		
२८	शिव पार्वती STW पाल्हिनन्दन ४			६								१२.००		
२९	जागरुक STW तिलोत्तमा ८ रूपन्देही		१									२.५०		

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	आ.ब ०८२/८३ मा भएको उपलब्धि सूचक										सिँचित क्षेत्र (हे)		कैफियत
		DTW	PD-STW	STW	पम्पघर	पम्प	ट्रान्सफर्मर	विधुत (मि)	विधुत पोल	पाइप लाइन (मि)	आउट लेट	नयाँ	सुद्रिढिकरण	
३०	एकिकृत सिँचाइ तथा कृषि (ज्योति महिला कृषक समुह) STW सिवानगढ़, रामग्राम १३		१									२.५०		
३१	बाल्मिकी STW बर्दघाट १		१									२.५०		
३२	STW धुरकोट-५ छल्दीखोला, गुल्मी											०.००		
३३	हिमाली STW रामग्राम १६		१									२.५०		
३४	महल्बारी कुडिया STW सुस्ता २ नवलपरासी			५								१०.००		
३५	ठुलो गैरी सानो गैरी STW माथागढ़ी १ पाल्पा		१									२.५०		
३६	संगम टोल STW ता.न.पा. ९ पाल्पा		१									२.५०		
३७	एकिकृत सिँचाइ तथा कृषि STW (हरियाली कृषि) सुद्धोदन १ वेलवा		०	१३								२६.००		
३८	सुमेरु STW तिलोत्तमा ८		१									२.५०		
३९	सालघारी STW गैडहवा ७ रुपन्देही		१									२.५०		
४०	श्रीनगर DTW, रामग्राम-१४, नवलपरासी		०									०.००		
४१	STW बर्दघाट ४ चारघरे टोल, अधुरो आउटलेट निर्माण देवदह-२, रोहिणि ४ छिइपागढ ,देवदह ३ सिसपुर, देवदह ८ बंगला , रुपन्देहि													

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	आ.ब ०८२/८३ मा भएको उपलब्धि सूचक										सिँचित क्षेत्र (हे)		कैफियत
		DTW	PD-STW	STW	पम्पघर	पम्प	ट्रान्सफर्मर	विधुत (मि)	विधुत पोल	पाइप लाइन (मि)	आउट लेट	नयाँ	सुद्रिढिकरण	
४२	STW सैनामैना न.पा. -६ इंगुरिया टोल रुपन्देहि		१									२.५०		
४३	STW लुम्बिनि सांस्कृतिक रुपन्देहि													
४४	देवदह-५ डायमण्ड पथ, रोहिणि-७ टिकर, STW		२									५.००		
४५	प्रतापपुर-३,५,६,७ र ९ STW			९								१८.००		
४६	हिमालि STW रामग्राम १६ , भुसनापुर STW , रामग्राम १४ घोडपालि STW ट्युवेल		१									२.५०		
४७	सैनामैना ११ चिसापानि STW		१									२.५०		
४८	समयमाइ STW,मर्चवारी ४ रुपन्देही			४								८.००		
४९	कर्बला टोल DTW सैनांमैना ४, रुपन्देही													
५०	दाउन्ने STW पाल्हिनन्दन ५, नवलपरासी			१३								२६.००		
५१	नवदुर्गा STW रामग्राम १६, नवलपरासी		१									२.५०		
५२	DTW सिँचाइ योजनाको पुनर्स्थापना कार्यक्रम	१				५	१	२७४	१०	१६५१९	१५३	४५९.०	८८.०	
५३	शिशै कृषिक समुह रुपन्देहीमा STW शुद्धोधन १		६									१५.००		

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	आ.ब ०८२/८३ मा भएको उपलब्धि सूचक										सिँचित क्षेत्र (हे)		कैफियत
		DTW	PD-STW	STW	पम्पघर	पम्प	ट्रान्सफर्मर	विधुत (मि)	विधुत पोल	पाइप लाइन (मि)	आउट लेट	नयाँ	सुद्रिढिकरण	
५४	बुटवल १९ देवीस्थान STW र बुटवल १९ मनोहरापुर टोल STW		१									२.५०		
५५	STW कुम्भी चोक बुर्जा टोल, देवदह २		१									२.५०		
५६	STW मायादेवी ७, ओमसतिया २, तिलोत्तमा १४, सि.न.पा.२,४,९, १०, ११ र मायादेवी ८													
५७	STW देवदह — ६		१									२.५०		
५८	मोतिवारी STW			९								१८.००		
५९	सिसवा DTW													
६०	कृषि सिचाइका STW मायादेवी ७, ओमसतिया २, तिलोत्तमा १४, सि.न.पा.२,४,९,१०, ११ र मायादेवी ८													
६१	STW ,रामग्राम न पा ८ उनवछ		१	०								२.५०		
६२	सुक्रौली घिनाहा DTW													
६३	खपटेकारुख बोरिङ्ग सत्यवती ४ गुल्मी													
६४	विद्युतिकरण,तारपोल,मोटरपम्प जडान रामग्राम १४,१५,१६,१८,९		२					२१०	४			५.००		
६५	शुक्रौली घिनहा DTW रामग्राम वडा १५													

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	आ.ब ०८२/८३ मा भएको उपलब्धि सूचक										सिँचित क्षेत्र (हे)		कैफियत
		DTW	PD-STW	STW	पम्पघर	पम्प	ट्रान्सफर्मर	विधुत (मि)	विधुत पोल	पाइप लाइन (मि)	आउट लेट	नयाँ	सुद्रिढिकरण	
६६	घोडपाली DTW रामग्राम ३ नवलपरासी													
६७	बगाले खोला DTW रे न पा ९ गुल्मी													
६८	डोलही STW सूर्यपुरा		२									५.००		
६९	बेल भरिया STW													
७०	घोडाहा STW देवदह-९													
७१	पल्ही लोहरौपी DTW													
७२	गौघाटमा STW 10 थान													
७३	भूस्नापूर DTW रामग्राम १४ नवलपरासी													
७४	जय गणेश DTW रामग्राम १७ नवलपरासी													
७५	जोकवार ललितपुर DTW रामग्राम ९ नवलपरासी													
७6	नयाँ मेशिन DTW, मायादेवी, सियारी, कोटाहिमाई, रुपन्देही					१								
७८	सुनवल DTW सुनवल-7, तर्गौली, नवलपरासी													
७९	चन्द्रज्योती DTW बर्दघाट-15									२१५.४	२	५.००		
८०	जयमाँ दुर्गा DTW रामग्राम-१७, पठ्खौली,									४३०.३	४	१०.००		
८१	कोटस्थान DTW सरावल ४, हात्तीवन,													

क्र.स.	कार्यक्रम/क्रियाकलाप	आ.ब ०८२/८३ मा भएको उपलब्धि सूचक										सिँचित क्षेत्र (हे)		कैफियत
		DTW	PD-STW	STW	पम्पघर	पम्प	ट्रान्सफर्मर	विधुत (मि)	विधुत पोल	पाइप लाइन (मि)	आउट लेट	नयाँ	सुद्रिढिकरण	
८२	जय समईमाई DTW, गैडहवा ३, बर्गदवा,									२६०.८	२	५.००		
८३	लुम्बिनि हरियाली कृषक DTW ट्युबवेल लुम्विनी ११, , महादेवा									१५८२.१	१६	४०.००		
८४	गंगापृथीवी DTW बर्दघाट-१४, गंगाबस्ती,									४०१.३	४	१०.००		
८५	शान्तिटोल DTW कन्चन-५, रुपन्देही									२५०	२	५.००		
८६	हनुमान DTW कन्चन-3,					१				२५०	२	५.००		
८७	बरमपुरवा DTW रामग्राम-९					१						०.००		
८९	मोतिबस्ति DTW बर्दघाट-,१									८२९.९	८	२०.००		
९०	सानो गैडहवा DTW, गैडहवा -३ रुपन्देही									४६२	६	१५.००		
९१	शान्ति DTW गैडहवा -७ रुपन्देही									७२१.७	७	१७.५०		
९२	कृषि सिंचाइ योजना, बर्दघाट-११, DTW													
९३	रुपौलिया DTW सुस्ता-१, नवलपरासी													
जम्मा		४	३५	५९	९	१७	४	१५२८	४६	२३२३८.६८	२१८	८२७.००	८८.००	०.००

अनुसूची-१८: आ.ब. २०८३/८४ को वार्षिक विकास कार्यक्रम

क्र.स.	बजेट उपशीर्षक	बजेट
क	३०८०००१६ भुमिगत स्यालो तथा डिपट्युववेल सिँचाइ कार्यक्रम	
१	११.४.१५.१०१९ जोकवार र सनहहीको बीचमा पिपरीया निर वाड नं. ४ डिप ट्युव वेल सिंचाइ प्रणाली	८००
२	११.४.१५.१४१६ कुमारगड्डी डिप ट्युबवेल सिं. यो., सैनामैना-९, रुपन्देही	३०००
३	११.४.१५.१४१७ न्यु सृजलशिल युवा क्लब डिप ट्युबवेल सिं. यो., बर्दघाट-६, नवलपरासी	१२००
४	११.४.१५.१४२१ कुन्सरे डिप ट्युबवेल सिं. यो, तानसेन-७, पाल्पा	१०००
५	११.४.१५.१७४२ लघुनाहा डिप ट्युववेल सिँचाइ प्रणाली बर्दघाट ३ नवलपरासी	२०००
६	११.४.१५.१७४३ तिलौली डिप वोरिङ्ग सरावल गा. पा. -२ नवलपरासी पश्चिम	२०००
७	११.४.१५.१७४५ वाँसा डिप वोरिङ्ग सरावल -१ नवलपरासी	१२००
८	११.४.१५.१७४७ माडी थटिया डिप ट्युबवेल सिं.यो, बगनासकाली-२, पाल्पा	५००
९	११.४.१५.१७४८ मुखिया टोल बङ्गाली डिप ट्युबवेल सिं. यो., देवदह-८, रुपन्देही	१०००
१०	११.४.१५.१८४२ अर्गली डिप बोरिङ सिँचाई योजना, तानसेन १४, पाल्पा	१०००
११	११.४.१५.१९७० रानीबारी प्रगती टोल डिप वोरीङ्ग, बुटवल १९	१०००
१२	११.४.१५.२०३४ बुटवल उ.म.न.पा. मोटीसर १ रानीगञ्ज, डिप ट्युववेल सिँचाइ प्रणाली	१०००
१३	११.४.१५.२०८३ संगम टोल स्यालो ट्यूववेल ता.न.पा. ९ पाल्पा	८००
१४	११.४.१५.२२२५ कर्बला टोल डिप ट्युबेल सैनांमैना ४, रुपन्देही	२०००
१५	११.४.१५.२२५८ शुक्रौली घिनहा डिप ट्यूववेल ज.उ.स रामग्राम नगरपालिका वडा नं.१५ नवलपरासी	२०००
१६	११.४.१५.२२५९ घोडपाली डिप ट्यूववेल ज.उ.स रामग्राम नगरपालिका वडा नं.३ नवलपरासी	२९००
१७	११.४.१५.२२६० भूस्नापूर डिप ट्यूववेल ज.उ.स रामग्राम नगरपालिका वडा नं.१४ नवलपरासी	२७००
१८	११.४.१५.२२६१ जय गणेश डिप ट्यूववेल ज.उ.स रामग्राम नगरपालिका वडा नं.१७ नवलपरासी	२०००
१९	११.४.१५.२२६२ जोकवार ललितपुर डिप ट्यूववेल ज.उ.स रामग्राम नगरपालिका वडा नं.९ नवलपरासी	३३००
२०	११.४.१५.२३२३ रेक्सहवा डिप ट्युबवेल सिँचाइ उपयोजना रामग्राम-१४ नवलपरासी	२९००
२१	११.४.१५.२३२४ लंकहवा डिप ट्युबवेल सिँचाइ उपयोजना रामग्राम-१० नवलपरासी	२०००
२२	११.४.१५.२३२५ घिनाह डिप ट्युबवेल सिँचाइ उपयोजना रामग्राम-१५	२०००
२३	११.४.१५.२३२६ पाल्ही लोहरौली भूमिगत ट्यूववेल पाल्हीनन्दन ४ नवलपरासी	१०००
२४	११.४.१५.२३२७ विजयपुर डिप ट्यूववेल सिँचाइ योजना, वर्दघाट नवलपरासी	१२००
२५	११.४.१५.२३२८ श्री हात्तीडाडा भूमिगत ट्यूववेल योजना देवदह ३ रुपन्देही	७५०
२६	११.४.१५.२३२९ पम्प जडान कार्य(इगुंरिया, उज्जवल ,वेलगैरा बगैचा, संगमटोल, लगायत विभिन्न ट्यूववेल योजना)	१०००
२७	११.४.१५.२३५२ शुक्रौलि घिनाह(उत्तरटोला) डिप ट्युबवेल सिँचाइ उपयोजना रामग्राम-१५ नवलपरासी	१८००
२८	११.४.१५.२४१७ सैनामैना स्यालो ट्यूववेल जउस सैनामैना १ रुपन्देही	८००
२९	११.४.१५.२४३३ सर्वोदय ज.उ.स. वर्दघाट विद्धुत पूर्वटोलको भूमिगत सिँचाइ पाइप लाइन विस्तार कार्य, वर्दघाट ५, नवलपरासी	१०००
३०	११.४.१५.२४३६ श्रीनगर डिप ट्यूववेल योजना रामग्राम १४ नवलपरासी	२७००
३१	११.४.१५.२४४० डिप ट्युवेल पुनर्उत्थान योजना	२५०००
३२	११.४.१५.२४५९ स्यालो ट्युववेल जडान सैनामैना १ रानिकुवा टोल	८००
३३	११.४.१५.२४६० संगम प्रगतिटोल स्यालो ट्युवेल योजना, सैनामैना २	८००
३४	११.४.१५.२४६६ स्यालो ट्युवेल जडान योजना, लुम्बिनी सास्कृतिक ५मोहसदमाँ	८००
३५	११.४.१५.२४६७ बेतानी गाउँमा स्यालो ट्युवेल जडान, सुद्धोधन ३	८००
३६	११.४.१५.२४६८ स्यालो ट्युववेल जडान सैनामैना १ ब्रहमाबाबा प्रमेश्वर	८००
३७	११.४.१५.२४६९ लखनचोक डिप टयुवेल सिचांइ आयोजना पाइपलाइन विस्तार, कञ्चन ३	८००
३८	११.४.१५.२४७० विजयपुर स्यालो ट्युबवेल, सुनवल १३	८००
३९	११.४.१५.२४७१ स्यालो ट्युवेल जडान योजना चौतारी टोल सयपत्री पथ, सैनामैना ५	८००
४०	११.४.१५.२४७२ पाल्ही स्यालो ट्युववेल सिँचाइ योजना, पाल्हीनन्दन ५	८००

क्र.स.	बजेट उपशीर्षक	बजेट
४१	११.४.१५.२४७३ गुठीप्रसौनी अधुरो डिप बोरिङ जडान समपन्न योजना, प्रतापपुर ६	८००
४२	११.४.१५.२४७४ पोखरापाली डिप बोरिङ जल उपभोक्ता समिती, रामग्राम ६	८००
४३	११.४.१५.२४७५ श्री देउराली पम्प जल उपभोक्ता समिती डिप बोरिङ मर्मत योजना, गैडहवा ९	१०००
४४	११.४.१५.२४७६ गोबरैया स्यालो ट्यूववेल बुटवल १५	८००
४५	११.४.१५.२४७७ नयापाटी बगैचा स्यालो ट्यूववेल तानसेन १० पाल्पा	८००
४६	११.४.१५.२४७८ ज्योतीनगर बोरिङ पाइप विस्तार तथा आउटलेट मर्मत, तिलोत्तमा ८	८००
४७	११.४.१५.२४८६ पाचमुरे डिप बोरिङ्ग निर्माण गुल्मीदरवार ५ गुल्मी	१०००
४८	११.४.१५.२५०८ तिनाउ एग्रो फार्म एण्ड रिसर्च सेन्टरलाई स्यालो ट्युववेल, बुटवर १९ रुपन्देही	१०००
४९	११.४.१५.२५११ मोतीगञ्ज टोल विकास स्यालो ट्यूववेल सिँचाइ अयोजना, बुटवल - १४, रुपन्देही	१०००
५०	११.४.१५.२५१२ स्यालो ट्युवेल रोहिणी ५ विर्नी	१०००
५१	११.४.१५.२५१६ समरीमाई स्यालो टुवेल २, निर्माण,, समरीमाइ गा.पा. - ७, रुपन्देही	१०००
५२	११.४.१५.२५२८ स्यालो ट्युवेल २० थान रामग्राम न पा वडा नं.७,९,१०,१४,१५,१६,१७,१८ र स्यालो ट्युवेल १० थान पालिनन्दन गा पा वडा नं. १,२,३,४,५,६, नवलपरासी	५०००
५३	११.४.१५.२५२९ डिप बोरिंग, सुस्ता / प्रतापपुर नवलपरासी ब.सु.प.	३०००
५४	११.४.१५.२५३० गंगा डिप ट्युववेल जल उपभोक्ता समिति बर्दघाट १४, नवलपरासी	२०००
५५	११.४.१५.२५३३ रामग्राम १ मा संचालित भगवती डिप ट्युबेल सिंचाइको क्षमता विस्तार नवलपरासी (ब.सु.प.)	१५००
५६	११.४.१५.२५३४ पृथ्वीबस्ती टोलमा १ थान डिप ट्युवेल बोरिङ्ग, बर्दघाट - १५, नवलपरासी ब.सु.प	१०००
५७	११.४.१५.२५३७ नमुना टोल टोलमा १ थान डिप ट्युवेल बोरिङ्ग, बर्दघाट - १५, नवलपरासी ब.सु.प	१०००
५८	११.४.१५.२५६१ शान्ति ज.उ.स. स्यालो ट्युववेल जडान कार्य तिलोत्तमा ५ रुपन्देही	८००
५९	११.४.१५.३५७ सुनवल डिप ट्यूववेल सिंचाइ, सुनवल-७, तगौंली, नवलपरासी	१०००
६०	११.४.१५.३७४ जय माँ दुर्गा डिप ट्यूववेल, रामग्राम-१७, पठ्खौली, नवलपरासी	८००
६१	११.४.१५.३७६ कोटस्थान डिप ट्युववेल सिं यो, सरावल ४, हात्तीवन, नवलपरासी	५००
६२	११.४.१५.३८१ जय समईमाई डिप ट्यूववेल, गैडहवा ३, बर्गदवा, रुपन्देही	८००
६३	११.४.१५.३८३ लुम्बिनि हरियाली कृषक डिप ट्युबवेल सिं यो, लुम्विनी ११, , महादेवा, रुपन्देही	१०००
६४	११.४.१५.३८९ गंगा पृथीवी डिप ट्युबवेल सिं यो, बर्दघाट-१४, गंगाबस्ती, नवलपरासी	८००
६५	११.४.१५.३९१ शान्तिटोल डिप ट्युबवेल सिं यो, कन्चन-५, रुपन्देही	८००
६६	११.४.१५.३९८ हनुमान डिप ट्युबवेल सिं यो, कन्चन-३, रुपन्देही	८००
६७	११.४.१५.४०३ बरमपुरवा डिप ट्यूववेल सिंचाइ, उप-आयोजना रामग्राम-९	५००
६८	११.४.१५.८८७ मोति बस्ति डिप ट्युब वेल सिंचाइ योजना, बर्दघाट-,१ नवलपरासी -सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	१०००
६९	११.४.१५.८९१ सानो गैडहवा डिप ट्यूववेल सिंचाइ योजना, गैडहवा -३ रुपन्देही (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	८००
७०	११.४.१५.८९२ शान्ति डिप ट्यूववेल सिंचाइ योजना गैडहवा -७ रुपन्देही (सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	८००
७१	११.४.१५.८९३ कृषि सिंचाइ योजना, बर्दघाट-११, नवलपरासी -सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	१०००
७२	११.४.१५.८९५ रुपौलिया डिप ट्युब वेल सिंचाइ योजना, सुस्ता-१, नवलपरासी -सिंचाइ प्रणालीको निर्माण)	१०००
ख	**३०८०००१८ सिँचाइ आयोजना मर्मत सुधार तथा विस्तार कार्यक्रम**	
१	११.५.१५.२०६४ चनमाई डिप ट्युववेल सिंचाई प्रणाली, गैडहवा ५,बंगाली डिप ट्युववेल सिंचाई प्रणाली, देवदह ८,नमुना मिडियम डिप ट्युववेल सिंचाई प्रणाली, तिलोत्तमा ५ लगायतका डिप ट्यूववेल मर्मत कार्य	१०००
२	११.५.१५.२०६६ चम्किपुर डि.ट्यू.यो. शंकरपुर डि.ट्यू.यो. लगायत रुपन्देही तथा नवलपरासी जिल्लाका विभिन्न डिप ट्यूववेल योजनामा ट्रान्सफर्मर जडान कार्य ।	१०००
३	११.५.१५.२०६७ आकस्मिक डिप ट्यूववेल सिचाई प्रणाली मर्मत सम्भार, (आवश्यकताका आधारमा रुपन्देही,जिल्ला)	१४००
४	११.५.१५.२०६८ आकस्मिक डिप ट्यूववेल सिचाई प्रणाली मर्मत सम्भार, (आवश्यकताका आधारमा नवलपरासी जिल्ला)	१६००
